




**“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”**

**- CURVA S - PROGRAMADO V/S EJECUTADO**

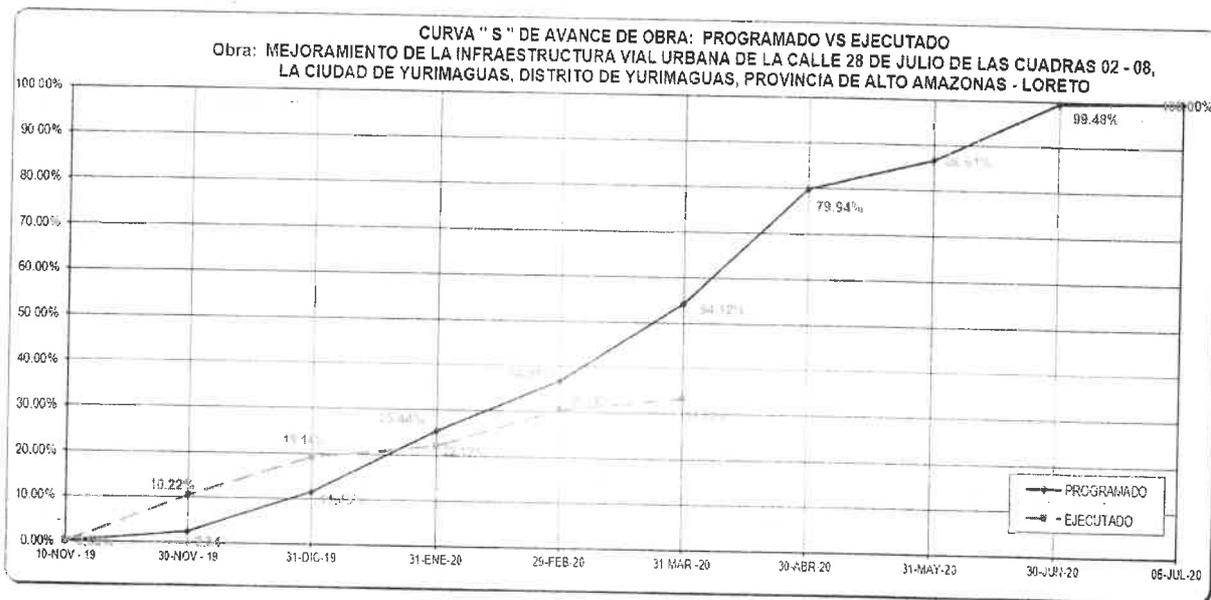

**6. CONCLUSIONES:**

- La presente documentación materia de su revisión, consta con los requerimientos y sustentos que derivan a la presente valorización descritos en el ítem 3. Contenido de la Documentación.
- En la documentación, se adjuntan las boletas de pagos realizados a **SENCICO**, **CONAFOVICER**, de acuerdo al porcentaje que estima la legislación vigente, pago de póliza **SCTR**.
- El avance físico del mes es: 2.97 %.
- El avance de obra programado que se ha presentado al inicio de la obra correspondiente al mes de marzo del 2020 es de 33.35%.
- En este caso la Valorización Acumulada Ejecutada alcanzo el %, mientras que la Valorización Acumulada Programada es del 54.12%.
- Es por ello que en esta Valorización n°05 correspondiente al mes de Marzo-2020, la Ejecución de la obra se encuentra atrasada por debajo del 80% por lo que de acuerdo a lo manifestado por el supervisor indica que amerita que presente un calendario acelerado donde evidencie las acciones que tomara en cuenta para revertir el atraso incurrido, sin embargo mediante el decreto Supremo N°044-2020-PCM, se declaro la emergencia Nacional por la propagación del COVID -19, las mismas que atenta contra la vida de los ciudadanos y como consecuencia se paralizó todas las obras a nivel nacional, razón por lo cual no se puede realizar un análisis objetivo del atraso de la Obra en el plazo previsto, toda vez que hay hechos objetivos que fundamentan tal atraso.



“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

**7. RECOMENDACIONES:**

- El Supervisor indica que la obra en mención tiene un avance físico mensual del 2.97% y un acumulado de **33.35%**, versus calendario programado acumulado al mismo periodo de 54.12%, siendo el estado de la obra, **atrasada por debajo del 80%**, por lo que se recomienda notificar al contratista para la presentación del calendario acelerado.
- Los metrados han sido conciliados por el Residente y supervisor de Obra, quien da su Conformidad a la Valorización N°05 correspondiente al mes de Marzo del 2020, de la obra “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA CALLE 28 DE JULIO DE LAS CUADRAS 02-08 YURIMAGUAS DEL DISTRITO DE YURIMAGUAS – PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS – DEPARTAMENTO DE LORETO”. Cabe indicar que los metrados considerados no están sustentados por lo que se recomienda notificar a supervisor a fin de que brinde el sustento necesario y de el seguimiento oportuno en obra.
- Visto el informe Mensual N°05 correspondiente al mes de marzo 2020 y dado la conformidad por el supervisor de obra, quien en su informe de la referencia b), recomendando a la entidad el pago correspondiente a la empresa **CONSORCIO MORALILLOS YURIMAGUAS**, siendo el monto a pagar de **S/202,518.27 soles, (Doscientos dos mil quinientos dieciocho con 27/00 soles)** sin IGV, como se detalla:

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 1 Valorización N°05-Marzo del 2020    | S/. 198,935.44        |
| 2 Reajuste total de valorización n°05 | S/ 3,582.83           |
| <b>Neto Facturar</b>                  | <b>S/. 202,518.27</b> |

- Se recomienda seguir los procedimientos de acuerdo al RLCE de acuerdo al artículo. 194, y continuar con su trámite correspondiente.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y tramite respectivo.

Atentamente

Ing. DIANA PAOLA CASTRO LITANO  
Coordinadora de Obra  
Sub Gerencia de Supervisión y Control

Cc: Ing. Diana Paola Castro Litano

Trámite:17902





**MS SERVICIOS S.A.C.**

Calle Comercio 738, Yurimaguas, Loreto | T: 065 35 3389  
Jr, Los Alpes 215, Tarapoto, San Martín | T: 042 52 1904  
msserviciossac@yahoo.es

**"Año de la Universalización de la Salud"**

**CARTA N° 187 - 2020 - M.S.S.SAC/28**


Señor:  
**Gobierno Regional de Loreto**  
Presente. -



**Atención : Ing. Edy Wisberto Ruiz Zarate.**  
**Gerente Regional de Infraestructura.**

**Asunto : REMITE INFORME DE CONFORMIDAD A VALORIZACION MENSUAL N° 05 DEL CONTRATISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.**

**Referencia :**



1. Para la Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA CALLE 28 DE JULIO DE LAS CUADRAS 02 - 08, LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO.
2. Informe N° 021 - 2020 - MAJRH/JS - 28

**De mi especial Consideración:**

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarlo muy cordialmente y al mismo tiempo REMITE INFORME DE CONFORMIDAD A VALORIZACION MENSUAL N° 05 DEL CONTRATISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 de la obra en referencia 1), según se detalla en la Valorización respectiva. Para su análisis y trámite correspondiente.

Debe manifestarse que, mediante Decreto Supremo N° 044 - 2020 - PCM, El Gobierno declara Estado de Emergencia por la Pandemia de Enfermedad por Coronavirus, que rige a partir de las 00:00 horas del 16 de Marzo del 2016, la misma que se ha venido prorrogando, en ese sentido la presente valorización corresponde al periodo de 01 al 15 de Marzo del 2020.

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi consideración y estima personal.

Atentamente,

**MS Servicios S.A.C.**

*Karina L. Valles Saldaña de Sánchez*  
**Karina L. Valles Saldaña de Sánchez**  
GERENTE GENERAL

PROVINCIA N° 17902  
A: Ing. Diana Castro  
PARA: Su Atencion  
C/R: Atencion  
Dgs: Atencion  
C: Atencion  
Archivo



PROVINCIA 17902  
A: SASIC-061  
PARA: Atencion  
08.07.2020



**INFORME N° 021 – 2020 – MALRH/JS - 28.**

**A** : Sra. Karfna L. Valles Saldaña  
Representante Legal

**DE** : Ing. Miguel Ángel La Rosa Hervay  
Jefe de Supervisión.

**ASUNTO** : REMITE INFORME DE CONFORMIDAD A VALORIZACION MENSUAL N° 05 DEL  
CONTRATISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.

**REFERENCIA:**

1. Para la Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA CALLE 28 DE JULIO DE LAS CUADRAS 02 - 08, LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO."
2. CARTA N° 186 – 2020 – M.S.SAC/J

FECHA: Iquitos, 29 de Junio del 2020.

De mi especial Consideración:

Es grato dirigirme a Usted, con la finalidad de hacer llegar la evaluación y conformidad a la Valorización N° 05 del Contratista correspondiente al mes de Marzo del 2020; para lo cual manifestamos lo siguiente:

**1.0 GENERALIDADES**

**1.1 Datos Generales de la Obra**

|                         |   |                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obra                    | : | " MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA CALLE 28 DE JULIO DE LAS CUADRAS 02 - 08, LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO " |
| Contratista             | : | CONSORCIO MORALILLOS - YURIMAGUAS                                                                                                                                                       |
| Representante Legal     | : | Ing. Fernando Tapullima Gálvez.                                                                                                                                                         |
| Proceso de Selección    | : | LICITACION PÚBLICA N° 009-2019-CSO-GRL                                                                                                                                                  |
| Contrato                | : | N° 013-2019-GRL-GGR-GRI                                                                                                                                                                 |
| Residente de Obra       | : | Ing. LUIS MANUEL PERALTA RUIZ<br>C.I.P. N° 63545                                                                                                                                        |
| Presupuesto Contratado  | : | S/ 6'689,731.46 Sin IGV.                                                                                                                                                                |
| Sistema de contratación | : | A PRECIOS UNITARIOS                                                                                                                                                                     |



Miguel Angel LA Rosa Hervay  
Ingeniero Civil  
CIP: 90199  
Jefe de Supervisión
