




"Año de la Universalización de la Salud"

Belén, 15 de Octubre de 2020

Oficio n. ° 1635-2020-GRL/GRI/SGSyC

Ingeniero Edi Wisberto Ruiz Zárate  
Gerente Regional de Infraestructura  
Presente

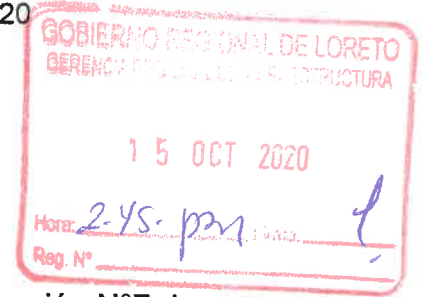

Asunto: Conformidad de Valorización N°7 de  
Obra Setiembre de 2020.

Obra: "Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana  
de la calle 28 de Julio de las cuadras 02-08-Yurimaguas  
del Distrito de Yurimaguas—Provincia de Alto Amazonas  
—Departamento de Loreto".

Ref.: a. Informe n. °114-2020-GRL-GRI-SGSyC-DPCL  
b. Carta N°407-2020-/CONS.MORALILLOS-  
YURIMAGUAS-MY.

Tengo el agrado de saludarle cordialmente, a su vez alcanzarle la documentación de la **Valorización n° 07, por ejecución de obra**, que asciende a la suma **S/.519,561.78 soles, (Quinientos diecinueve mil quinientos sesenta y uno con 78/00 soles) sin IGV**, presentado por el Inspector de la obra y su conformidad mediante la referencia b), **correspondiente a Setiembre de 2020**, de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización N° 07	S/	<b>507,647.30</b>
Reajuste Actual	S/	11,914.48
Amortización Adelanto Directo	S/	0.00
Amortización Adelanto Materiales	S/	0.00
<b>Neto a Pagar</b>	<b>S/.</b>	<b>519,561.78</b>

Asimismo, la obra a Setiembre de 2020 tiene un avance físico acumulado del 49.72%, versus el calendario programado de 38.72%, siendo el estado de la obra adelantada y en ejecución.

Por lo tanto, encontrándose conforme la documentación que sustenta el Inspector, se solicita continuar con el trámite respectivo **a favor de Consorcio Moralillos-Yurimaguas**.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
Gerencia Regional de Infraestructura  
**Ing. RAUL FLORES AQUEPUCHO**  
Sub Gerente de Supervisión y Control

Copia: Coordinador de Obra  
Ing. Diana Paola Castro Litano  
SGSyC – File de obra (01)  
SGSyC – File correlativo (01)  
SGSyC – File personal (01)

RFA/dap  
Trámite: 30551



"AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"

**INFORME N°114-2020-GRL/GRI/SGSyC/DPCL**


AL : Ing. Raúl Flores Aquepucho  
Sub Gerente de Supervisión y Control.

DE : Ing. Diana Paola Castro Litano  
Coordinador de Obra

ASUNTO : **VALORIZACION DE OBRA N° 07– MES DE SETIEMBRE DE 2020.**  
OBRA.-"Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de la calle 28 de Julio de las cuadras 02-08-Yurimaguas del Distrito de Yurimaguas – Provincia de Alto Amazonas –Departamento de Loreto".  
CONTRATISTA.- CONSORCIO MORALILLOS -YURIMAGUAS.

REFERENCIA: a) Carta N°407-2020-M.S.S.SAC/28 (13/10/2020)  
b) Informe N°006-2020-VHSM/JS-28  
c) Carta N°069-2020/CONS.Moralillos-Yurimaguas-MY  
TRAMITE N°30551

FECHA : Iquitos, 14 de octubre del 2020.

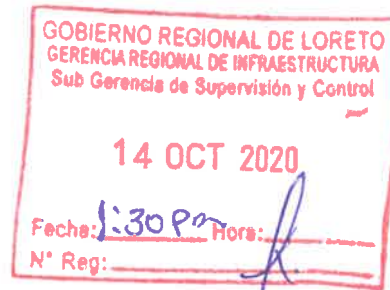

*Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo informar a su despacho, sobre la documentación presentada por el Supervisor de obra referente a la **Valorización de Obra N°07**, correspondiente al mes de setiembre de 2020, que mediante Proveído N°30551 de la SGSyC, se solicita su revisión e informe correspondiente.*

**1. ANTECEDENTES:**

*Mediante Resolución Gerencial Regional N° 086 – 2020 – GRL -GRI, de fecha 04 de Agosto del 2020, la Entidad resuelve aprobar la solicitud de Ampliación de Plazo Excepcional por un periodo de 170 días calendarios.*

*Con fecha 05 de Agosto del 2020, en obra se inician los trabajos de adecuaciones de ambientes para prevenir el contagio y propagación de la COVID – 19.*

*Con fecha 19 de Agosto del 2020, en obra se da por concluida las adecuaciones de los ambientes para prevenir el contagio y propagación de la COVID – 19.*

*En ese sentido, en cumplimiento del Artículo primero de la Resolución Gerencial Regional N° 086 – 2020 – GRL -GRI, con fecha 20 de Agosto del 2020, se da por REINICIADA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA CALLE 28 DE JULIO DE LAS CUADRAS 02 - 08, LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS – LORETO.*

*Mediante Carta N°407-2020-MS.S.SAC/28 (13/10/2020); El Gerente General remite el informe de conformidad de la Valorización mensual N°07 de Obra correspondiente al mes de setiembre del 2020, de la Obra: "Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de la calle 28 de Julio de las cuadras 02-08-Yurimaguas del Distrito de Yurimaguas – Provincia de Alto Amazonas –Departamento de Loreto", donde aprueba el monto de S/ 519,561.78 soles.*

*Al respecto la suscrita indica que la supervisión ha presentado la valorización el 13/10/2020; incumpliendo el plazo estipulado de acuerdo al Art.194.6. donde indica que;*



"AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"

el plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, por lo que la fecha máxima para la presentación de dicha valorización correspondiente al mes de setiembre del 2020 era hasta el 1/09/2020 y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes. Cuando las valorizaciones se refieran a periodos distintos a los previstos en este numeral, las bases establecen el tratamiento correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo.

## 2. GENERALIDADES :

### Del Contratista:

Nombre de la obra	: "Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de la Calle 28 de Julio de las cuadras 02-08-Yurimaguas del Distrito de Yurimaguas-Provincia de Alto amazonas –Departamento de Loreto "
Ubicación	: Distrito: Yurimaguas– Prov.: Alto Amazonas
Entidad	: Gobierno Regional de Loreto
Contratista	: CONSORCIO MORALILLOS-YURIMAGUAS
Presupuesto Contractual	: S/. 6, 689,731.46 SOLES (SIN IGV) con precios al mes de Feb.2019
Plazo de ejecución	: 240 días calendario.
Contratista	: CONSORCIO MORALILLOS - YURIMAGUAS.
Presupuesto Contractual	: S/. 6, 689, 731.46 SOLES (SIN IGV)
Plazo de Ejecución	: 240 días Calendario.
Inicio Plazo de Ejecución	: 10/11/2019.
Término Plazo de Ejecución	: 06/07/2020.
Representante Común	: Ing. Fernando Tapullima Gálvez.
% del mes avance programado.	: 4.16%
% del mes avance ejecutado	: 7.59%
% avance Prog. Acumul.	: 38.72%
% avance Ejecu.. Acumul.	: 49.72%

## 3. CONTENIDO DE LA DOCUMENTACION:

### Del Contratista

#### 1.0 GENERALIDADES

- 1.01 DATOS GENERALES
  - 1.01.1 DATOS GENERALES DE LA OBRA
  - 1.01.2 DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA
- 1.02 ANTECEDENTES
- 1.03 DESCRIPCION DEL PROYECTO



*Handwritten signatures and stamps:*  
Fernando Tapullima Gálvez  
Ing. Fernando Tapullima Gálvez  
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO



"AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"

**2.0 CONTROL DE AVANCE**

- 2.01 DATOS DE AVANCE DE OBRA
- 2.02 DESCRIPCION
- 2.03 AVANCE FISICO DE OBRA
- 2.04 CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA Y COMENTARIO ESPECIFICO

**3.0 CONTROL DE OBRA**

- 3.01 CONTROL DE CAMPO
- 3.02 DESCRIPCION DE LAS OCURRENCIAS TÉCNICAS REALIZADAS EN OBRA.
- 3.03 CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y PRUEBAS DE ENSAYO
- 3.04 RECURSOS UTILIZADOS DURANTE LA OBRA
- 3.05 CONTROL DE PERSONAL EN OBRA Y EQUIPO UTILIZADO
- 3.06 COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DEL RESIDENTE

**4.0 CONTROL ECONOMICO DE LA OBRA**

- 4.01 CONTROL DE VALORIZACIONES
- 4.02 CONTROL DE ADELANTOS
- 4.03 CONTROL DE CARTAS FIANZAS

**5.0 CAMBIOS Y/O MODIFICACIONES AL PROYECTO ORIGINAL.**

**6.0 ANEXOS**

- 6.1 RESUMEN DE VALORIZACION.
- 6.2 VALORIZACION, METRADOS Y REAJUSTES.
- 6.3 CURVA "S" DE AVANCE DE OBRA.
- 6.4 COPIA DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA.
- 6.5 DISEÑOS DE MEZCLAS DE CONCRETO.
- 6.6 COPIA DEL CUADERNO DE OBRA.
- 6.7 PANEL FOTOGRAFICO
- 6.8 OTROS.

**4. CONTROL DE AVANCE DE OBRA**


MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS				
MES	MONTO TOTAL		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL	ACUMUL
	S/.	S/.	%	%
10-NOV - 19	-	-	0.00%	0.00%
30-NOV - 19	683,813.72	683,813.72	10.22%	10.22%
31-DIC-19	596,382.09	1,280,195.81	8.91%	19.14%
31-ENE-20	204,449.90	1,484,645.71	3.06%	22.19%
29-FEB-20	547,691.78	2,032,337.49	8.19%	30.38%
31-MAR -20	198,935.44	2,231,272.93	2.97%	33.35%
30-ABR-20	-	2,231,272.93	0.00%	33.35%
31-MAY-20	0.00	2,231,272.93	0.00%	33.35%
30-JUN-20	0.00	2,231,272.93	0.00%	33.35%
30-JUL-20	0.00	2,231,272.93	0.00%	33.35%
30-AGO-20	80,656.77	2,311,929.70	1.21%	34.56%
30-SET-20	278,583.68	2,590,513.38	4.16%	38.72%
30-OCT-20	842,792.61	3,433,305.99	12.60%	51.32%
30-NOV-20	882,994.16	4,316,300.15	13.20%	64.52%
30-DIC-20	1,136,165.36	5,452,465.51	16.98%	81.50%
30-ENE-21	798,297.08	6,250,762.59	11.93%	93.44%
08-FEB-21	438,968.87	6,689,731.46	6.56%	100.00%
<b>TOTAL CONTRATO</b>	<b>6,689,731.46</b>			



“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS				
MES	MONTO TOTAL		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL	ACUMUL
	S/.	S/.	%	%
10-NOV - 19	-	-	-	-
30-NOV - 19	683,813.72	683,813.72	10.22%	10.22%
31-DIC-19	596,382.09	1,280,195.81	8.91%	19.14%
31-ENE-20	204,449.90	1,484,645.71	3.06%	22.19%
29-FEB-20	547,691.78	2,032,337.49	8.19%	30.38%
31-MAR -20	198,935.44	2,231,272.93	2.97%	33.35%
30-ABR-20	-	2,231,272.93	0.00%	33.35%
31-MAY-20	0	2,231,272.93	0.00%	33.35%
30-JUN-20	0.00	2,231,272.93	0.00%	33.35%
30-JUL-20	0.00	2,231,272.93	0.00%	33.35%
30-AGO-20	587,282.47	2,818,555.40	8.78%	42.13%
30-SET-20	507,647.30	3,326,202.70	7.59%	49.72%
<b>TOTAL EJECUTADO</b>	<b>3,326,202.70</b>			

**- CURVA S - PROGRAMADO V/S EJECUTADO**

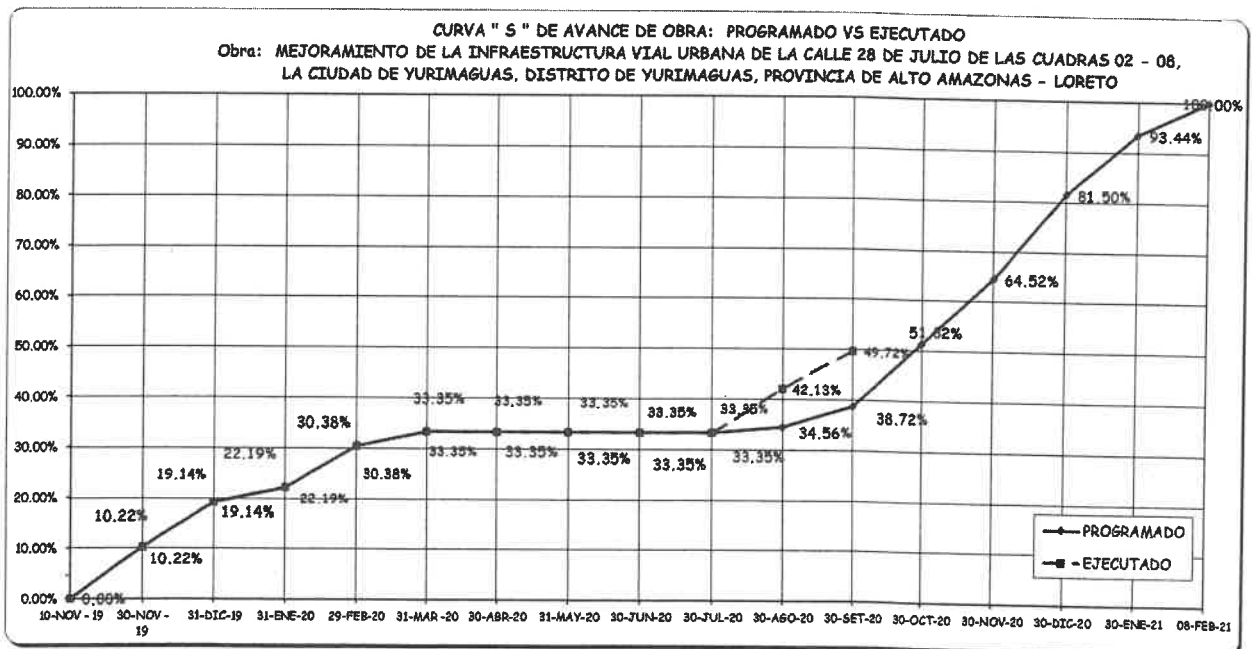

**5. METRADOS EJECUTADOS**

➤ De Acuerdo al Informe Técnico del Supervisor de Obra los Metrados realmente ejecutados en el presente periodo se detallan a continuación:



“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

IT+A10:H43EM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO
		UND	METRADO	METRADO	METRADO	METRADO	METRADO
01	OBRAS PROVISIONALES						
01.01	ALQUILER DE ALMACEN	mes	8.00	5.20	1.00	6.20	1.80
01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m.	und	2.00	2.00		2.00	
01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	GLB	1.00	0.70		0.70	0.30
02	SEGURIDAD Y SALUD						
02.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
02.01.01	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	est	1.00	0.61	0.07	0.68	0.32
02.01.02	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVO	est	1.00	0.61	0.07	0.68	0.32
02.01.03	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	GLB	1.00	0.61	0.07	0.68	0.32
02.01.04	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	GLB	1.00	0.61	0.07	0.68	0.32
02.01.05	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TR	GLB	1.00	0.61	0.07	0.68	0.32
03	SISTEMA DE DESAGUE						
03.01	RED MATRIZ						
03.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES						
03.01.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO, RED MATRIZ	m	660.90	443.60		443.60	217.30
03.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
03.01.02.01	EXCAVACIONES						
03.01.02.01.01	EXCAVACION C/I(MAQ.) TERRENO NORMAL NORMAL P/TUB. 10"	m	660.90	443.60		443.60	217.30
03.01.02.01.02	EXCAVACION DE BUZONES	m3	148.51				148.51
03.01.02.02	ENTIBADO						
03.01.02.02.01	ENTIBADO Y DESENTIBADO DE ZANJAS	m2	844.05	822.43		822.43	21.62
03.01.02.03	RELLENOS						
03.01.02.03.01	CAMA DE APOYO ZANJAS TERRENO NORMAL P/TUBERIA 10", E=0.10M.	m	660.90	443.60		443.60	217.30
03.01.02.03.02	RELLENO CON ARENA (PROTECCION TUBERIA E=0.40M.)	m3	283.74	190.45		190.45	93.29
03.01.02.03.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL MEJORADO EN ZANJA	m3	734.06				734.06
03.01.02.03.04	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZANJA	m3	624.01	624.01		624.01	
03.01.02.03.05	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL	m	660.90	443.60		443.60	217.30
03.01.02.03.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A DISTANCIA 8.00 KM	m3	1,160.45	363.39		363.39	797.06
03.01.03	TUBERIAS						
03.01.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS						
03.01.03.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC S20 UF. DN 260 MM.	m	660.90	443.60		443.60	217.30
03.01.03.01.02	PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE DESAGÜE DN 260MM	m	660.90				660.90
03.02	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE						
03.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES						
03.02.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO, CONEXIONES DOMICILIARES	m	1,137.12	1,120.64		1,120.64	16.48
03.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
03.02.02.01	EXCAVACIONES						
03.02.02.01.01	EXCAVACION MANUAL P/TUB. 6", HASTA 0.90M.	m	1,137.12	1,120.64		1,120.64	16.48
03.02.02.02	RELLENOS						
03.02.02.02.01	CAMA DE APOYO ZANJAS TERRENO NORMAL P/TUBERIA 6", E=0.10M.	m	1,137.12	1,120.64		1,120.64	16.48
03.02.02.02.02	RELLENO CON ARENA (PROTECCION TUBERIA E=0.30 M.)	m3	204.68	201.72		201.72	2.96
03.02.02.02.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL MEJORADO EN ZANJA	m3	387.61				387.61
03.02.02.02.04	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZANJA	m3	376.54	376.54		376.54	
03.02.02.02.05	REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS	m	1,137.12	1,120.64		1,120.64	16.48
03.02.02.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A DISTANCIA 8.00 KM	m3	503.89	349.64		349.64	154.25
03.02.03	TUBERIAS						
03.02.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS						
03.02.03.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC S25 UF. DN 160 mm.	m	1,137.12	1,120.64		1,120.64	16.48
03.02.03.01.02	PRUEBA HIDRAULICA PARA TUBERIA DE CONEXION DOMIC. DESAGÜE.	m	1,137.12	560.32		560.32	576.80
03.02.04	ACCESORIOS						
03.02.04.01	EMPALME A COLECTOR MATRIZ DE CONEXION DOMICILIARIA-DESAGÜE	und	138.00	68.00		68.00	70.00



“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

03.03	CAMARAS DE INSPECCION: BUZONES, BUZONETAS, CAJAS, CAMARAS DE REUNION					
03.03.01	BUZONES					
03.03.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES					
03.03.01.01.01	DEMOLICION DE BUZONES EXISTENTES	und	6.00	6.00		6.00
03.03.01.02	CONSTRUCCION DE BUZONES					
03.03.01.02.01	MATERIAL PARA BASE (HORMIGON), E=0.15 m	m3	6.33			6.33
03.03.01.02.02	SOLADO F'c=100KG/CM2 (e=4"), PARA BUZONES	m2	42.22			42.22
03.03.01.02.03	BUZON DE CONCRETO Ø=1.20m H=1.20m. TN	und	2.00			2.00
03.03.01.02.04	BUZON DE CONCRETO Ø=1.20m H=1.40 m. TN	und	2.00			2.00
03.03.01.02.05	BUZON DE CONCRETO Ø=1.20m H=1.50 - 2.00m. TN	und	5.00			5.00
03.03.01.02.06	BUZON DE CONCRETO Ø=1.20m H=2.00 - 2.50m. TN	und	3.00			3.00
03.03.01.02.07	BUZON DE CONCRETO Ø=1.20 m. H=2.50 - 3.00 m. TN	und	5.00			5.00
03.03.01.02.08	BUZON DE CONCRETO Ø=1.50 m. H=3.00 - 3.50m. TN	und	2.00			2.00
03.03.01.02.09	BUZON DE CONCRETO Ø=1.50 m. H=3.50 - 4.00m. TN	und	2.00			2.00
03.03.02	CAJAS					
03.03.02.01	CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24"	pza	138.00	68.00		68.00 70.00
04	SISTEMA DE AGUA POTABLE					
04.01	TRABAJOS PRELIMINARES					
04.01.01	DEMOLICION Y REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO	m2	16.83			16.83
04.01.02	TRAZO Y REPLANTEO DE RED DE AGUA	m	1,597.60	614.50		614.50 983.10
04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					
04.02.01	EXCAVACION DE ZANJA MANUALMENTE, H=0.70X0.40 M DE Ø 4"	m	1,550.60	614.50		614.50 936.10
04.02.02	EXCAVACION DE ZANJA MANUALMENTE, H=0.80X0.60 M DE Ø 8" Y 10"	m	47.00	32.80		32.80 14.20
04.02.03	EXCAVACION DE ZANJA MANUAL PARA CONEX. DOMICILIARIAS, H=0.60 M	m	570.50	525.00		525.00 45.50
04.02.04	REFINE Y NIVELACION EN ZANJAS PARA TUBERIAS DE Ø 4"	m2	620.24	245.80		245.80 374.44
04.02.05	REFINE Y NIVELACION EN ZANJAS PARA TUBERIAS DE Ø 8" Y 10"	m2	28.20	13.12		13.12 15.08
04.02.06	CAMA DE APOYO DE ARENA EN LA TUBERIA MATRIZ, E=4"	m3	66.84	26.55000		26.55 40.29
04.02.07	RELLENO CON ARENA (PROTECCION TUBERIA E=0.30 M.)	m3	196.53	74.48		74.48 122.05
04.02.08	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	261.38	107.17		107.17 154.21
04.02.09	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A DISTANCIA 8.00 KM	m3	458.73	222.22		222.22 236.51
04.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS					
04.03.01	RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC SAP-ISO-UF C-7.5 DE 110MM	m	1,597.60	614.50		614.50 983.10
04.03.02	RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC SAP-ISO-UF C-7.5 DE 200MM	m	22.00			22.00
04.03.03	RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC SAP-ISO-UF C-7.5 DE 260MM	m	25.00			25.00
04.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS					
04.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC-SAP-ISO 200MM C/REDUCCION A 110MM	und	2.00			2.00
04.04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC-SAP-ISO 260MM C/REDUCCION A 110MM	und	2.00			2.00
04.04.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC-SAP-ISO 160MM C/REDUCCION A 110MM	und	2.00	2.00		2.00
04.04.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC-SAP-ISO 110MM	und	4.00	2.00		2.00 2.00
04.04.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC UF DN110MM. x 45°	und	40.00			40.00
04.04.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION DE ALTO RANGO DE 200MM	und	2.00			2.00
04.04.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION DE ALTO RANGO DE 260MM	und	2.00			2.00
04.04.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON DE 110MM	und	2.00			2.00
