



“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

5. CUADRO COMPARATIVO DE EJECUCION DE OBRA


GRÁFICO DE CONTROL DE VALORIZACIONES DE OBRA - VAL N° 06

PROGRAMADO VS EJECUTADO

Obra :	"MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL AA.HH. EL CASTAÑAL-PAMPA CHICA-DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO"
Ubicación :	DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO

FECHA	PRESUPUESTO OBRA				PRESUPUESTO VALORIZADO				AVANCE / ATRAZO		
	PROGRAMADO	ACUMULADO PROGRAMADO	%	% ACUM.	EJECUTADO	ACUMULADO EJECUTADO	%	% ACUM.	RESPECTO A LO PROGRAMADO ACUMULADO		
									%	DESCRIP	
VAL N° 01	noviembre-19	59,859.92	59,859.92	0.86%	0.86%	59,859.93	59,859.93	0.86%	0.86%	0.00%	ADELANTADA
VAL N° 02	diciembre-19	911,569.09	971,429.01	13.10%	13.96%	911,569.09	971,429.02	13.10%	13.96%	0.00%	ADELANTADA
VAL N° 03	enero-20	1,393,288.50	2,364,717.51	20.02%	33.99%	1,393,288.50	2,364,717.52	20.02%	33.99%	0.00%	ADELANTADA
VAL N° 04	febrero-20	1,581,832.15	3,946,549.66	22.73%	56.72%	1,581,832.16	3,946,549.68	22.73%	56.72%	0.00%	ADELANTADA
VAL N° 05	marzo-20	29,608.72	3,976,158.38	0.43%	57.14%	29,608.72	3,976,158.40	0.43%	57.14%	0.00%	ADELANTADA
VAL N° 06	agosto-20	280,580.41	4,256,738.79	4.03%	61.18%	70,948.44	4,047,106.84	1.02%	58.16%	-3.01%	ATRASADA
VAL N° 07	septiembre-20	677,930.67	4,934,329.46	9.74%	70.91%						
VAL N° 08	octubre-20	1,321,552.70	6,255,882.16	18.99%	89.91%						
VAL N° 09	noviembre-20	687,452.99	6,943,335.15	9.88%	99.79%						
VAL N° 10	diciembre-20	14,758.90	6,958,094.05	0.21%	100.00%						
		6,958,094.05		TOTAL		4,047,106.84					

GRAFICO DE CONTROL DE VALORIZACIONES PROGRAMADO VS EJECUTADO

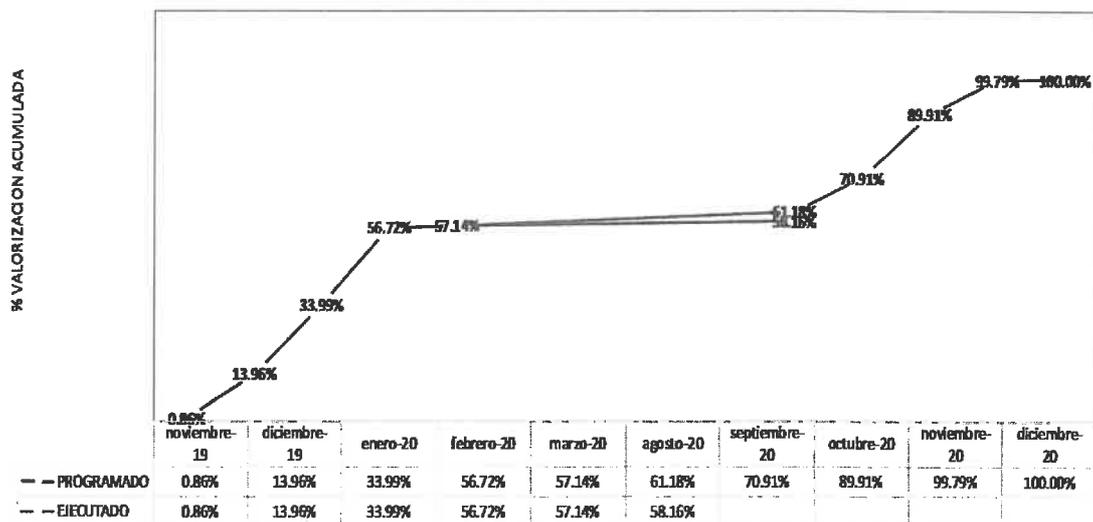



“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”

6. CONCLUSIONES:

- *La presente documentación materia de su revisión, consta con los requerimientos y sustentos que derivan a la presente valorización descritos en el ítem 3. Contenido de la Documentación.*
- *En la documentación, se adjuntan las boletas de pagos realizados a SENCICO, CONAFOVICER, de acuerdo al porcentaje que estima la legislación vigente.*
- *El avance físico del mes es:*
 - *Avance Físico del mes (AGOSTO-2020)..... 1.02. %*
 - *Avance Físico Acumulado..... 58.16 %*
 - *Avance Físico Prog del mes..... 4.03 %*
 - *Avance Físico Prog.acum..... 61.18 %*

La obra en mención tiene un avance físico mensual acumulado al mes de AGOSTO de 2020 de 58.16 %, siendo el estado de la obra ATRAZADA.

7. RECOMENDACIONES:

- *Los metrados han sido conciliados por el Residente y el Inspector de Obra por lo mismo que da Conformidad a la Valorización N°06 (Mediante la Carta N°032/2020-CPC/CE, cuyos metrados fueron autorizados mediante el asiento del cuaderno de obra N°101 – del INSPECTOR, de la obra :“MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL AA.HH. EL CASTAÑAL-PAMPA CHICA-DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA-MAYNAS-LORETO”, teniendo el siguiente detalle:*

1 Valorización N°06 AGOSTO del 2020	S/. 70,948.44
2 Reajuste Actual	S/. 1,489.92(+)
Deducciones	S/ 10.34 (-)
3 Amortización de Adelanto Directo	S/. 7,094.84 (-)
4 Amortización de Adelanto para Materiales	S/. 58,293.21 (-)
5 Neto Facturar	S/. 7,039.96

- *Se recomienda derivar la presente documentación, a la Gerencia Regional de Infraestructura, previa revisión considerando que ya ha sido dada la conformidad por parte del Inspector, cabe indicar que dicha valorización fue presentada por la contratista el 07-09-2020, por lo que no ha presentado en el plazo correspondiente, exhortar al contratista cumplir con los plazos establecidos RLCE vigente; además se recomienda continuar con su trámite correspondiente cumpliendo con los plazos establecidos en el Art.194 Valorizaciones y Metrados de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento modificada por el Decreto Legislativo N°1444 y aprobado por el Decreto Supremo N°344-2018-EF respectivamente.*



“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y trámites correspondientes.

KENYO ALBERTO
MONTES CUELLAR
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 195722

Ing. Kenyo Alberto Montes Cuellar
Inspector de obra
Sub Gerencia de Supervisión y Control

Cc: Ing. Kenyo Alberto Montes Cuellar

Proveido: 25483



"Año de la universalización de la salud"

CARTA N° 0032-2020-CPC/CE

San Juan Bautista, 07 de Setiembre del 2020



Señores:
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Edi W. Ruiz – Gerente Regional de Infraestructura

Atención : KENYO ALBERTO MONTES CUELLAR
Inspector de Obra.

Asunto : VALORIZACION DE OBRA N° 06 AGOSTO 2020

Referencia : Ejecución de la Obra: " MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL AA.HH EL
CASTAÑAL - PAMPACHICA – DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA –
MAYNAS – LORETO"
1) CONTRATO DE N°014-2019-GRL-GGR-GRI



ANTECEDENTES:

1. Con fecha 28 de octubre del 2019, el Consorcio Pavimento Castañal firma contrato con la Entidad.
2. Con fecha 27 de noviembre se hace entrega de terreno.

SUSTENTO:

Tengo el agrado de dirigirme a su persona para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo hacerle llegar formal el INFORME N° 06 (VALORIZACION DE OBRA N° 06 – AGOSTO 2020), de la obra en la referencia, donde se informa de las actividades realizadas en obra.

Por lo antes señalado agradeceré su atención a la presente.

Atentamente,

CONSORCIO PAVIMENTO CASTAÑAL
Manuel Wilfredo Herrera Maguina
Representante Común
DNL. 31661697



cc. Copia Archivo
1 original + 3 copias + 1 CD

PROVEIDO N° 25483
A SGSYC - GRE
PARA: Atención






"Año de la universalización de la salud"

CARTA N° 0032-2020-CPC/CE


San Juan Bautista, 07 de Septiembre del 2020



Señores:
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Edi W. Ruiz – Gerente Regional de Infraestructura

Atención : **KENYO ALBERTO MONTES CUELLAR**
Inspector de Obra.

Asunto : **VALORIZACION DE OBRA N° 06 AGOSTO 2020**



Referencia : **Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL AA.HH EL
CASTAÑAL - PAMPACHICA – DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA –
MAYNAS – LORETO"**
1) **CONTRATO DE N°014-2019-GRL-GGR-GRI**

ANTECEDENTES:

1. Con fecha 28 de octubre del 2019, el Consorcio Pavimento Castañal firma contrato con la Entidad.
2. Con fecha 27 de noviembre se hace entrega de terreno.

SUSTENTO:

Tengo el agrado de dirigirme a su persona para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo hacerle llegar formal el INFORME N° 06 (VALORIZACION DE OBRA N° 06 – AGOSTO 2020), de la obra en la referencia, donde se informa de las actividades realizadas en obra.

Por lo antes señalado agradeceré su atención a la presente.

Atentamente,

CONSORCIO PAVIMENTO CASTAÑAL
Manuel Wilfredo Herrera Maguina
Representante Común
DNI. 31661697



PROVIDO: 25483
A: SGSYC - GRI
PARA: Atención

cc. Copia Archivo
1 original + 3 copias + 1 CD
