



De acuerdo al informe presentado por el Residente y Supervisor de obra, en la que se describe, cuantifica y aprueba los trabajos ejecutados para la Valorización cuyos avances ejecutados y programados es el siguiente:

✓ Montos Valorizados Ejecutados

MES	MONTO TOTAL (Inc. IGV)		PORCENTAJES	
	PRINCIPAL	ACUMUL	PARCIAL	ACUMUL
	S/.	S/.	%	%
20-oct-2019				0.0%
30-nov-2019	962,203.98	962,203.98	24.27%	24.27%
31-dic-2019	123,998.27	1,086,202.25	3.13%	27.40%
31-ene-2020	-	-	0.00%	0.00%
28-feb-2020	505,049.71	1,591,251.96	12.74%	40.14%
31-mar-2020	110,729.72	1,701,981.68	2.79%	42.93%
30-jul-2020	482,780.51	2,184,762.19	12.18%	55.11%
31-ago-2020	660,478.58	2,845,240.77	16.66%	71.77%
30-sep-2020	266,478.60	3,111,719.37	6.72%	78.49%
31-oct-2020				
30-nov-2020				
27-dic-2020				

✓ Montos Valorizados Programados


MES	MONTO TOTAL (sin IGV)		PORCENTAJES	
	PRINCIPAL	ACUMUL	PARCIAL	ACUMUL
	S/.	S/.	%	%
20-oct-2019				0.00%
30-nov-2019	962,203.98	962,203.98	24.27%	24.27%
31-dic-2019	123,998.27	1,086,202.25	3.13%	27.40%
31-ene-2020	-	1,086,202.25	0.00%	27.40%
28-feb-2020	505,049.71	1,591,251.96	12.74%	40.14%
31-mar-2020	110,729.72	1,701,981.68	2.79%	42.93%
30-jul-2020	88,424.51	1,790,406.19	2.23%	45.16%
31-ago-2020	259,540.84	2,049,947.04	6.55%	51.71%
30-sep-2020	964,168.23	3,014,115.27	24.32%	76.03%
31-oct-2020	687,889.64	3,702,004.91	17.35%	93.38%
30-nov-2020	215,508.02	3,917,512.93	5.44%	98.82%
27-dic-2020	46,884.62	3,964,397.53	1.18%	100.00%

Grethly Madelena Zapata Espinoza
Grethly Madelena Zapata Espinoza
ING. CIVIL
R. CIP. N° 211312



"Año de la Universalización de la Salud"

CURVA "S"
AVANCE DE OBRA:
PROGRAMADO VS EJECUTADO

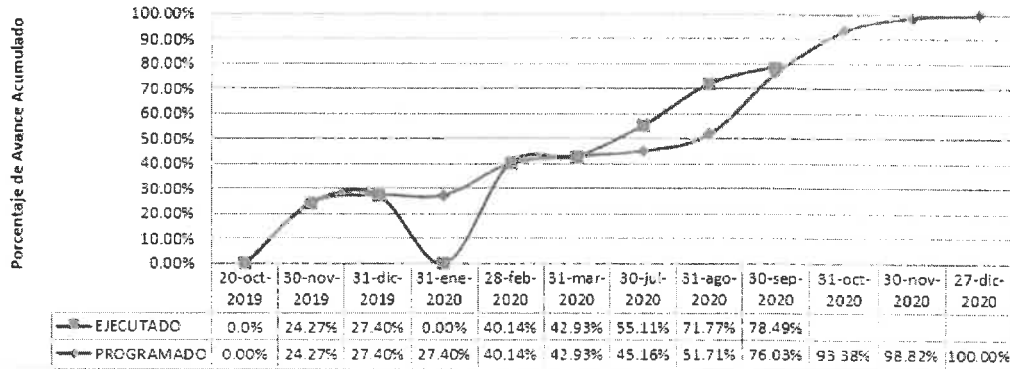

ITEM	DETALLE	FECHA EMISION	VALORIZ. BRUTA	REAJUSTE	AMORT AD DIRECTO	AMORT AD MATERIALES	DEDUCT. AD. DIRECTO	DEDUCT. AD. MAT.	VALORIZ. NETA	TOTAL
1.00	ADELANTO DIRECTO								396,440.00	396,440.00
2.00	ADELANTO DE MATERIALES								-	-
3.00	VALORIZACION N° 01	nov-19	962,203.98	9,622.04	96,220.40	-	0.00	-	875,605.62	875,605.62
4.00	VALORIZACION N° 02	dic-19	123,998.27	1,611.98	123,998.27	-	36.83	-	1,575.15	1,575.15
5.00	VALORIZACION N° 03	ene-20							-	-
6.00	VALORIZACION N° 04	feb-20	505,049.71	5,555.55	50,504.97	101,915.45	50.00	(247.39)	358,382.23	358,382.23
7.00	VALORIZACION N° 05	mar-20	110,729.72	1,993.14	11,072.97	29,496.43	87.71	105.23	71,960.52	71,960.52
8.00	VALORIZACION N° 06	jul-20	482,780.51	7,724.49	48,278.05	97,882.66	286.80	240.31	343,817.18	343,817.18
9.00	VALORIZACION N° 07	ago-20	660,478.58	13,209.57	66,365.34	165,102.24	458.60	1,434.54	440,327.44	440,327.44
10.00	VALORIZACION N° 08	sep-20		-	-				-	-
11.00	VALORIZACION N° 09	oct-20								
12.00	VALORIZACION N° 10	nov-20								
13.00	VALORIZACION N° 11	dic-20								
			2,845,240.77	39,716.77	396,440.00	394,396.78	919.94	1,532.68	2,488,108.14	2,488,108.14

Página 7

Grethly Madeline Díaz Cisneros Zapata Espinoza
ING. CIVIL
R/CIP. N° 211312



- ✓ La obra en mención tiene un avance físico acumulado al mes de setiembre 2020 de 68.92% versus calendario programado acumulado al mismo periodo de 50.28%, siendo el estado de la Obra ADELANTADA.

DESCRIPCION	VALORIZACION ACTUAL	VALORIZACION ACTUAL
1.- Monto valorizado en el presente mes :	S/. 266,478.60	S/. 266,478.60
. Valorización del Mes	S/. 266,478.60	S/. 266,478.60
2.- Reajuste de las valorizaciones :	S/. 5,329.57	S/. -
. Reajuste de la valorización	S/. 5,329.57	S/. -
3.- Amortizaciones :	S/. 58,381.32	S/. 58,381.32
. Del Adelanto en Efectivo	S/. -	S/. -
. Del Adelanto de Materiales	S/. 58,381.32	S/. 58,381.32
4.- Deducion del reajuste que no corresponde :	S/. 501.99	S/. -
. Por Adelanto en Efectivo	S/. -	S/. -
. Por Adelanto de Materiales	S/. 501.99	S/. -
5.- Otros :	S/. -	S/. -
. Retencion	S/. -	S/. -
. Multas	S/. -	S/. -
A - MONTO LIQUIDO A PAGAR (1+2-3-4-5)	S/. 212,924.86	S/. 208,097.28
B - I.G.V. (18% de A)		
C.- MONTO EN EFECTIVO A CANCELAR AL CONTRATISTA	S/. 212,924.86	S/. 208,097.28


Grethy Madroñero Del Cisne Zapata Espinoza
ING. CIVIL
R. CIP. N° 211312



2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ En concordancia con la Cláusula Cuarta del Contrato del Contratista describe lo siguiente: La Entidad se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA, en soles, en periodos de valorización mensuales.
- ✓ Según lo estipulado en el artículo 166° del RLCE, las valorizaciones tienen carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada periodo previsto en las Bases, por el Supervisor y el Contratista.
- ✓ Bajo ese contexto, el Supervisor presenta la valorización de Obra N°007 correspondiente al mes de SETIEMBRE 2020, aprobandos los metrados ejecutados en obra, conforme a lo estipulado en el contrato N°009-2019-GRL-GGR-GRI.
- ✓ Cabe señalar que los reajustes se pagarán en la liquidación de obra
- ✓ De acuerdo a la documentación presentada por el Supervisor, donde éste aprueba los metrados ejecutados y da conformidad a la valorización presentada por el contratista, se recomienda a la Gerencia Regional de infraestructura tramitar el pago de la valorización de obra N°007 correspondiente al mes de SETIEMBRE 2020, por el monto S/.208,097.28 doscientos ocho mil noventa y siete con 28/100 soles.

Es todo cuanto puedo informarle a usted para conocimiento y trámite respectivo; agradeciendo su atención al presente me suscribo de usted.

Atentamente



Grethly Madeleine De Cisse Zapata Espinoza
ING. CIVIL
R. CIP. N° 211312

MADELEINE ZAPATA ESPINOZA
Ing. Civil - Coordinadora de Obra
