




"Año de la Universalización de la Salud"

| CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO (CAOP) VS. CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA ACTUALIZADO (CAOA) ACTUALIZADO A LA FECHA DE INICIO DE PLAZO | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|-----------|--------------|--------|---|--------------|-----------|--------------|--------|----------------------|--------------|
| PERIODO | VALORIZACIONES DE OBRA PROGRAMADAS - MONTO SIN I.G.V. (S/) | | | | | VALORIZACIONES DE OBRA EJECUTADAS - MONTO SIN I.G.V. (S/) | | | | | SITUACION DE LA OBRA | |
| | CONTRATO | TOTAL | % PARCIAL | ACUMULADO | % ACUM | CONTRATO | TOTAL | % PARCIAL | ACUMULADO | % ACUM | ADELANTADO (%) | ATRASADO (%) |
| | PRINCIPAL | | | | | PRINCIPAL | | | | | | |
| noviembre-19 | 59,859.92 | 59,859.92 | 0.86% | 59,859.92 | 0.86% | 59,859.93 | 59,859.93 | 0.86% | 59,859.93 | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
| diciembre-19 | 911,569.09 | 911,569.09 | 13.10% | 971,429.02 | 13.86% | 911,569.09 | 911,569.09 | 13.10% | 971,429.02 | 13.86% | 0.00% | 0.00% |
| enero-20 | 1,393,288.50 | 1,393,288.50 | 20.02% | 2,364,717.52 | 33.99% | 1,393,288.51 | 1,393,288.51 | 20.02% | 2,364,717.53 | 33.99% | 0.00% | -0.00% |
| febrero-20 | 1,581,832.15 | 1,581,832.15 | 22.73% | 3,946,549.67 | 56.72% | 1,581,832.16 | 1,581,832.16 | 22.73% | 3,946,549.69 | 56.72% | 0.00% | -0.00% |
| marzo-20 | 29,608.72 | 29,608.72 | 0.43% | 3,976,158.39 | 57.14% | 29,608.72 | 29,608.72 | 0.43% | 3,976,158.41 | 57.14% | 0.00% | -0.00% |
| agosto-20 | 280,580.41 | 280,580.41 | 4.03% | 4,256,738.80 | 61.18% | 70,948.44 | 70,948.44 | 1.02% | 4,047,106.85 | 58.18% | -3.01% | 3.01% |
| septiembre-20 | 677,590.67 | 677,590.67 | 9.74% | 4,934,329.46 | 70.91% | 28,521.37 | 28,521.37 | 0.41% | 4,075,628.22 | 58.57% | -12.34% | 12.34% |
| octubre-20 | 1,321,552.70 | | | | | | | | | | | |
| noviembre-20 | 687,452.99 | | | | | | | | | | | |
| diciembre-20 | 14,758.90 | | | | | | | | | | | |
| | 6,958,094.06 | 4,934,329.46 | 70.91% | 4,934,329.46 | 70.9% | 4,075,628.22 | 4,075,628.22 | 58.57% | 3,946,549.69 | 57.14% | | 0.00% |

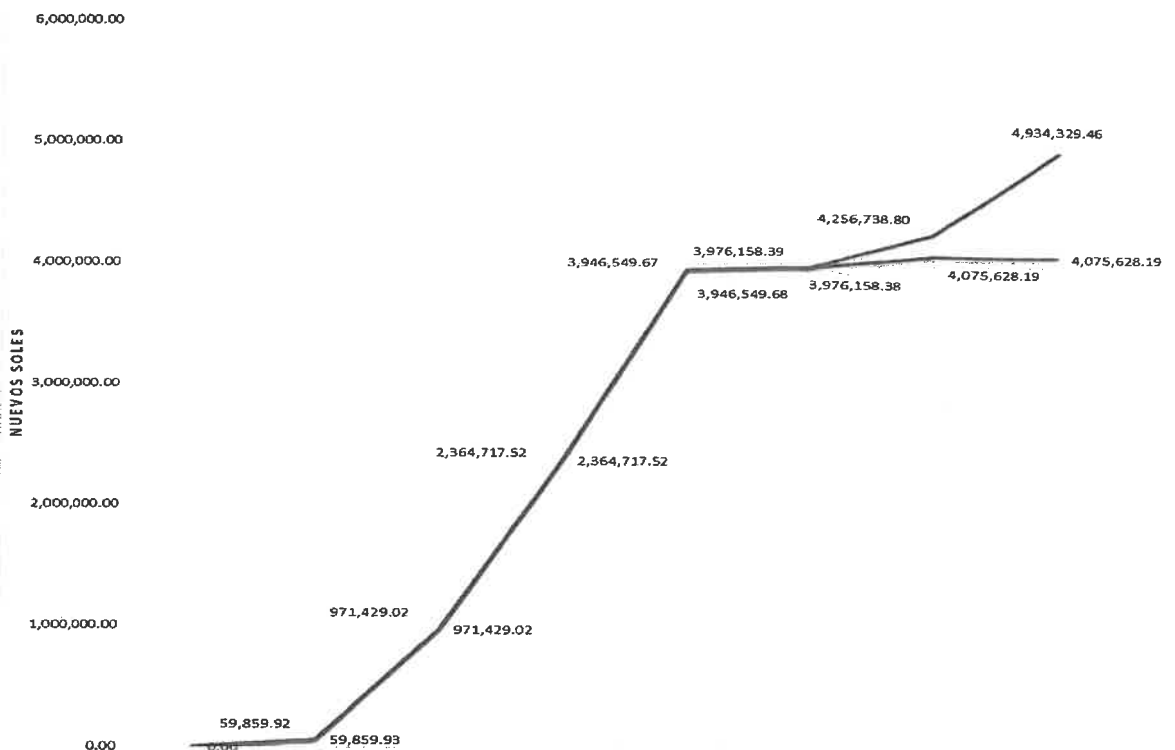

El suscrito en Calidad de Coordinador, verifico que la documentación presentada, se encuentra conforme, debido a que se verifico que los metrados descritos en el Cuaderno de Obra, son compatible con la Valorización de Obra N° 07 – mes de Septiembre 2020. Asimismo, La firma contratista acreditada el pago a SENCICO por la suma de S/. 58.00 y la constancia de estar al día en sus pagos a ESSALUD - CONAFOVISER, ONP, SCTR. Presentando comprobante de pago al mes de la valorización, en cumplimiento de la Ley.

El suscrito realizo la revisión de la documentación presentada en la Valorización, los cálculos de reajustes, el cálculo de las amortizaciones de Adelanto Directo y materiales, correspondientes a la Valorización de Obra N° 07 – correspondiente al mes de Septiembre - 2020, por el cual se otorga la conformidad respectiva.



"Año de la Universalización de la Salud"

IV. RECOMENDACIÓN:

Se recomienda, tramitar el pago de la valorización Obra N° 07 – correspondiente al mes de Septiembre – 2020, por un monto Neto a Pagar de **Veintiséis Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho y 30/100 Soles (S/. 26,488.30)**, sin IGV.; a favor del Contratista **Consortio Pavimento Castañal**, por la ejecución de la obra "**Mejoramiento de las Calles del AAHH El Castañal – Pampachica - Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Región Loreto**"; por lo que el suscrito encuentra conforme a la documentación presentada.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y trámites correspondientes.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GR-SSVC

VÍCTOR OSWALDO DA SILVA DEL ÁGUILA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 146160

Cc.
Archivo



CONSORCIO SUPERVISOR CASTAÑAL

Año de la Universalización de la Salud

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Sub Gerencia de Supervisión y Control
09 OCT 2020
Fecha: 30022 Hora: 11:13 Am
N° Reg: _____

Quitos, 07 de Octubre del 2020

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
08 OCT 2020
Hora: 10.09. am
Reg. N° _____

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
08 OCT 2020
Hora: _____
Reg. N° _____

Carta N° 011-2020-CSC-RC

Señores:
Gobierno Regional de Loreto
Av. Abelardo Quiñones Km 1.5 – Belén.
Presente.

- Atención : Gerencia Regional de Infraestructura
- Asunto : VALORIZACIÓN N° 07 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2020.
- Referencia : Contrato N° 032-2020-GRL-GGR-GRI

De mi especial consideración.

Por la presente yo, Marco Sergio Chupillón Campos, identificado con DNI N° 16419686, representante común del CONSORCIO SUPERVISOR CASTAÑAL , me es grato dirigirme a Ud. Para saludarlo y a la vez alcanzarle la Valorización N° 07 de la Obra "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL AA.HH. CASTAÑAL – PAMPACHICA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA – MAYNAS – LORETO".

Sin otro particular y esperando su atención a la presente, me despido de Usted.

Atentamente.

CONSORCIO SUPERVISOR CASTAÑAL
Marco Sergio Chupillón Campos
Marco Sergio Chupillón Campos
REPRESENTANTE COMUN
DNI N° 16419686

01 AIP
6544

PROVEIDO N° 30022
A: S.G.B y C
Evaluación e Informe



PROVEIDO N° 30022
A: Ing. Victor Da Silva
P.M.: SU
Atención
09/10/2020





“Año de la universalización de la salud”

CARTA N° 0046-2020-CPC/CE

San Juan Bautista, 07 de Octubre del 2020

Señores:
CONSORCIO SUPERVISOR CASTAÑAL



Atención : Silvia Chuquital Quispe
SUPERVISOR DE OBRA.

Asunto : INFORME N° 07
VALORIZACION DE OBRA N° 07 SETIEMBRE 2020

Referencia : Ejecución de la Obra:” MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL AA.HH EL
CASTAÑAL - PAMPACHICA – DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA –
MAYNAS – LORETO”
1) CONTRATO DE N°014-2019-GRL-GGR-GRI

ANTECEDENTES:

1. Con fecha 28 de octubre del 2019, el Consorcio Pavimento Castañal firma contrato con la Entidad.
2. Con fecha 27 de noviembre se hace entrega de terreno.


SUSTENTO:

Tengo el agrado de dirigirme a su persona para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo hacerle llegar formal el INFORME N° 07 (VALORIZACION DE OBRA N° 07 – SETIEMBRE 2020), de la obra en la referencia, donde se informa de las actividades realizadas en obra.

Por lo antes señalado agradeceré su atención a la presente.

Atentamente,

CONSORCIO PAVIMENTO CASTAÑAL


Manuel Wilfredo Herrera Maguina
Representante Común
DNI 31661697
