




"Año de la Universalización de la Salud"

Belén, 30 noviembre de 2020

Oficio n.º 2165-2020-GRL-GRI-SGSyC

Ingeniero Edi Wisberto Ruiz Zárate.  
Gerente Regional de Infraestructura.  
Presente



Asunto: Remite Valorización de Obra n.º 02 -  
OCTUBRE 2020.

Obra: "Construcción de vías de acceso; en el (la) calle circunvalación calle Juan Pablo II, calle Luis Rengifo Alvarado y calle Roldan Tuesta Ruiz del barrio Shiringal - L = 1.307.57 ML = 1.31 km Distrito de Contamana, provincia Ucayali departamento de Loreto"

Ref.: a. Informe n.º 123-2020-GRL/GRI/SGSyC/DPCL  
b. Carta n.º 20-2020-JKP-CU

Tengo el agrado de saludarle cordialmente, a su vez alcanzarle la documentación de la **Valorización n.º 02 por ejecución de obra**, que asciende a la suma de **(cuarenta y nueve mil setecientos noventa y cuatro con 57/100 soles) (S/49,794.57)** aprobada y presentada por el inspector, mediante carta de la referencia a), correspondiente a **OCTUBRE del 2020**, de acuerdo al siguiente detalle

<b>Valorización Bruta N.º 02</b>	S/	<b>49,794.57</b>
Reajuste Neto	S/	0.00
Amortización Adelanto Directo	S/	0.00
Amortización Adelanto por Materiales	S/	0.00
Deducción Reaj. Que No Corresp. A/D	S/	0.00
Deducción Reaj. Que No Corresp. A/M	S/	0.00
<b>Neto a Pagar</b>	<b>S/</b>	<b>49,794.57</b>

Asimismo, la ejecución de la obra a octubre del 2020 tiene un avance real ejecutado acumulado de **56.21%** versus un programado de **68.19%**, encontrándose la obra atrasada y en ejecución.

Se remite la conformidad de la valorización, para continuar con el trámite respectivo a favor de **CONSORCIO UCAYALI** conforme lo detallan los documentos de la referencia.

Atentamente.

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
Gerencia Regional de Infraestructura

Ing. RAUL FLORES AQUERUCHO  
Sub Gerente de Supervisión y Control

Copia: Inspector de Obra  
Ing. dpcl  
SGSyC - File de obra (01)  
SGSyC - File correlativo (01)  
SGSyC - File personal (01)  
TE: 00123

PROVINCIA

A Secretaría Operativa  
PARA: OEI





**INFORME N°123-2020-GRL/GRI/SGSyC/DPCL**



AL : Ing. Raúl Flores Aquepucho  
Sub Gerente de Supervisión y Control.

DE : Ing. Diana Paola Castro Litano  
Inspector de Obra.

ASUNTO : **VALORIZACION DE OBRA N° 02- MES DE OCTUBRE DEL 2020.**  
OBRA.- "CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO; EN EL (LA) CALLE CIRCUNVALACION CALLE JUAN PABLO II, CALLE LUIS RENGIFO ALVARADO Y CALLE ROLDAN TUESTA RUIZ DEL BARRIO SHIRINGAL - L =1.307.57 ML 1.31 KM - DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA UCAYALI DEPARTAMENTO DE LORETO".

REFERENCIA: a) CARTA N°20-2020-JKP-CU/ CONSORCIO UCAYALI  
TRAMITE: 33444

FECHA : Iquitos, 06 de noviembre del 2020.

*Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo informar a su despacho, sobre la documentación presentada por el Contratista de obra referente a la Valorización de Obra N°02, correspondiente al mes de OCTUBRE del 2020, que mediante Proveído N°33444 de la SGSyC, se solicita su revisión e informe correspondiente.*

**1. ANTECEDENTES :**

Mediante CARTA N°20-2020-JKP-CU/ CONSORCIO UCAYALI remite toda la documentación relacionada a la obra descrita líneas arriba con respecto a la Valorización de Obra N°02 mes de octubre del 2020, de la Obra: "CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO; EN EL (LA) CALLE CIRCUNVALACION CALLE JUAN PABLO II, CALLE LUIS RENGIFO ALVARADO Y CALLE ROLDAN TUESTA RUIZ DEL BARRIO SHIRINGAL - L =1.307.57 ML =1.31 KM DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA UCAYALI DEPARTAMENTODE LORETO"; La cual asciende al monto S/ 49,794.57.

**2. GENERALIDADES :**

**Del Contratista:**

Nombre de la obra : "Construcción de vías de acceso; en el (la) calle circunvalación calle juan pablo ii, calle Luis Rengifo Alvarado y calle roldan tuesta Ruiz del barrio Shiringal - L =1.307.57 ML =1.31 km Distrito de Contamana, provincia Ucayali departamento de Loreto"

Ubicación : Distrito de Contamana, provincia Ucayali departamento de Loreto"

Entidad : Gobierno Regional de Loreto

Contrato : N° 16-C -2020-GRL-GGR-GRI

Firma de Contrato : 13 de marzo del 2020

Valor Contratado : S/. 354,558.55

Valor Referencial : S/. 354,558.55



"AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"

Ubicación : Distrito de Contamana.  
Otorgamiento de Buena Pro : 24/02/2020  
Plazo Contratado : 60 días Calendarios  
Contratista : Consorcio Ucayali  
Modalidad de Ejecución : A precios unitarios.  
Representante Común : José Antonio Padilla Koo

**3. CONTROL DE AVANCE DE OBRA**


El Residente de Obra manifiesta en su informe que el avance de obra presentado para la **Valorización N°02 OCTUBRE** de 2020 que su porcentaje de avance de obra programado acumulado es de **68.19%** mientras que su porcentaje de avance de obra ejecutado acumulado es de **56.21%**, lo cual indica que la obra se encuentra **ATRASADA**.



P.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				AVANCE							SALDO				
		Und	Metrado	P. Unit.	Presup.	ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO			Metrado	Valorizado S/	%		
						Metrado	Valorizado S/	Metrado	Valorizado S/	Metrado	Valorizado S/	%					
01.01	CONSTRUCCION DE VAS DE ACCESO, EN EL (L) CALLE PALESTINA, CALLE BELANISTA, CALLE MARACAN, Y CALLE BELFLODEL AA RR. OBRAS PROVISIONALES																
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 5.40M X 3.60M INCL MARCO DE 2x2", BASTIDORES, GIGANTOGRAFIA Y COLOCACION	und	1.00	923.65	923.65	1.00	923.65	0.00	0.00	1.00	923.65	100.00%	0.00	0.00	0.00%		
01.01.02	ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANA	mes	1.00	500.00	500.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%		
01.01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS PARA LA OBRA	Und	1.00	3,000.00	3,000.00	0.50	1,500.00	0.00	0.00	0.50	1,500.00	50.00%	0.50	1,500.00	50.00%		
01.02	OBRAS PRELIMINARES																
01.02.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	8,002.06	2.88	23,045.93	8002.06	23,045.93	0.00	0.00	8,002.06	23,045.93	100.00%	0.00	0.00	0.00%		
01.02.02	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA	m2	6,668.39	3.29	21,939.00	6668.39	21,939.00	0.00	0.00	6,668.39	21,939.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%		
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS																
01.03.01	LIMPIEZA DE TERRENO CON MAQUINARIA	km	1.33	2,137.36	2,842.69	1.33	2,842.69	0.00	0.00	1.33	2,842.69	100.00%	0.00	0.00	0.00%		
01.03.02	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE	m2	9,335.74	4.30	40,143.68	9335.74	40,143.68	0.00	0.00	9,335.74	40,143.68	100.00%	0.00	0.00	0.00%		
01.03.03	CONFORMACION DE CUNETAS LATERALES	m	2,667.35	6.15	16,404.20	2667.35	16,404.20	0.00	0.00	2,667.35	16,404.20	100.00%	0.00	0.00	0.00%		
01.03.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPOS	m3	1,213.65	12.70	15,413.36	1213.65	15,413.36	0.00	0.00	1,213.65	15,413.36	100.00%	0.00	0.00	0.00%		
01.04	AFIRMADO																
01.04.01	AFIRMADO DE PLATAFORMA DE RODADURA E=10 CM (80% H. + 20% T.R.)	m2	6,668.39	25.40	169,377.11	0.00	0.00	1,633.68	41,495.47	1,633.68	41,495.47	24.50%	5,034.71	127,881.63	75.50%		
01.05	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA																
01.05.01	EQUIPAMIENTO DE PROTECCION INDIVIDUAL	Und	1.00	510.00	510.00	1.00	510.00	0.00	0.00	1.00	510.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%		
01.05.02	EQUIPAMIENTO DE PROTECCION COLECTIVA	Und	1.00	725.00	725.00	1.00	725.00	0.00	0.00	1.00	725.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%		
01.05.03	EQUIPO TEMPORAL DE SEGURIDAD	Und	1.00	640.00	640.00	1.00	640.00	0.00	0.00	1.00	640.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%		
	<b>COSTO DIRECTO (CD)</b>				<b>295,464.62</b>		<b>124,587.51</b>		<b>41,495.47</b>		<b>166,082.58</b>					<b>128,381.63</b>	
	<b>GASTOS GENERALES (10% de CD)</b>				<b>29,546.46</b>		<b>12,458.75</b>		<b>4,149.55</b>		<b>16,608.30</b>					<b>12,938.16</b>	
	<b>UTILIDAD (10% de CD)</b>				<b>29,546.46</b>		<b>12,458.75</b>		<b>4,149.55</b>		<b>16,608.30</b>					<b>12,938.16</b>	
	<b>sub total</b>				<b>354,557.54</b>		<b>149,505.01</b>		<b>49,794.57</b>		<b>199,299.58</b>					<b>155,257.95</b>	
	<b>factor de relacion</b>		<b>1.000000</b>		<b>354,557.54</b>		<b>149,505.01</b>		<b>49,794.57</b>		<b>199,299.58</b>					<b>0.00</b>	
	<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>				<b>354,557.54</b>		<b>149,505.01</b>		<b>49,794.57</b>		<b>199,299.58</b>					<b>155,257.95</b>	
	<b>PROCENTAJE DE AVANCE DE OBRA</b>				<b>100.00%</b>		<b>42.17%</b>		<b>14.04%</b>		<b>56.21%</b>					<b>43.79%</b>	



**CURVA S - PROGRAMADO V/S EJECUTADO**

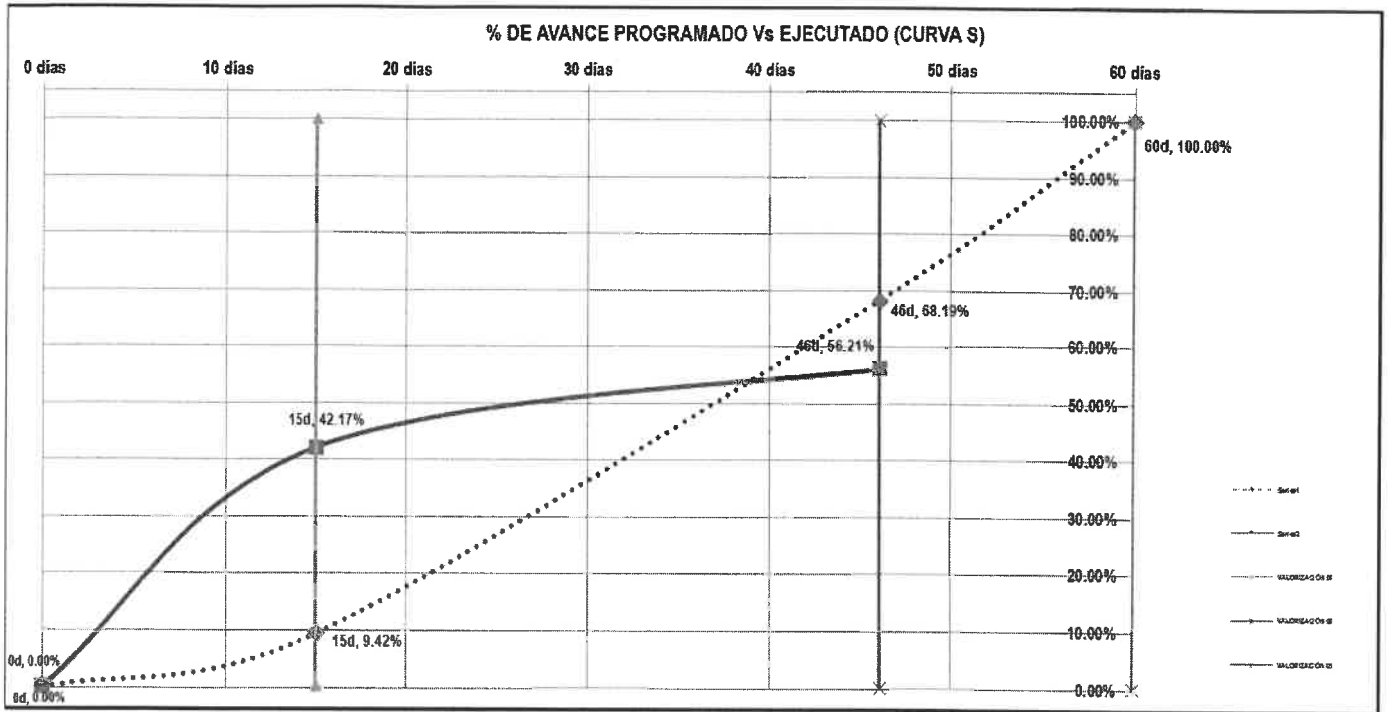

**4. CONCLUSIONES:**

- La presente documentación materia de su revisión, consta con los requerimientos y sustentos que derivan a la presente valorización.
- En la documentación, se adjuntan las boletas de pagos realizados a **SENCICO**, de acuerdo al porcentaje que estima la legislación vigente, pago de póliza **SCTR**.
- El avance físico del mes es: **14.04 %**
- El avance programado al mes de **58.77%**.
- En este caso la Valorización Acumulada Ejecutada alcanzo el **56.21%**, mientras que la Valorización Acumulada Programada es del **68.19 %**.
- Es por ello que en esta 2da Valorización correspondiente al mes de octubre-2020, la Ejecución de la obra se encuentra **ATRASADA**.



**5. RECOMENDACIONES:**

- Los metrados han sido conciliados por el Residente e Inspector de Obra por lo mismo que Da Conformidad a la **Valorización N°02** correspondiente al mes de **OCTUBRE**, de la obra "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE ACCESO; EN EL (LA) CALLE CIRCUNVALACIÓN CALLE JUAN PABLO II, CALLE LUIS RENGIFO ALVARADO Y CALLE ROLDAN TUESTA RUIZ DEL BARRIO SHIRINGAL - L =1.307.57 ML =1.31 KM DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA UCAYALI DEPARTAMENTO DE LORETO".
- Visto la Valorización N°02 correspondiente al mes de OCTUBRE 2020 ; por lo que se le da conformidad, y se recomienda el pago correspondiente a la empresa **CONSORCIO UCAYALI**, siendo el monto a pagar de **S/ 49,794.57 (Cuarenta y nueve mil setecientos noventa y cuatro con 57/100 soles) sin IGV**, como se detalla:

<b>Valorización BRUTA N°02- Octubre del 2020</b>	<b>S/</b>	<b>49,794.57</b>
Reajuste de fiel cumplimiento	S/	0.00
Deducción	S/	0.00
Amortización Adelanto Directo	S/	0.00
<b>Neto Facturar</b>	<b>SI.</b>	<b>49,794.57</b>

Se recomienda seguir los procedimientos de acuerdo al RLCE artículo 194, y continuar con su trámite correspondiente.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y tramite respectivo.

Atentamente

Ing. DIANA PAOLA CASTRO LITANO  
Inspector de Obra  
Sub Gerencia de Supervisión y Control



# CONSORCIO UCAYALI



**CARTA N° 20-2020-JPK-CU**  
Sr. (es): Gerente Regional de Infraestructura  
**EDI WISBERTO RUIZ ZARATE**  
Presente.-

33444  
06 NOV 2020

Gobierno Regional de Loreto  
Gerencia Regional de Infraestructura  
06 NOV 2020  
Hora: 2:07 pm  
Reg. N°  
Reymaf

**Asunto** : Remito Valorizaciones de Obra N° 02,  
Correspondiente al mes de Octubre del 2020

**Referencia:** a) Contrato N° 16-B-2020-GRL-GGR-GRI  
b) Contrato N° 16-C-2020-GRL-GGR-GRI  
c) Contrato N° 16-D-2020-GRL-GGR-GRI

**Obras** : "Construcción de vías de acceso; en el (la) calle Alfonso Ugarte y calle Buenaventura Marquez I: 1,090.15 m-1.09 km distrito de Contamana, Provincia de Ucayali, Departamento de Loreto",

"Construcción de vías de acceso; en el (la) calle Circunvalacion, calle Juan Pablo II, calle Luis Rengifo Alvarado y calle Roldan Tuesta Ruiz del Barrio Shiringal – l=1,307.57 ml – 1.31 km – Distrito de Contamana – Provincia de Ucayali – Departamento de Loreto",

"Construcción de vías de acceso; en el (la) calle Palestina, calle Bellavista, calle Maracana y calle belen – aa.hh. Padre Zapico Ramos l=1,691.40 m-1.69 km, Distrito de Contamana, Provincia de Ucayali, Departamento de Loreto".

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo muy cordialmente y en cumplimiento del compromiso contractual, establecido con el Gobierno Regional de Loreto, respecto a las ejecuciones de la Obras indicadas en la referencia ; hacerle llegar adjunto los Informes y Valorizaciones N° 02, correspondiente al mes de Octubre del 2020, de la ejecución de las obras: "Construcción de vías de acceso; en el (la) calle Alfonso Ugarte y calle Buenaventura Marquez I: 1,090.15 m-1.09 km distrito de Contamana, Provincia de Ucayali, Departamento de Loreto", "Construcción de vías de acceso; en el (la) calle Circunvalacion, calle Juan Pablo II, calle Luis Rengifo Alvarado y calle Roldan Tuesta Ruiz del Barrio Shiringal – l=1,307.57 ml – 1.31 km – Distrito de Contamana – Provincia de Ucayali – Departamento de Loreto", "Construcción de vías de acceso; en el (la) calle Palestina, calle Bellavista, calle Maracana y calle belen – aa.hh. Padre Zapico Ramos l=1,691.40 m-1.69 km, Distrito de Contamana, Provincia de Ucayali, Departamento de Loreto"., las mismas que se encuentra en EJECUCION.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente

**ADJUNTO:**  
VALORIZACIONES N°02  
01 ORIGINAL – 03 COPIAS + CD  
Cc./Archiv

CONSORCIO UCAYALI

José Antonio Padilla Kón  
Representante Legal Comunal

PROVEIDO N° 33444  
A: SE SEC  
PARA: Informe

Teléfonos: 961603114

Email: [jpadillakoo@yahoo.com](mailto:jpadillakoo@yahoo.com)

Of. Princ: Jr. Yurimaguas N° 250-Int. 1-Calleria – Coronel Portillo – Ucayali.

**VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 02**

\*CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE ACCESO: EN EL (A) CALLE CIRCUNVALACION, CALLE JUAN PABLO II, CALLE LUIS RENGINO ALVARADO Y CALLE ROLDAN TUESTA RUIZ DEL BARRIO SHIRINGAL - L=1,307.57 ML. - 1.31 KM.- DISTRITO DE CONTAMANA - PROVINCIA DE

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
 CONSORCIO UCAYALI

Jose Fernando Cayturto Sandoval  
 ING° DIANA PAOLA CASTRO LITANO

Distribto de Contamana, Provincia de Ucayali, Departamento de Loreto.  
 OCTUBRE DEL 2020

PLAZO DE EJECUCION:  
 PRESUPUESTO CONTRATADO:  
 FACTOR DE RELACION

60 DIAS CALENDARIOS  
 S/.354,557.54 SIN IGV  
 1

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			ANTERIOR		ACTUAL		AVANCE		ACUMULADO		SALDO		
		Und.	Metrado	P. Unit.	Presup.	Metrado	Valorizado S/.	Metrado	Valorizado S/.	Metrado	Valorizado S/.	Metrado	Valorizado S/.	%	%
01	CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO: EN EL (A) CALLE CIRCUNVALACION, CALLE JUAN PABLO II, CALLE LUIS RENGINO ALVARADO, BELLA VISTA, CALLE MARACAN Y CALLE BELÉN DEL AA.HH. PADRE ZAPICO RAMOS - CONTAMANA L=1,821.40 ML. - 1.89 KM.														
01.01	OBRAS PROVISIONALES														
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 5.40M X 3.60M INCL. MARCO DE 2"x2", BASTIDORES, GIGANTOGRAFIA Y COLOCACION	und	1.00	923.65	923.65	1.00	923.65	0.00	0.00	1.00	923.65	100.00%	0.00	0.00%	
01.01.02	ALMACEN Y CASETA DE GUARDIA	mes	1.00	500.00	500.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	100.00%	0.00	0.00%	
01.01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS - HERRAMIENTAS PARA LA OBRA	Und	1.00	3,000.00	3,000.00	0.50	1,500.00	0.00	0.00	0.50	1,500.00	50.00%	0.50	50.00%	
01.02	OBRAS PRELIMINARES														
01.02.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	8,002.08	2.88	23,045.93	8002.08	23,045.93	0.00	0.00	8,002.08	23,045.93	100.00%	0.00	0.00%	
01.02.02	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA	m2	6,668.39	3.29	21,939.00	6668.39	21,939.00	0.00	0.00	6,668.39	21,939.00	100.00%	0.00	0.00%	
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS														
01.03.01	LIMPIEZA DE TERRENO CON MAQUINARIA	km	1.33	2,842.69	2,842.69	1.33	2,842.69	0.00	0.00	1.33	2,842.69	100.00%	0.00	0.00%	
01.03.02	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE	m2	9,335.74	4.30	40,143.68	9335.74	40,143.68	0.00	0.00	9,335.74	40,143.68	100.00%	0.00	0.00%	
01.03.03	CONFORMACION DE CUNETAS LATERALES	m	2,667.35	6.15	16,404.20	2667.35	16,404.20	0.00	0.00	2,667.35	16,404.20	100.00%	0.00	0.00%	
01.03.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPOS	m3	1,213.65	12.70	15,413.36	1213.65	15,413.36	0.00	0.00	1,213.65	15,413.36	100.00%	0.00	0.00%	
01.04	AFIRMADO														
01.04.01	AFIRMADO DE PLATAFORMA DE RODADURA E=10 CM (80% H. + 20% T.R.)	m2	6,888.39	25.40	169,377.11	0.00	0.00	1,633.68	41,495.47	6,888.39	169,377.11	24.50%	5,034.71	75.50%	
01.05	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA														
01.05.01	EQUIPAMIENTO DE PROTECCION INDIVIDUAL	Und	1.00	510.00	510.00	1.00	510.00	0.00	0.00	1.00	510.00	100.00%	0.00	0.00%	
01.05.02	EQUIPAMIENTO DE PROTECCION COLECTIVA	Und	1.00	725.00	725.00	1.00	725.00	0.00	0.00	1.00	725.00	100.00%	0.00	0.00%	
01.05.03	EQUIPO TEMPORAL DE SEGURIDAD	Und	1.00	640.00	640.00	1.00	640.00	0.00	0.00	1.00	640.00	100.00%	0.00	0.00%	
	COSTO DIRECTO (CD)				285,464.62		124,587.51		41,495.47		166,882.08			126,381.63	
	GASTOS GENERALES (10% de CD)				28,546.46		12,458.75		4,149.55		16,608.30			12,938.16	
	UTILIDAD (10% de CD)				28,546.46		12,458.75		4,149.55		16,608.30			12,938.16	
	sub total				354,557.54		149,505.01		49,794.57		198,298.58			143,267.95	
	factor de relacion		1.000000		354,557.54		149,505.01		49,794.57		198,298.58			0.00	
	TOTAL DEL PRESUPUESTO				354,557.54		149,505.01		49,794.57		198,298.58			155,257.86	
	PROCENTAJE DE AVANCE DE OBRA				100.00%		42.17%		14.04%		56.21%			43.79%	

*[Handwritten Signature]*  
 Cayuro Sandoval Jose Fernando  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP 055830

*[Handwritten Signature]*

**CONSORCIO UCAYALI**  
 José Apolónio Padilla Koo  
 Representante Legal Común
