



VALORIZACION

N.º 1



30 OCT 2019

Fecha: _____ Hora: _____

INFORME N° 003-2019 G.R.L.- G.R.I./SGS

N° REG: _____

Belén, octubre 2019

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Sub Gerencia de Supervisión y Control

28 OCT 2019

Fecha: _____ Hora: _____

N° Reg: _____

A : ING. RAUL FLORES AQUEPUCHO
SUB GERENTE DE SUPERVISION Y CONTROL

De : ING. ALLAN GUILIANO RAMIREZ SANGAMA
INSPECTOR DE OBRA

Asunto : APROBACION DEL CALENDARIO ACTUALIZADO DE AVANCE DE OBRA DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO; EN EL (LA) VIAS DE ACCESO DEL AA.HH. PILAR NORES DE GARCIA EN LA LOCALIDAD DE PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO"

REFERENCIA : INFORME N° 001-2019/SGO-MCCHS

Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarlo muy cordialmente e informar, en relación al documento de la referencia, el resultado de la evaluación efectuada al Calendario Valorizado de Avance de Obra remitida por el RESIDENTE DE OBRA

Que habiendo sido revisado el Calendario Valorizado de Avance de Obra Actualizada, por el Suscrito en calidad de Inspector observa que el calendario esta de acorde, por lo cual se aprueba el Calendario de Avance de Obra Actualizado de la Obra "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO; EN EL (LA) VIAS DE ACCESO DEL AA.HH. PILAR NORES DE GARCIA EN LA LOCALIDAD DE PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO .

Por lo mismo, se recomienda notificar al Residente de Obra, la aprobación del calendario de avance de obra, para su conocimiento y acciones que corresponda

Es cuanto informo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

Atentamente,

ALLAN GUILIANO
RAMIREZ SANGAMA
INGENIERO CIVIL
DPTO. 201



compromiso con TODOS
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Sub Gerencia de Supervisión y Control

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
SUB GERENCIA DE OBRAS

INFORME N° 001-2019-SGO/PNDG/MCCHS

25 OCT 2019

25 OCT 2019

Fecha: 25 A. Hora: _____

N° Reg: _____

Fecha: 25 Hora: _____

N° REG: _____

: Ing. MARTIN REYNA NOMBERTO
SUB GERENTE DE OBRAS.

DE : Ing. MARLOND CARLOS CHUQUILLANQUI SILVA
RESIDENTE DE OBRA.

ASUNTO : CALENDARIO REPROGRAMADO

REF : IOARR NO PIP: "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO;
EN EL (LA) VIAS DE ACCESO DEL AA.HH. PILAR NORES DE GARCÍA
EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA
MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO"

FECHA : IQUITOS 25 DE OCTUBRE DE 2019

Mediante la presente me dirijo a Ud. para alcanzar el CALENDARIO REPROGRAMADO perteneciente al IOARR NO PIP: "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO; EN EL (LA) VIAS DE ACCESO DEL AA.HH. PILAR NORES DE GARCÍA EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO"

Sin otro particular, quedo de usted.


Atentamente.

Residente de Obra

CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE MENSUAL

IOARR NO PIP: REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL IOARR: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO; EN EL(LA) VÍAS DE ACCESO DEL ASENTAMIENTO HUMANO PILAR NORES DE GARCÍA EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO" PARA EL SALDO DE OBRA.
 Proyect: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 Fecha: Loreto, 2019

Item	Descripción	TOTAL		TIEMPO DE EJECUCION												total				
		Unidad	Cantidad	Precio \$I	Total \$I	MESES														
						21/10/2019 al 31/10/2019	01/11/2019 al 30/11/2019	01/12/2019 al 31/12/2019	01/01/2020 al 31/01/2020	01/02/2020 al 28/02/2020	01/03/2020 al 31/03/2020	01/04/2020 al 30/04/2020	01/05/2020 al 31/05/2020	01/06/2020 al 17/06/2020						
01	MEJORAMIENTO DE LAS CA. Y P.SJ. DEL AA-III PILAR NORES DE GARCIA			5,500,994.37																
01.01.01	OBRAS PROVISIONALES			4,844.14																
01.01.02	CARTEL DE OBRA DE 3.60m x 5.80m, TIPO GIGANTOGRAFIA Inc. COLOCACION	und	1.00	844.14																
01.02	ALQUILER DE ALMACEN	mes	8.00	500.00																
01.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES			6,732.77																
01.02.01	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO (con teodolito y nivea) Inicio y Final	m2	17,717.82	0.38																
01.03	SEGURIDAD Y SALUD			6,726.00																
01.03.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	und	1.00	2,500.00																
01.03.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)	und	1.00	3,985.00																
01.03.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA (EPC)	und	1.00	240.00																
01.04	CORTE DE TERRENO			31,109.04																
01.04.01	CORTE DE TERRENO CON RETROEXCAVADORA	m3	10,869.66	3.00																
01.05	RELLENOS			1,126,448.11																
01.05.01	RELLENO CON MATERIAL A-3	m3	25,686.57	38.73																
01.05.02	RELLENO CON MATERIAL A-2-4	m3	3,396.07	38.73																
01.06	TALUD P/PROTECCION DE RELLENO			4,260,417.11																
01.06.01	BOLSACRETO C/A 1:10	m3	337.81	161.43																
01.06.02	BIG BAG MEZCLA 1:10	m3	22,317.12	188.46																
01.07	ALCANTARILLA DE CRUCE			47,792.84																
01.07.01	ALCANTARILLA TMC D=60"	m	132.00	288.48																
01.07.02	ALCANTARILLA TMC D=24"	m	108.00	89.92																
01.08	VIARIOS			16,926.16																
01.08.01	TUBO DE PVC 4" PARA DESAGUE	m	265.00	17.10																
01.08.02	TUBERIA PVC SAP Ø 1/2"	m	678.00	12.07																
01.08.03	CODO PVC-SAP 1/2" x 90"	und	160.00	13.01																
01.08.04	TEE PVC-SAP 1/2"	und	160.00	13.31																
COSTO DIRECTO				5,600,994.37																
GASTOS GENERALES				353,700.02																
43848.2837																				
SUB TOTAL				5,954,694.39																
ICV 18.00%				0.00																
PRESUPUESTO TOTAL				5,954,694.39																
%AVANCE MENSUAL				0.96%	3.86%	13.30%	13.66%	14.25%	14.85%	14.85%	14.09%	14.09%	13.98%	11.09%	100.00%					
%AVANCE ACUMULADO				0.96%	4.86%	18.25%	31.91%	46.16%	60.44%	74.93%	88.91%	88.91%	88.91%	88.91%	100.00%					


 Ing. Wilfredo Carlos Chucullanqui Silva
 Ing. Residente

Ing. Allan Guillermo Ramirez Sangama
 Inspector de IOARR



IOAAR NO PIP: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE LEVANTAMIENTO EN EL (LA) VÍAS DE ACCESO DEL A.A.H.H. PILAR NORES DE GARCÍA EN LA LOCALIDAD DE PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO".

PANEL FOTOGRÁFICO

MES OCTUBRE



Imagen N°01: Se inicia las actividades con la recepción de materiales y herramientas a ser utilizados durante la construcción. Además se procede con las actividades de orden y limpieza dentro de almacén.



Imagen N°02: Se recepciona equipos de protección personal: cascos de seguridad chaleco de reflectivo, guantes de seguridad, otros.


MARLON CARLOS CHUCUY
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 225414



IOAAR NO PIP: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE LEVANTAMIENTO EN EL (LA) VÍAS DE ACCESO DEL A.A.H.H. PILAR NORES DE GARCÍA EN LA LOCALIDAD DE PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO".

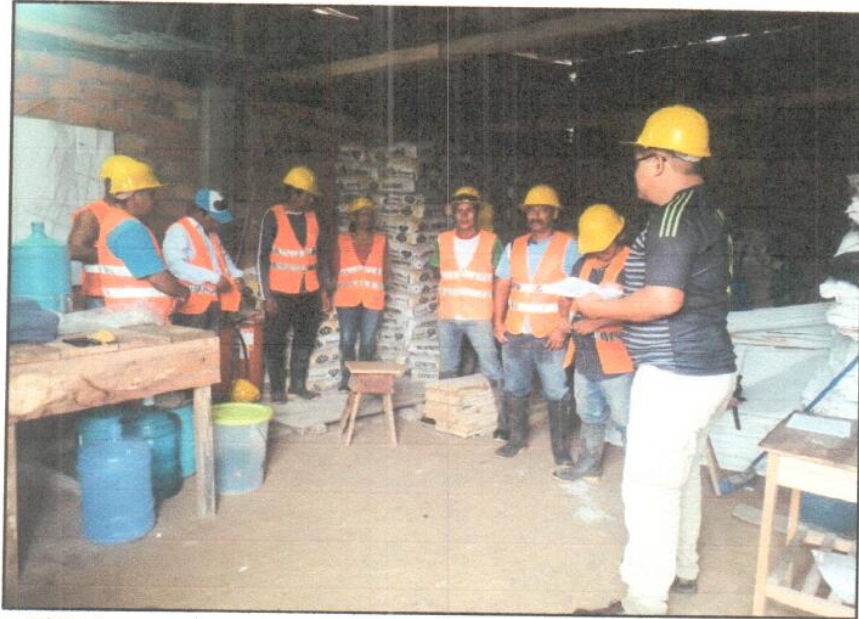


Imagen N°03: Se procede con la entrega de equipos de protección personal otorgados a los trabajadores: cascos de seguridad, chalecos reflectantes, zapatos de seguridad, otros. Asimismo se brinda las charlas de seguridad sobre medidas de seguridad en obra.



Imagen N°04: Implementación del botiquín para primeros auxilios según normativa "G-050": Agua oxigenada, tijera, gasas, guantes quirúrgicos, corilio, agua destilada, baja lenguas, esparadrapo, entre otros.


MARLON CARLOS CHIRIQUI SILVA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 225414



IOAAR NO PIP: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE LEVANTAMIENTO EN EL (LA) VÍAS DE ACCESO DEL A.A.H.H. PILAR NORES DE GARCÍA EN LA LOCALIDAD DE PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO".



Imagen N°05: Implementación con materiales para incendios "Extintor", para respuesta rápida ante emergencias.

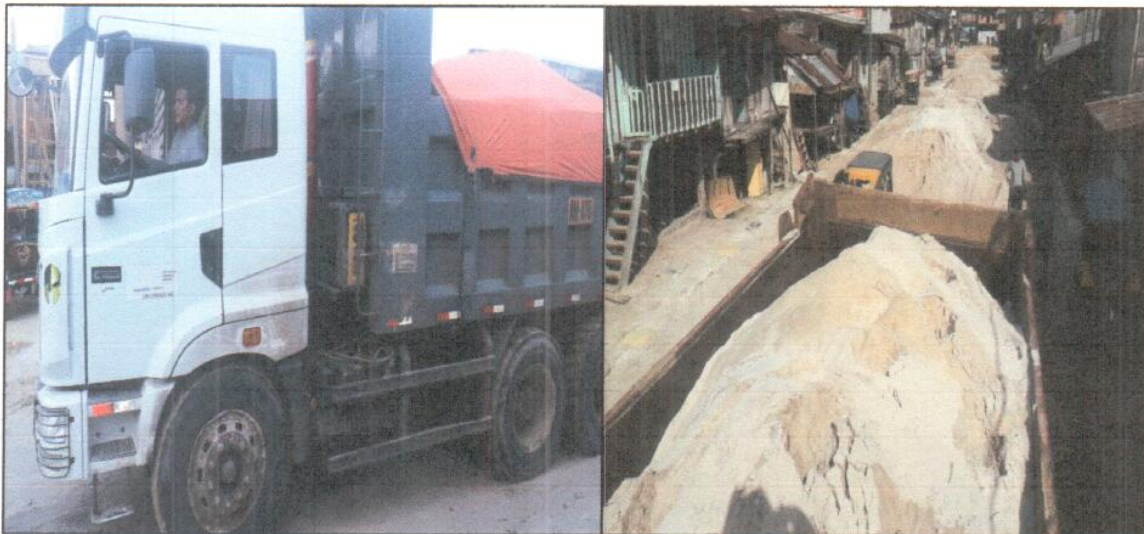


Imagen N°06: Recepción de material de relleno tipo A-3. En la imagen se aprecia que el material particulado se traslada con el recubrimiento respectivo a fin de evitar la liberación de éste en la atmosfera.


MARLON CARLOS CHUCHO LANGUI SOLÍS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 225414



IOAAR NO PIP: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE LEVANTAMIENTO EN EL (LA) VÍAS DE ACCESO DEL A.A.H.H. PILAR NORES DE GARCÍA EN LA LOCALIDAD DE PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO".



Imagen N°07: recepción y entrega de guantes de seguridad otorgada a los trabajadores de obra.

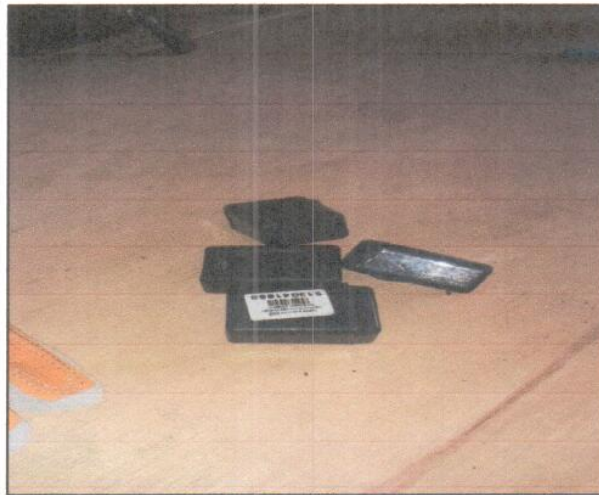


Imagen N°08: recepción y entrega de tapones auditivos otorgados a los trabajadores.


MARLON CARLOS CHOCULLANQUI SILVA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 225414





VALORIZACION


N.º 2



"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

Belén, 05 de diciembre 2020

INFORME N° 012-2019 G.R.L.- G.R.I./SGSvC



A : **ING. RAUL FLORES AQUEPUCHO**
SUB GERENTE DE SUPERVISION Y CONTROL

De : **ING. ALLAN GUILIANO RAMIREZ SANGAMA**
INSPECTOR DE OBRA



Asunto : **REMITO VALORIZACION N° 02 MES DE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO; EN EL (LA) VIAS DE ACCESO DEL AA.HH. PILAR NORES DE GARCÍA EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO"**

REFERENCIA : CARTA N° 003-2019/SGO-MCCHS

01. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

OBRA : "REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL IOARR NO PIP: CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO; EN EL (LA) VIAS DE ACCESO DEL AA.HH. PILAR NORES DE GARCÍA EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO"

UBICACIÓN : "DEL AA.HH. PILAR NORES DE GARCÍA EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO"

EJECUTA : GOBIERNO REGIONALDE LORETO

VALOR REFERENCIAL CON IGV : S/ 6,908,539.38

MONTO REFERENCIAL CON GA-IGV : S/ 3, 517,230.25

FECHA DEL PRESUPUESTO : agosto 2019

PLAZO DE EJECUCION : 240 días calendarios

ENTREGA DE TERRENO : 12 DE OCTUBRE DEL 2019

INICIO DE OBRA : 21 octubre 2019

FECHA DE TERMINO DE PLAZO DE EJEC. : 16 de junio 2020

AVANCE DE OBRA DEL MES : programado : 4.17%
Real : 4.95%

AVANCE FISICO ACUM. EJECUTADO : 4.17 % (30/11/2019)

AVANCE PROGRAMADIO ACUM. : 4.95% (30/11/2019)



"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

INSPECTOR DE OBRA : Ing. Allan Guilianno Ramírez Sangama
RESIDENTE DE OBRA : Ing. Marlond Carlos Chuquillanqui Silva

I. ANTECEDENTES

Mediante resolución gerencial regional n° 088-2019-GRL-GRI, con fecha 13 de agosto del 2019 es aprobado el saldo del Expediente Técnico del IOARR NO PIP de la obra antes mencionada con un presupuesto ascendente a s/ 6, 908,539.38, con precios vigentes al mes de agosto del 2019, con un plazo de ejecución de 150 días calendarios, obra que se ejecuta mediante ejecución presupuestaria directa –Administración directa obra encargada por la sub gerencia de obra.

Con orden de servicio n° 0002888 del 10 de octubre del 2019 es contratado los servicios del ing. Marlond Carlos Chuquillanqui Silva, como responsable de la obra

con carta N° 003-2019-SGO/mcchs el residente de obra presenta la valorización N° 02 correspondiente al mes de NOVIEMBRE -2019, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un monto bruto de S/. 244,391.85 soles, de manera que se presenta para el control correspondiente, con la siguiente documentación como anexo

CONTENIDO

INFORME DEL RESIDENTE
COPIA DE AUTORIZACIÓN DE INTERVENCIÓN DE VÍAS
VALORIZACIÓN DEL MES
RESUMEN DE LA VALORIZACIÓN
HOJA DE LIQUIDACIÓN
PLANILLA DE METRADOS JUSTIFICADOS
CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA
CUADRO COMPARATIVA D LO PROGRAMADO VS LO EJECUTADO
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
ACTA DE ENTREGA DEL TERRENO
ORDEN DE SERVICIO DEL RESIDENTE
ORDENES DE SERVICIO PERSONAL ADMINISTRATIVO
CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL ADMINISTRATIVO
CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL OBRERO
CONTROL DE ALMACÉN
PANEL FOTOGRÁFICO
CUADERNO DE OBRA

II. EVALUACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA

visto las copias del cuaderno de obra, el ingeniero residente conjuntamente con el inspector de obra, en la que se consigna, cuantifica y aprueba los trabajos ejecutados para la valorización de obra



"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

n° 02 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2019, las cuales son aprobadas por el inspector de obra y plasmadas en la documentación tramitada indicando a su vez que luego de efectuada la revisión al procedimiento de cálculo de los montos consignados en la valorización n° 02 de la referida obra, se ha podido determinar que se ajustan a los procedimientos que rigen el cálculo de las valorizaciones de obras públicas, en concordancia con la documentación sustentadora presentada.

La presente valorización tiene como fuente de financiamiento: por fideicomiso, administración presupuestaria directa, en concordancia con la documentación y cálculos adjuntos se ha encontrado procedente efectuar la recepción de la documentación

III. CONCLUSIONES

La valorización de obra N° 02 del mes de NOVIEMBRE -2019, cuenta con la documentación correspondiente para la cual se realizó los metrados aprobados por el suscrito, con la valorización de obra presentada efectuada hasta la fecha, las cuales se reflejan en los siguientes cuadros anexados

El suscrito en calidad de inspector verifico que la documentación presentado se encuentra conforme debido a que se verifico que los metrados descritos en el cuaderno de obra son compatible con la valorización de obra n° 02 del mes de NOVIEMBRE 2019

Se verifico que la obra al mes de NOVIEMBRE del 2019, cuenta con un avance real acumulado ejecutado de 4.17 % y un programado de 4.95%, encontrándose la obra atrasada.


El suscrito realizo la revisión de la documentación presentada en la valorización, correspondiente, por lo cual el suscrito otorga la conformidad a la valorización mencionada

IV RECOMENDACIÓN

Se recomienda, disponer las actividades en todos los frentes disponibles a fin de incrementar los avances correspondientes a los siguientes meses, se tiene una valorización por un monto de s/. 244,391.85 soles por la ejecución de la obra; por, lo que el suscrito encuentra conforme la documentación presentada en la presente valorización

Es cuanto informo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

Atentamente,


ALLAN GIULIANO
RAMIREZ SANGAMA
INGENIERO CIVIL
N° 10350



AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
SUB GERENCIA DE OBRAS

Iquitos 30 noviembre del 2019

30 NOV 2019

Fecha: *ely* Hora:

N° REG.:

CARTA N°003-2019-SGO-MCCHS

SEÑOR : Ing. MARTIN REYNA NOMBERTO
Sub Gerente de Obras – GRI

REFERENCIA: IOARR NO PIP: "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO; EN EL (LA) VIAS DE ACCESO DEL AA.HH. PILAR NORES DE GARCIA EN LA LOCALIDAD DE PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO".

ASUNTO : VALORIZACION N° 02 – MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo y a la vez remitir a su despacho la **VALORIZACIÓN N°02**, correspondiente al mes de **NOVIEMBRE 2020** del Proyecto: IOARR NO PIP: "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO; EN EL (LA) VIAS DE ACCESO DEL AA.HH. PILAR NORES DE GARCIA EN LA LOCALIDAD DE PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO", elaborado por el suscrito.

Es cuanto cumplo en remitir a su despacho para conocimiento y fines que se sirva determinar.

Atentamente,


MARLON CARLOS CHIRIQUI
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 225414

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 02

OBRA: OIARR NO PIP CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO,
 ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 RESIDENTE: MARLON CARLOS CHUQUILLANQUI SILVA
 INSPECTOR: ALLAN GUILLANNO RAMÍREZ SANGAMA
 UBICACIÓN: PUNCHANA - MAYNAS - LORETO
 FECHA: NOVIEMBRE DEL 2019

PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS CALENDARIOS
 PRESUPUESTO CONTRATADO: 5,854,694.39 SIN IGV
 PRESUPUESTO REAL CONTRATADO: 5,854,694.39

PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS CALENDARIOS
 PRESUPUESTO CONTRATADO: 5,854,694.39 SIN IGV
 PRESUPUESTO REAL CONTRATADO: 5,854,694.39

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				ANTERIOR				AVANCE				SALDO			
		Und.	Metrado	P. Unit.	Presup.	Metrado	Valorizado S/.	Metrado	Valorizado S/.	Metrado	Valorizado S/.	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%
01	MEJORAMIENTO DE LAS CA. Y P.S. DEL AA-HH PILAR NORES DE GARCIA																
01.01	OBRA PROVISIONALES																
01.01.01	CARTEL DE OBRA DE 3.60m x 5.80m, TIPO GIGANTOGRAFIA inc.	und	1.00	844.14	844.14	1.00	844.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	844.14	100.00%	0.00	0.00	0.00%
01.01.02	ALQUILER DE ALMACEN	mes	8.00	500.00	4,000.00	1.00	500.00	1.00	500.00	1.00	500.00	2.00	1,000.00	25.00%	6.00	3,000.00	75.00%
01.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES	m2	17,717.82	0.38	6,732.77	6,569.04	2,496.24	6,800.00	2,584.00	13,369.04	75.46%	4,348.78	1,652.54	24.54%			
01.03	SEGURIDAD Y SALUD																
01.03.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	und	1.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%
01.03.02	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)	und	1.00	3,985.00	3,985.00	0.30	1,195.50	0.06	239.10	0.36	1,434.60	0.36	1,434.60	36.00%	0.64	2,550.40	64.00%
01.04	CORTE DE TERRENO	und	1.00	240.00	240.00	0.50	120.00	0.09	21.60	0.59	141.60	0.41	98.40	41.00%			
01.04.01	CORTE DE TERRENO CON RETROEXCAVADORA	m3	10,369.88	3.00	31,109.04	0.00	0.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	3,000.00	9.64%	9,369.88	28,109.04	90.36%
01.05.01	RELLENO CON MATERIAL A-3	m3	25,688.57	38.73	994,918.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,688.57	994,918.32	100.00%
01.05.02	RELLENO CON MATERIAL A-2-4	m3	3,396.07	38.73	131,529.79	1,020.35	39,518.16	1,500.00	58,095.00	2,520.35	97,613.16	74.21%	875.72	33,916.64	25.79%		
01.06.01	BOLSACRETO C.A. 1:10	m3	337.81	161.43	54,532.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	337.81	54,532.67	100.00%
01.06.02	BIG BAG MEZCLA 1:10	m3	22,317.12	188.46	4,205,884.44	0.00	0.00	626.20	118,013.65	626.20	118,013.65	2.81%	21,690.92	4,087,870.78	97.19%		
01.07	ALCANTARILLA DE CRUCE	m	132.00	288.49	38,080.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	132.00	38,080.68	100.00%
01.07.01	ALCANTARILLA TMC D=60"	m	108.00	89.92	9,711.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	108.00	9,711.36	100.00%
01.08	VARIOS																
01.08.01	TUBO DE PVC 4" PARA DESAGUE	m	265.00	17.10	4,531.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	265.00	4,531.50	100.00%
01.08.02	TUBERIA PVC SAP Ø 12"	m	678.00	12.07	8,183.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	678.00	8,183.46	100.00%
01.08.03	CODO PVC-SAP 1/2" x 90°	und	160.00	13.01	2,081.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	160.00	2,081.60	100.00%
01.08.04	TEE PVC-SAP 1/2"	und	160.00	13.31	2,129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	160.00	2,129.60	100.00%
	COSTO DIRECTO (CD)				5,500,994.37		44,674.04		184,953.35		229,627.38		5,271,966.99				
	GASTOS ADMINISTRATIVOS				353,700.02		2,872.43		11,892.03		14,764.46		338,935.56				
	SUB TOTAL				5,854,694.39		47,546.47		196,845.38		244,391.84		5,610,902.55				
	TOTAL DEL PRESUPUESTO				5,854,694.39		47,546.47		196,845.38		244,391.84		5,610,902.55				
	PORCENTAJE				100.00%		0.81%		3.36%		4.17%		95.83%				

MARLON CARLOS CHUQUILLANQUI SILVA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 225414



IOAAR NO PIP: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE LEVANTAMIENTO EN EL (LA) VÍAS DE ACCESO DEL A.A.H.H. PILAR NORES DE GARCÍA EN LA LOCALIDAD DE PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO".

MES NOVIEMBRE

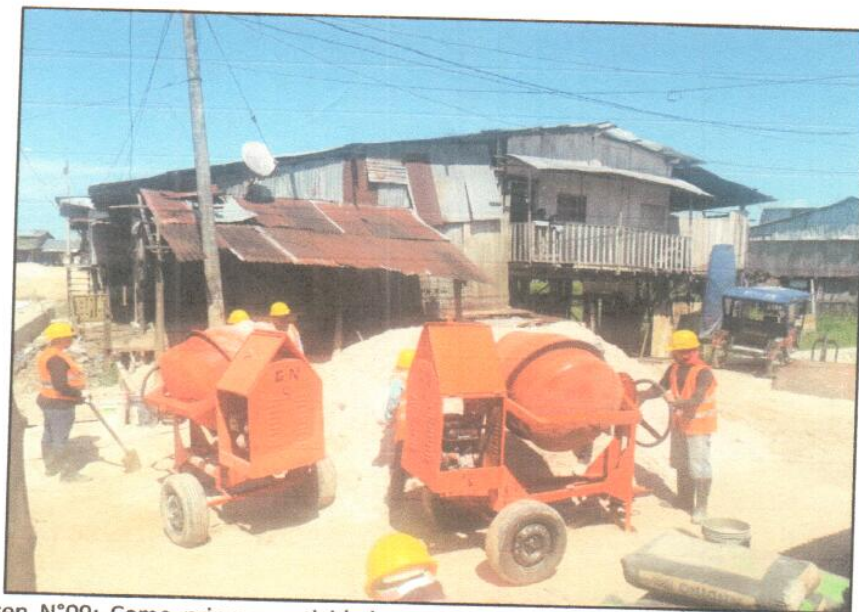


Imagen N°09: Como primera actividad correspondiente a la obra es la recepción de equipos para mezcla de concreto. Además, se puede observar a los trabajadores utilizando equipos de protección personal respectiva.

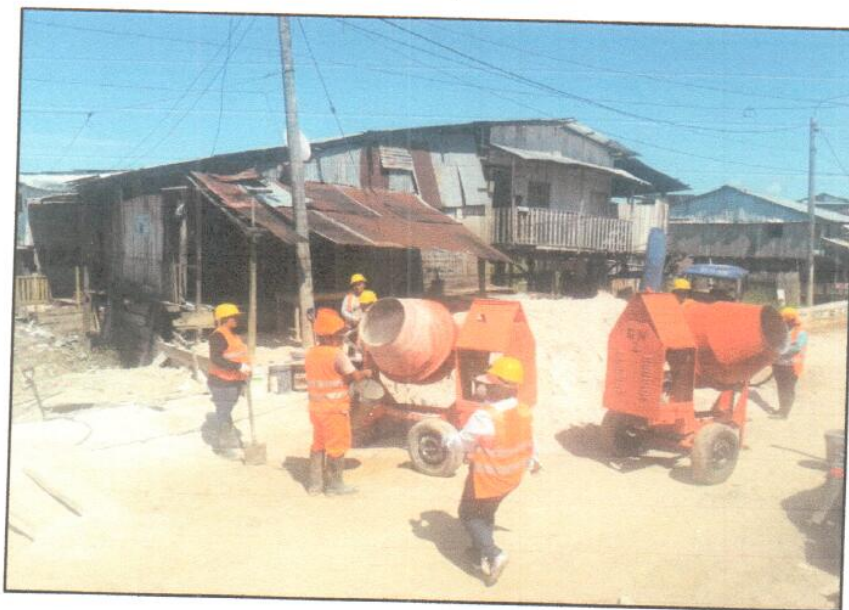


Imagen N°10: Prueba técnica de los equipos para mezcla de concreto recepcionados. El personal obrero cuenta con los equipos de protección personal

MARLOND CARLOS CHUQUIN...
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 225414



IOAAR NO PIP: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE LEVANTAMIENTO EN EL (LA) VÍAS DE ACCESO DEL A.A.H.H. PILAR NORES DE GARCÍA EN LA LOCALIDAD DE PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO".



Imagen N°11: Recepción de bolsas de cemento, se observa una plataforma de madera el cual sirve como soporte y brinda estabilidad a las pilas de cemento almacenado.



Imagen N°12: Traslado de material de relleno tipo A-3, los vehículos transitan por las vías con el respectivo recubrimiento del material trasladado a fin de evitar que las partículas de material se disperse en las calles de la ciudad.





IOAAR NO PIP: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE LEVANTAMIENTO EN EL (LA) VÍAS DE ACCESO DEL A.A.H.H. PILAR NORES DE GARCÍA EN LA LOCALIDAD DE PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO".

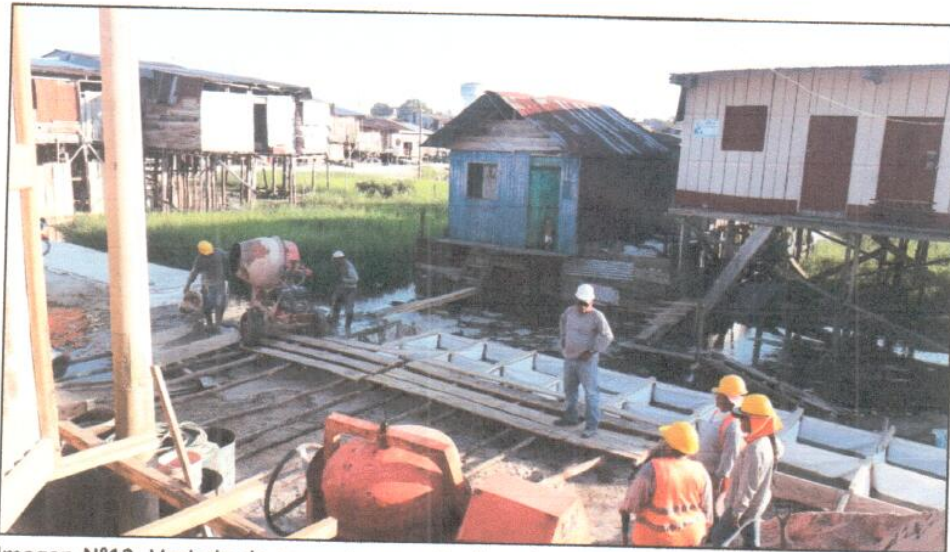


Imagen N°13: Vaciado de concreto en psje. "Los ángeles", en donde se hace uso de las mezcladoras de concreto recepcionados. Ademes, los trabajadores realizan sus actividades con el uso correcto de los equipos de protección personal otorgados.



Imagen N°14: Instalación de big bag en calle alianza, con dimensiones de 1m. x 1m.x 1m.



IOAAR NO PIP: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE LEVANTAMIENTO EN EL (LA) VÍAS DE ACCESO DEL A.A.H.H. PILAR NORES DE GARCÍA EN LA LOCALIDAD DE PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO".

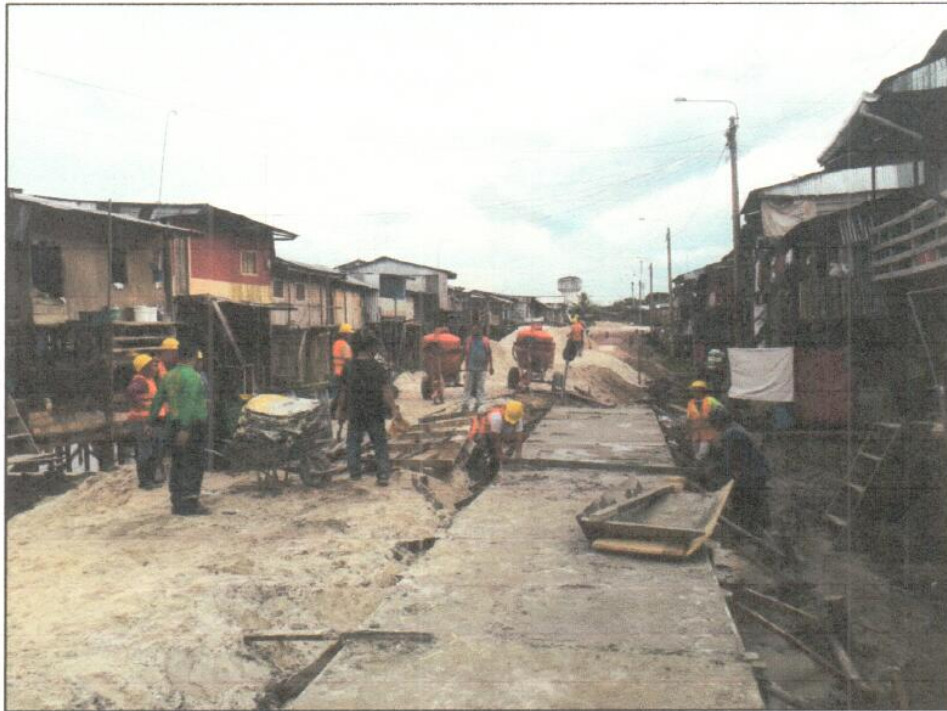


Imagen N°15: Vaciado de concreto en big bag (producto final), 1m³ por cada big bag, ubicado en calle alianza.



Imagen N°16: Trabajo de maquinaria pesada tipo "Mini-Cargador, se observa que los trabajadores cuentan con los equipos de protección personal correspondiente.


MARLON CARLOS CHUQUILLA ANQUI SILVA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 225414





IOAAR NO PIP: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE LEVANTAMIENTO EN EL (LA) VÍAS DE ACCESO DEL A.A.H.H. PILAR NORES DE GARCÍA EN LA LOCALIDAD DE PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO".



Imagen N°17: Recepción de maquinaria pesada denominada "Retroexcavadora"



Imagen N°18: Charlas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, en donde se explicó sobre medidas de seguridad en la actividad de "Movimiento de material de relleno con maquinaria pesada"



VALORIZACION

N.º 3



14 ENE 2020

Fecha: *[Signature]* Hora:

"Año de la universalización de la salud"

N° REG:

INFORME N° 03-2020-GRL/GRI/SGO/SGSyC-/RFA



Al : Luis Alberto Ramírez Panduro
Sub gerente de obras

Del : ING. Ingeniero Raúl Flores Aquepucho
Sub gerente de supervisión y control

Asunto : Conformidad a la Valorización N° 03

Obra : "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO; EN EL (LA) VIAS DE ACCESO DEL AA.HH. PILAR NORES DE GARCÍA EN LA LOCALIDAD PUNCHANA

Ref. : a. CARTA N° 003-2019/SGO-MCCHS

FECHA : 10 de enero DEL 2020

Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo y a la vez hacerle llegar el informe de conformidad de la valorización N° 03 de la IOARRS NO PIP CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO; EN EL (LA) VIAS DE ACCESO DEL AA.HH. PILAR NORES DE GARCÍA EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, correspondiente al mes de Diciembre del 2019, presentado por el ingeniero, Arthur Harold Paiva Armas, mediante la referencia (a), el mismo que ha sido verificado en obra, cumpliéndose con los lineamientos y requerimientos establecidos para el trámite.

1. GENERALIDADES

OBRA : "REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL IOARR NO PIP: CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO; EN EL (LA) VIAS DE ACCESO DEL AA.HH. PILAR NORES DE GARCÍA EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO"

UBICACIÓN : "DEL AA.HH. PILAR NORES DE GARCÍA EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO"

EJECUTA : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

VALOR REFERENCIAL CON IGV : S/ 6,908,539.38

MONTO REFERENCIAL CON GA-IGV : S/ 3,517,230.25

FECHA DEL PRESUPUESTO : agosto 2019

PLAZO DE EJECUCION : 240 días calendarios


ENTREGA DE TERRENO : 12 DE OCTUBRE DEL 2019

INICIO DE OBRA : 21 DE OCTUBRE 2019

FECHA DE TERMINO DE PLAZO DE EJEC. : 16 de junio 2020

AVANCE DE OBRA DEL MES : programado : 18.25 %
Real : 16.18 %

AVANCE FISICO ACUM. EJECUTADO : 16.18 % (31/12/2019)



“Año de la universalización de la salud ”

AVANCE PROGRAMADIO ACUM. : 18.25% (31/12/2019)
Residente : ING. Arthur Harold Paiva Armas
Inspector : ING. Raúl Flores Aquepucho

2. CONTENIDO DE LA DOCUMENTACION

CONTENIDO
INFORME DEL RESIDENTE
COPIA DE AUTORIZACIÓN DE INTERVENCIÓN DE VÍAS
VALORIZACIÓN DEL MES
RESUMEN DE LA VALORIZACIÓN
HOJA DE LIQUIDACIÓN
PLANILLA DE METRADOS JUSTIFICADOS
CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA
CUADRO COMPARATIVA D LO PROGRAMADO VS LO EJECUTADO
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
ACTA DE ENTREGA DEL TERRENO
ORDEN DE SERVICIO DEL RESIDENTE
ORDENES DE SERVICIO PERSONAL ADMINISTRATIVO
CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL ADMINISTRATIVO
CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL OBRERO
CONTROL DE ALMACÉN
PANEL FOTOGRÁFICO
CUADERNO DE OBRA

3. ANTECEDENTES

Mediante resolución gerencial regional n° 088-2019-GRL-GRI, con fecha 13 de agosto del 2019 es aprobado el saldo del Expediente Técnico del IOARR NO PIP de la obra antes mencionada con un presupuesto ascendente a s/ 6,908,539.38, con precios vigentes al mes de agosto del 2019, con un plazo de ejecución de 240 días calendarios, obra que se ejecuta mediante ejecución presupuestaria directa –Administración directa obra encargada por la sub gerencia de obra.

Mediante memorando N° 052- 2019-GRL-GRI-FGSYC, de fecha, 02 de noviembre del 2019 se designa como inspector al Ingeniero Allan Guilianno Ramírez Sangama, como Inspector.

Con orden de servicio n° 0002888del 10 de octubre del 2019 es contratado los servicios del ing. Marlond Carlos Chuquillanqui Silva, como responsable de la obra

Mediante carta 001-2020- GRI/AGRS de fecha 03 de enero 2020, el ingeniero Allan Guilianno Ramírez Sangama, presenta su renuncia como Inspector.

con carta N° 003-2019-SGO/MCCHS el residente de obra presenta la valorización N° 03 correspondiente al mes de diciembre -2019, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un monto bruto de S/. 947,081.09 soles, de manera que se presenta para el control correspondiente, con la siguiente documentación

“Año de la universalización de la salud ”

4. EVALUACION DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTAD

visto las copias del cuaderno de obra, el ingeniero residente conjuntamente con el inspector de obra, en la que se consigna, cuantifica y aprueba los trabajos ejecutados para la valorización de obra n° 03 correspondiente al mes de diciembre del 2019, las cuales son aprobadas por el inspector de obra y plasmadas en la documentación tramitada indicando a su vez que luego de efectuada la revisión al procedimiento de cálculo de los montos consignados en la valorización n° 03 de la referida obra, se ha podido determinar que se ajustan a los procedimientos que rigen el cálculo de las valorizaciones de obras públicas, en concordancia con la documentación sustentadora presentada.

5. CONCLUSIONES

La valorización de obra N° 03 del mes de DICIEMBRE -2019, cuenta con la documentación correspondiente.

El suscrito en calidad de inspector verifico que la documentación presentada se encuentra conforme debido a que se verifico que los metrados descritos en el cuaderno de obra son compatible con la valorización de obra n° 03 del mes de diciembre 2019

Se verifico que la obra al mes de diciembre del 2019, cuenta con un avance real acumulado ejecutado de 16.18 % y un programado de 18.25%, encontrándose la obra atrasada.

El suscrito realizo la revisión de la documentación presentada en la valorización, correspondiente, por lo cual se da conformidad a la documentación presentada para el trámite correspondiente.

6. RECOMENDACIONES

Se recomienda, disponer las actividades en todos los frentes disponibles a fin de incrementar los avances correspondientes a los siguientes meses y así no se vea afectada la continuidad programada de los trabajos, se tiene una valorización por un monto de s/. 947,081.09 soles por la ejecución de la obra; por, lo que el suscrito encuentra conforme la documentación presentada en la presente valorización

Es cuanto informo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

Atentamente,


GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regional de Infraestructura
Ing. RAUL FLORES AQUEPUCHO
Sub Gerente de Supervision y Control




Iquitos 06 enero del 2020

CARTA N°004-2020-SGO-MCCHS

SEÑOR : Ing. LUIS ALBERTO RAMÍREZ PANDURO
Sub Gerente de Obras – GRI

REFERENCIA: IOARR NO PIP: "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO; EN EL (LA) VIAS DE ACCESO DEL AA.HH. PILAR NORES DE GARCIA EN LA LOCALIDAD DE PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO".

ASUNTO : VALORIZACION N° 03 – MES DE DICIEMBRE DEL 2019



Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo y a la vez remitir a su despacho la **VALORIZACIÓN N°03**, correspondiente al mes de **DICIEMBRE 2019** del Proyecto: IOARR NO PIP: "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO; EN EL (LA) VIAS DE ACCESO DEL AA.HH. PILAR NORES DE GARCIA EN LA LOCALIDAD DE PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO", elaborado por el suscrito.

Es cuanto cumplo en remitir a su despacho para conocimiento y fines que se sirva determinar.

Atentamente,

MARLOND CARLOS RAMÍREZ PANDURO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 225414

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 03

OBRA: IORR NO PIP - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO.
 ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 RESIDENTE: MARLON CARLOS CHUQUILLANGUI SILVA
 INSPECTOR: ALLAN GUILLIANO RAMIREZ SANGAMA
 UBICACIÓN: PUNCHANA - MAYNAS - LORETO
 FECHA: DICIEMBRE DEL 2019

L (LA) VÍAS DE ACCESO DEL AHHH PILAR NORES DE GARCÍA EN LA LOCALIDAD DE PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.
 PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS CALENDARIOS
 PRESUPUESTO CONTRATADO: 5,854,694.39 SIN IGV
 PRESUPUESTO REAL CONTRATADO: 5,854,694.39

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			ANTERIOR		ACTUAL		AVANCE		ACUMULADO		SALDO		
		Und.	Metrado	P. Unit.	Presup.	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado
						%	%	%	%	%					
01	MEJORAMIENTO DE LAS C.A. Y P.SJ. DEL A.A.HH PILAR NORES DE GARCIA														
01.01	OBRAS PROVISIONALES														
01.01.01	CARTEL DE OBRA DE 3.60m x 5.80m, TIPO GIGANTOGRAFIA inc. COLOCACION	und	1.00	844.14	844.14	1.00	844.14	0.00	0.00	1.00	844.14	100.00%	0.00	0.00	0.00%
01.02	ALQUILER DE ALMACEN	mes	8.00	500.00	4,000.00	2.00	1,000.00	1.00	500.00	3.00	1,500.00	37.50%	5.00	2,500.00	62.50%
01.02.01	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO (con teodolito y nivel) inicio y final	m2	17,717.82	0.38	6,732.77	13,369.04	5,080.24	1,100.00	418.00	14,469.04	5,498.24	81.66%	3,246.78	1,234.54	18.34%
01.03	SEGURIDAD Y SALUD														
01.03.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	und	1.00	2,500.00	2,500.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%
01.03.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)	und	1.00	3,985.00	3,985.00	0.36	1,434.60	0.03	119.55	0.39	1,554.15	39.00%	0.61	2,430.85	61.00%
01.04	CORTE DE TERRENO	und	1.00	240.00	240.00	0.59	141.60	0.05	12.00	0.64	153.60	64.00%	0.36	86.40	36.00%
01.04.01	CORTE DE TERRENO CON RETROEXCAVADORA	m3	10,369.66	3.00	31,109.04	1,000.00	3,000.00	2,500.00	7,500.00	3,500.00	10,500.00	33.75%	6,869.66	20,609.04	66.25%
01.05.01	RELLENO CON MATERIAL A-3	m3	25,688.57	38.73	994,918.32	0.00	0.00	2,839.25	109,964.15	2,839.25	109,964.15	11.05%	22,849.32	88,954.16	88.95%
01.05.02	RELLENO CON MATERIAL A-2-4	m3	3,396.07	38.73	131,529.79	2,520.35	97,613.16	250.00	9,682.50	2,770.35	107,295.66	81.58%	625.72	24,234.14	18.42%
01.06.01	BOLSACRETO C.A 1:10	m3	337.81	161.43	54,532.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	337.81	54,532.67	100.00%
01.06.02	BIG BAG MEZCLA 1:10	m3	22,317.12	188.46	4,205,864.44	626.20	118,013.65	2,823.10	532,041.43	3,449.30	650,055.08	15.46%	18,867.82	3,555,829.36	84.54%
01.07.01	ALCANTARILLA DE CRUCE	m	132.00	288.49	38,080.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	132.00	38,080.68	100.00%
01.07.02	ALCANTARILLA TMC D= 60°	m	108.00	89.92	9,711.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	108.00	9,711.36	100.00%
01.08	VARIOS														
01.08.01	TUBO DE PVC 4" PARA DESAGUE	m	265.00	17.10	4,531.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	265.00	4,531.50	100.00%
01.08.02	TUBERIA PVC SAP Ø 1/2"	m	678.00	12.07	8,183.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	678.00	8,183.46	100.00%
01.08.03	CODO PVC-SAP 1/2" x 90°	und	160.00	13.01	2,081.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	160.00	2,081.60	100.00%
01.08.04	TEE PVC-SAP 1/2"	und	160.00	13.31	2,129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	160.00	2,129.60	100.00%
	COSTO DIRECTO (CD)				5,500,994.37		229,627.39		660,237.63		889,865.01			4,811,129.36	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS 6.429747				353,700.02		14,764.46		42,451.61		57,216.07			296,483.95	
	SUB TOTAL				5,854,694.39		244,391.85		702,689.24		947,081.08			4,907,613.31	
	TOTAL DEL PRESUPUESTO				5,854,694.39		244,391.85		702,689.24		947,081.08			4,907,613.31	
	PORCENTAJE				100.00%		4.17%		12.00%		16.16%			83.82%	


MARLON CARLOS CHUQUILLANGUI SILVA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 225414



IOAAR NO PIP: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE LEVANTAMIENTO EN EL (LA) VÍAS DE ACCESO DEL A.A.H.H. PILAR NORES DE GARCÍA EN LA LOCALIDAD DE PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO".

MES DICIEMBRE



Imagen N°19: Orden y limpieza en almacén, se procede con la recepción y ordenamiento de bolsas con cemento.

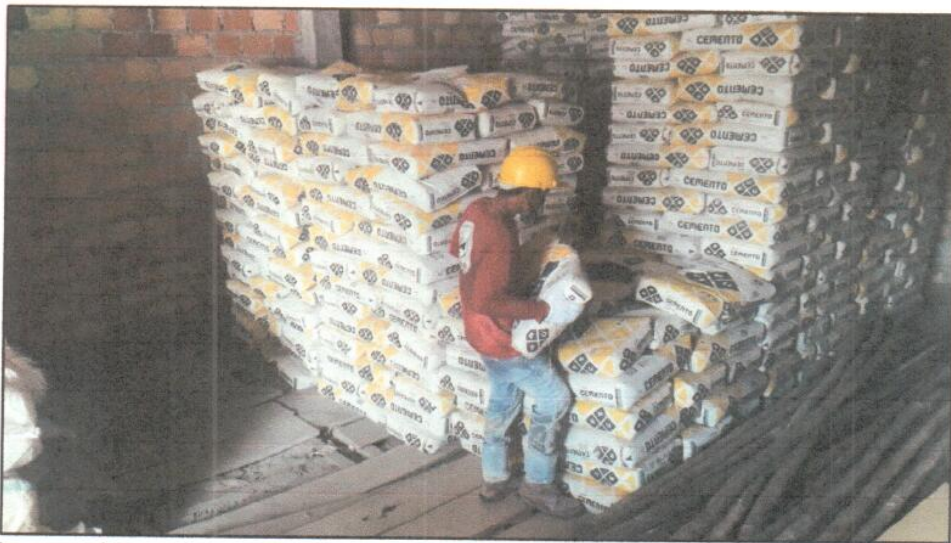


Imagen N°20: Orden y limpieza en almacén, se procede con la recepción y ordenamiento de bolsas con cemento. Personal realiza sus actividades con los respectivos equipos de protección personal.



IOAAR NO PIP: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE LEVANTAMIENTO EN EL (LA) VÍAS DE ACCESO DEL A.A.H.H. PILAR NORES DE GARCÍA EN LA LOCALIDAD DE PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO".



Imagen N°21: Movimiento de material de relleno tipo A-3; en las imágenes se aprecia el recubrimiento del material como medida de seguridad, con la finalidad de evitar esparcimiento de arena en la atmósfera.



Imagen N°22: Descarga de material de relleno tipo A-3 de calle alianza, con la finalidad de ser utilizado para mezcla de concreto.



IOAAR NO PIP: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE LEVANTAMIENTO EN EL (LA) VÍAS DE ACCESO DEL A.A.H.H. PILAR NORES DE GARCÍA EN LA LOCALIDAD DE PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO".

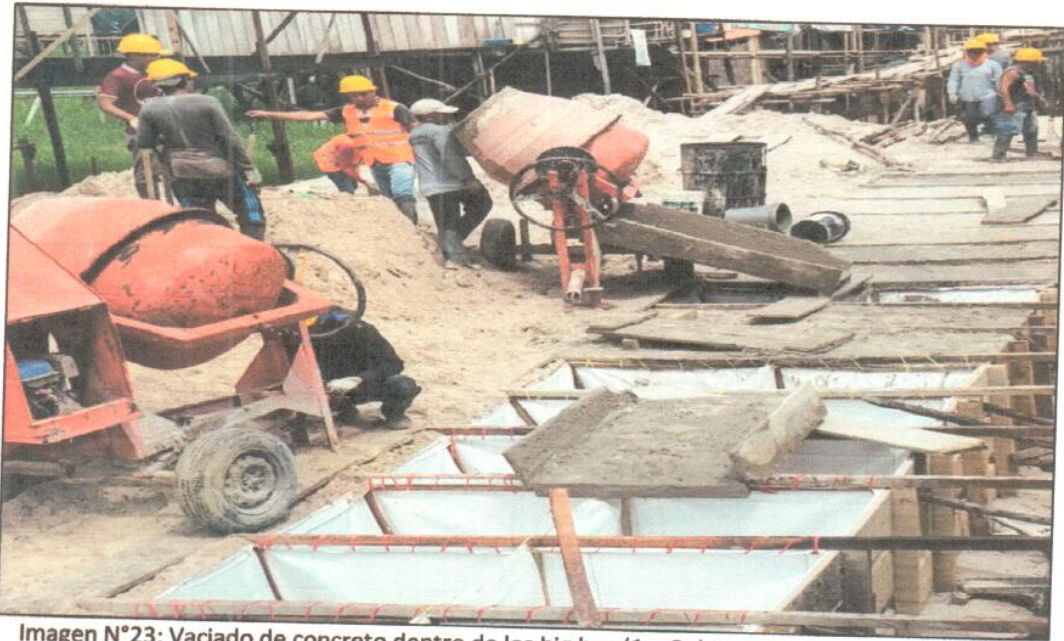


Imagen N°23: Vaciado de concreto dentro de los big bag (1 m3 de mortero)



Imagen N°24: Recepción y movimiento de material de relleno tipo A-3.

MARLOND CARLOS CHUGUELLANUS SIEVA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 225414



IOAAR NO PIP: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE LEVANTAMIENTO EN EL (LA) VÍAS DE ACCESO DEL A.A.H.H. PILAR NORES DE GARCÍA EN LA LOCALIDAD DE PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO".

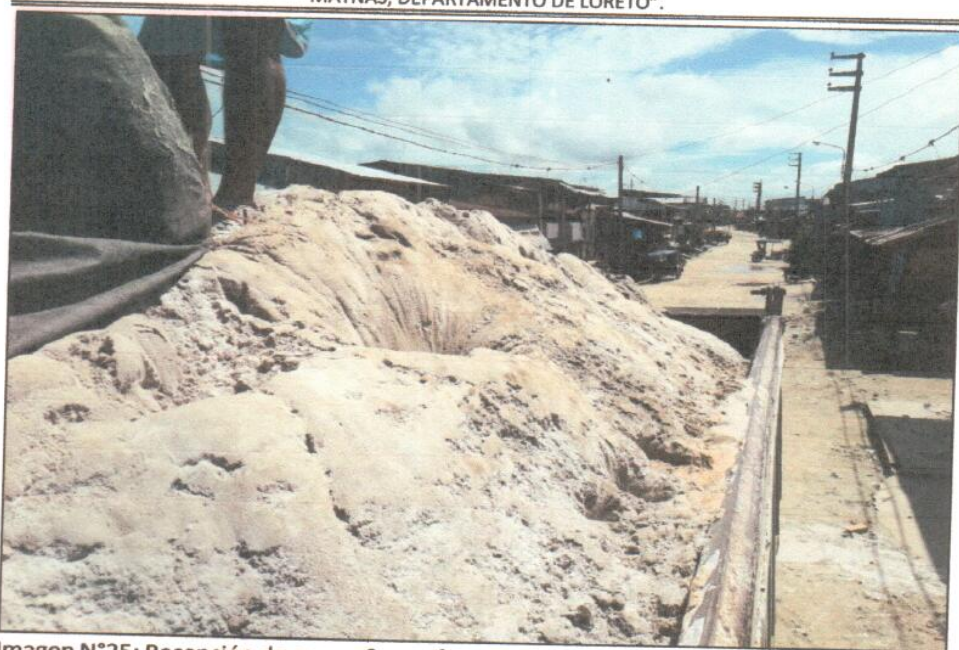


Imagen N°25: Recepción de arena. Se verifica que la arena contenida en los volquetes sea la cantidad estima (18m3)




Imagen N°26: Recepción polos manga larga, otorgadas a los trabajadores de obra (operarios y peones)


MARLON CARLOS CHUQUISANDI SILVA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 225414



IOAAR NO PIP: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE LEVANTAMIENTO EN EL (LA) VÍAS DE ACCESO DEL A.A.H.H. PILAR NORES DE GARCÍA EN LA LOCALIDAD DE PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO".

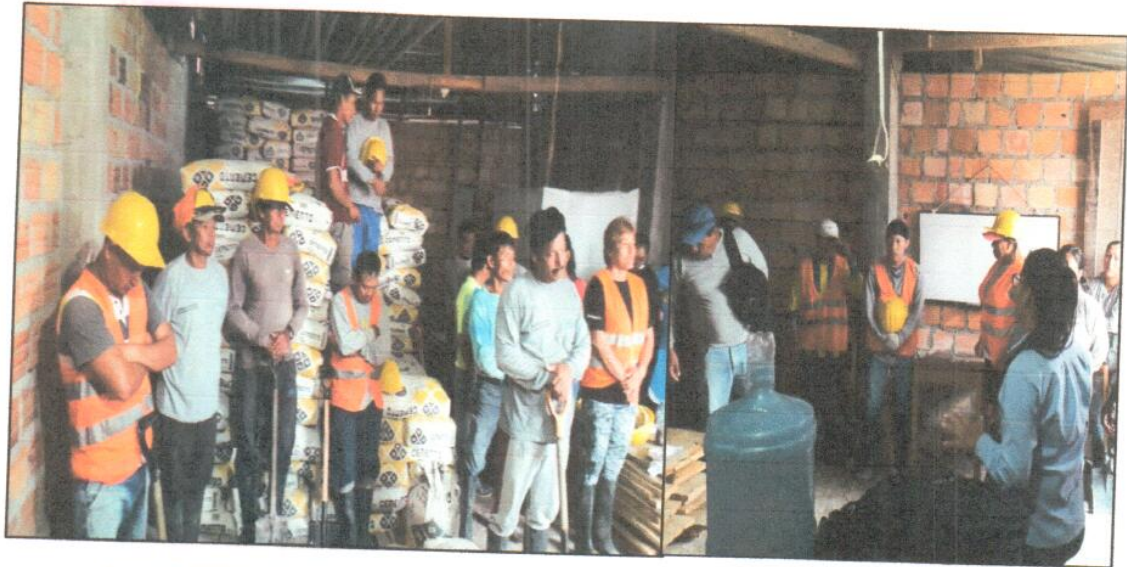


Imagen N°27 : Charlas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, en donde se explicó sobre la actividad de "uso adecuado de equipos de protección personal"


MARLON CARLOS CHUQUILISQUI SILVA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 225414





VALORIZACION

N.º 4



06 FEB 2020

Fecha: _____ Hora: _____ "Año de la universalización de la salud"

N° REG: _____

INFORME N° 009 - 2020-GRL/GRI/SGO-/SGSyC-RFA

Al : Luis Alberto Ramírez Panduro
Sub gerente de obras


Del : ING. Ingeniero Raúl Flores Aquepucho
Sub gerente de supervisión y control

Asunto : Conformidad a la Valorización N° 04

Obra : ""CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO; EN EL (LA) VIAS DE ACCESO DEL AA.HH. PILAR NORES DE GARCÍA EN LA LOCALIDAD PUNCHANA

Ref. : a. CARTA N° 005-2020/SGO-

FECHA : 05 de febrero del 2020



Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo y a la vez hacerle llegar el informe de conformidad de la valorización N° 04 de la IOARRS NO PIP ""CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO; EN EL (LA) VIAS DE ACCESO DEL AA.HH. PILAR NORES DE GARCÍA EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, correspondiente al mes de enero del 2020, presentado por el ingeniero, Arthur Harold Paiva Armas, mediante la referencia (a), el mismo que ha sido verificado en obra, cumpliéndose con los lineamientos y requerimientos establecidos para el trámite.

1. GENERALIDADES

OBRA : "REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL IOARR NO PIP: CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO; EN EL (LA) VIAS DE ACCESO DEL AA.HH. PILAR NORES DE GARCÍA EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO"

UBICACIÓN : "DEL AA.HH. PILAR NORES DE GARCÍA EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO"

EJECUTA : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

VALOR REFERENCIAL CON IGV : S/ 6,908,539.38

MONTO REFERENCIAL CON GA-IGV : S/ 3, 517,230.25

FECHA DEL PRESUPUESTO : agosto 2019

PLAZO DE EJECUCION : 240 días calendarios

ENTREGA DE TERRENO : 12 DE OCTUBRE DEL 2019

INICIO DE OBRA : 21 DE OCTUBRE 2019

FECHA DE TERMINO DE PLAZO DE EJEC. : 16 de junio 2020

AVANCE DE OBRA DEL MES : programado : 31.90 %
Real : 20.49 %



“Año de la universalización de la salud”

AVANCE FISICO ACUM. EJECUTADO : 20.49 % (30/01/2020)
AVANCE PROGRAMADIO ACUM. : 31.90% (30/01/2020)
Residente : ING.
Inspector : ING. Raúl Flores Aquepucho

2. CONTENIDO DE LA DOCUMENTACION

CONTENIDO
INFORME DEL RESIDENTE
COPIA DE AUTORIZACIÓN DE INTERVENCIÓN DE VÍAS
VALORIZACIÓN DEL MES
RESUMEN DE LA VALORIZACIÓN
HOJA DE LIQUIDACIÓN
PLANILLA DE METRADOS JUSTIFICADOS
CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA
CUADRO COMPARATIVA D LO PROGRAMADO VS LO EJECUTADO
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
ACTA DE ENTREGA DEL TERRENO
ORDEN DE SERVICIO DEL RESIDENTE
ORDENES DE SERVICIO PERSONAL ADMINISTRATIVO
CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL ADMINISTRATIVO
CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL OBRERO
CONTROL DE ALMACÉN
PANEL FOTOGRÁFICO
CUADERNO DE OBRA

3. ANTECEDENTES

Mediante resolución gerencial regional n° 088-2019-GRL-GRI, con fecha 13 de agosto del 2019 es aprobado el saldo del Expediente Técnico del IOARR NO PIP de la obra antes mencionada con un presupuesto ascendente a s/ 5' 854,694.39 sin IGV, con precios vigentes al mes de agosto del 2019, con un plazo de ejecución de 240 días calendarios, obra que se ejecuta mediante ejecución presupuestaria directa – Administración directa obra encargada por la sub gerencia de obra.

Con orden de servicio n° 0002888del 10 de octubre del 2019 es contratado los servicios del ing. Marlond Carlos Chuquillanqui Silva, como responsable de la obra

Mediante memorando N° 052- 2019-GRL-GRI-FGSYC, de fecha, 02 de noviembre del 2019 se designa como inspector al Ingeniero Allan Guilianno Ramírez Sangama, como Inspector.

Mediante carta 001-2020- GRI/AGRS de fecha 03 de enero 2020, el ingeniero Allan Guilianno Ramírez Sangama, presenta su renuncia como Inspector.

con carta N° 005-2020-SGO/MCCHS el residente de obra presenta la valorización N° 04 correspondiente al mes de enero -2020, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un monto bruto de S/. 1,199,918.04 soles, de manera que se presenta para el control correspondiente, con la siguiente documentación



“Año de la universalización de la salud”

4. EVALUACION DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTAD

visto las copias del cuaderno de obra, el ingeniero residente conjuntamente con el inspector de obra, en la que se consigna, cuantifica y aprueba los trabajos ejecutados para la valorización de obra n° 04 correspondiente al mes de enero del 2020, las cuales son aprobadas por el inspector de obra y plasmadas en la documentación tramitada indicando a su vez que luego de efectuada la revisión al procedimiento de cálculo de los montos consignados en la valorización n° 04 de la referida obra, se ha podido determinar que se ajustan a los procedimientos que rigen el cálculo de las valorizaciones de obras públicas, en concordancia con la documentación sustentadora presentada.

5. CONCLUSIONES

La valorización de obra N° 04 del mes de enero - 2020, cuenta con la documentación correspondiente.

El suscrito en calidad de inspector verifíco que la documentación presentada se encuentra conforme debido a que se verifíco que los metrados descritos en el cuaderno de obra son compatible con la valorización de obra n° 04 del mes de enero 2020

Se verifíco que la obra al mes de enero del 2020, cuenta con un avance real acumulado ejecutado de 20.49 % y un programado de 31.90%, encontrándose la obra atrasada.

El suscrito realizo la revisión de la documentación presentada en la valorización, correspondiente, por lo cual el suscrito otorga la conformidad a la valorización mencionada

6. RECOMENDACIONES

Se recomienda, disponer las actividades en todos los frentes disponibles a fin de incrementar los avances correspondientes a los siguientes meses y así no se vea afectada la continuidad programada de los trabajos y la ruta crítica, se tiene una valorización por un monto de s/. 1, 199,918.04 soles por la ejecución de la obra; por, lo que el suscrito encuentra conforme la documentación presentada en la presente valorización

Es cuanto informo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regional de Infraestructura

Ing. RAUL FLORES AQUEPUCHO
Sub Gerente de Supervisión y Control



Iquitos 03 febrero del 2020

N° Reg:

CARTA N°005-2020-SGO-MCCHS

SEÑOR : Ing. LUIS ALBERTO RAMÍREZ PANDURO
Sub Gerente de Obras – GRI

REFERENCIA: IOARR NO PIP: "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO; EN EL (LA) VIAS DE ACCESO DEL AA.HH. PILAR NORES DE GARCIA EN LA LOCALIDAD DE PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO".

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
SUB GERENCIA DE OBRAS

ASUNTO : VALORIZACION N° 04 – MES DE ENERO DEL 2020.

03 FEB 2020

Fecha: *ef* Hora:

N° REG:

Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo y a la vez remitir a su despacho la **VALORIZACIÓN N°04**, correspondiente al mes de **ENERO 2020** del Proyecto: IOARR NO PIP: "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO; EN EL (LA) VIAS DE ACCESO DEL AA.HH. PILAR NORES DE GARCIA EN LA LOCALIDAD DE PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO", elaborado por el suscrito.

Es cuanto cumpla en remitir a su despacho para conocimiento y fines que se sirva determinar.

Atentamente,

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 04

OBRA: IOARR NO PIP "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

RESIDENTE: MARLON CARLOS CHUQUILLANQUI SILVA

INSPECTOR: RAUL FLORES AQUEPUCO

UBICACIÓN: PUNCHANA - MAYNAS - LORETO

FECHA: ENERO DEL 2020

1. (LA) VÍAS DE ACCESO DEL AAHH PILAR NORES DE GARCÍA EN LA LOCALIDAD D

PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.

PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS CALENDARIOS

PRESUPUESTO CONTRATADO: 5,854,694.39 SIN IGV

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			ANTERIOR		ACTUAL		AVANCE		ACUMULADO		SALDO		
		Und.	Metrado	P. Unit.	Presup.	Metrado	Valorizado S/.	Metrado	Valorizado S/.	Metrado	Valorizado S/.	Metrado	Valorizado S/.	Metrado	Valorizado S/.
						%	%	%	%	%	%				
01	MEJORAMIENTO DE LAS CA. Y PSJ. DEL AA.HH PILAR NORES DE GARCIA														
01.01	OBRAS PROVISIONALES														
01.01.01	CARTEL DE OBRA DE 3.60m x 5.80m, TIPO GIGANTOGRAFIA inc. COLOCACION	und	1.00	844.14	844.14	1.00	844.14	0.00	0.00	1.00	844.14	100.00%	0.00	0.00	0.00%
01.01.02	ALQUILER DE ALMACEN	mes	8.00	500.00	4,000.00	3.00	1,500.00	1.00	500.00	4.00	2,000.00	50.00%	4.00	2,000.00	50.00%
01.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES														
01.02.01	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO (con teodolito y nivel) Inicio y Final	m2	17,717.82	0.38	6,732.77	14,469.04	5,498.24	1,300.00	570.00	15,969.04	6,068.24	90.13%	1,748.78	664.54	9.87%
01.03	SEGURIDAD Y SALUD														
01.03.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	und	1.00	2,500.00	2,500.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%
01.03.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)	und	1.00	3,985.00	3,985.00	0.39	1,554.15	0.02	79.70	0.41	1,633.85	41.00%	0.59	2,351.15	59.00%
01.03.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA (EPC)	und	1.00	240.00	240.00	0.64	153.60	0.05	12.00	0.69	165.60	69.00%	0.31	74.40	31.00%
01.04	CORTE DE TERRENO														
01.04.01	CORTE DE TERRENO CON RETROEXCAVADORA	m3	10,369.68	3.00	31,109.04	3,500.00	10,500.00	2,500.00	7,500.00	6,000.00	18,000.00	57.86%	4,369.68	13,109.04	42.14%
01.05	RELLENOS														
01.05.01	RELLENO CON MATERIAL A-3	m3	25,689.57	38.73	994,918.32	2,839.25	109,964.15	224.00	8,675.52	3,063.25	118,639.67	11.92%	22,625.32	876,278.64	88.08%
01.05.02	RELLENO CON MATERIAL A-2-4	m3	3,396.07	38.73	131,529.79	2,770.35	107,295.66	100.00	3,873.00	2,870.35	111,168.66	84.52%	525.72	20,361.14	15.48%
01.06.01	TALUD PIPROTECCION DE RELLENO	m3	337.81	161.43	54,532.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	337.81	54,532.67	100.00%
01.06.02	BOL SACRETO C-A 1:10	m3	22,317.12	188.46	4,205,884.44	3,449.30	650,055.08	1,148.00	216,352.08	4,597.30	866,407.16	20.60%	17,719.82	3,339,477.28	79.40%
01.07	BIG BAG MEZCLA 1:10	m	132.00	288.49	38,080.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	132.00	38,080.68	100.00%
01.07.01	ALCANTARILLA DE CRUBE	m	108.00	89.92	9,711.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	108.00	9,711.36	100.00%
01.07.02	ALCANTARILLA TMC D=24"	m	265.00	17.10	4,531.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	265.00	4,531.50	100.00%
01.08	VARIOS														
01.08.01	TUBO DE PVC 4" PARA DESAGUE	m	678.00	12.07	8,183.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	678.00	8,183.46	100.00%
01.08.02	TUBERIA PVC SAP Ø 12"	und	160.00	13.01	2,081.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	160.00	2,081.60	100.00%
01.08.03	CODO PVC-SAP 12" x 90°	und	160.00	13.31	2,129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	160.00	2,129.60	100.00%
01.08.04	TEE PVC-SAP 12"	und	160.00	13.31	2,129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	160.00	2,129.60	100.00%
	COSTO DIRECTO (CD)				5,500,994.37		889,865.02		237,562.30		1,127,427.31			4,373,567.06	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6.429747			353,700.02		57,216.07		15,274.65		72,490.72			281,209.30	
	SUB TOTAL				5,854,694.39		947,081.09		252,836.95		1,199,918.03			4,654,776.36	
	TOTAL DEL PRESUPUESTO				5,854,694.39		947,081.09		252,836.95		1,199,918.03			4,654,776.36	
	PORCENTAJE				100.00%		16.18%		4.32%		20.49%			79.51%	



IOAAR NO PIP: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE LEVANTAMIENTO EN EL (LA) VÍAS DE ACCESO DEL A.A.H.H. PILAR NORES DE GARCÍA EN LA LOCALIDAD DE PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO".



Imagen N°34: Instalación de big bag en campo ubicado en calle alianza del A.H. Pilar Nores de García.



Imagen N°35: Trabajos de acopio de material de relleno realizado con maquinaria pesada "Retroexcavadora", ubicado en calle soledad.



IOAAR NO PIP: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE LEVANTAMIENTO EN EL (LA) VÍAS DE ACCESO DEL A.A.H.H. PILAR NORES DE GARCÍA EN LA LOCALIDAD DE PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO".

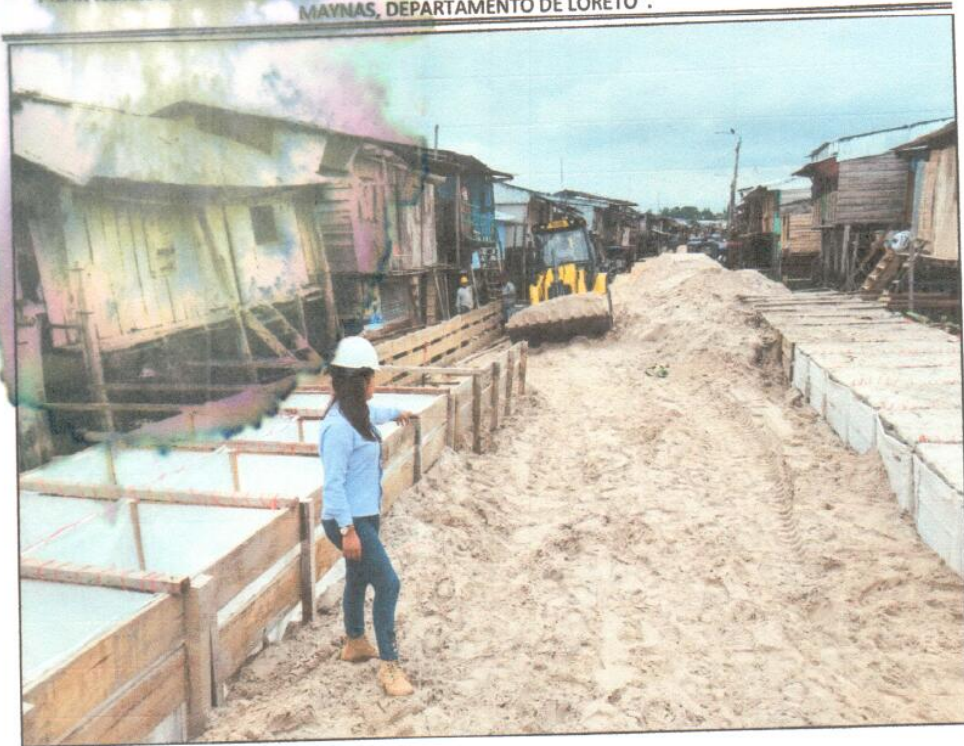


Imagen N°36: Trabajos de acopio de material de relleno realizado con maquinaria pesada "Retroexcavadora", ubicado en calle Alianza.

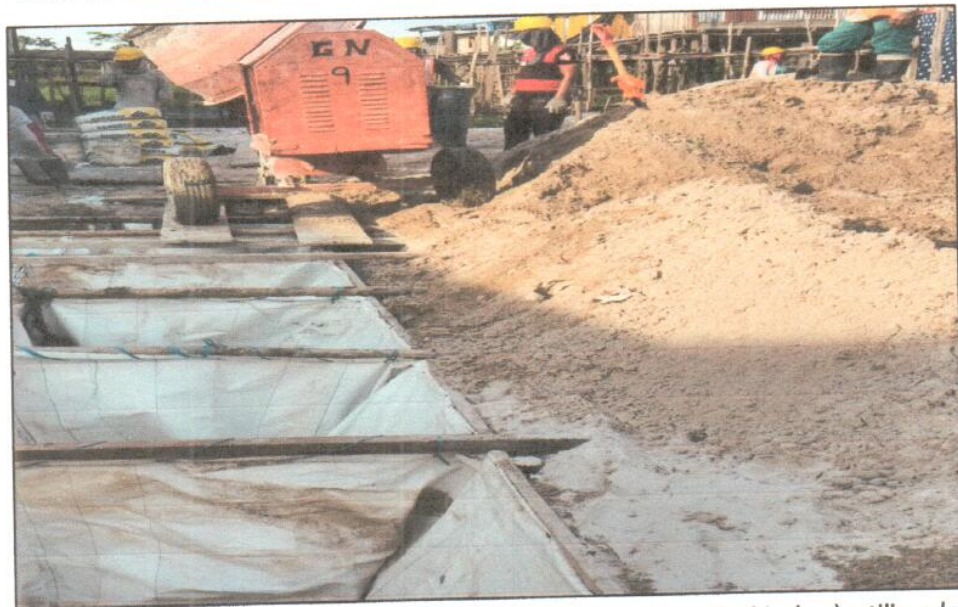


Imagen N°37: Vaciado de concreto en big bag (1 m# por cada big bag) utilizando mezcladoras.



IOAAR NO PIP: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE LEVANTAMIENTO EN EL (LA) VÍAS DE ACCESO DEL A.A.H.H. PILAR NORES DE GARCÍA EN LA LOCALIDAD DE PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO".



Imagen N°38: Trabajo de relleno con material tipo A-3 utilizando maquinaria pesada "Minicargador".



Imagen N°39: Charlas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Se explicó sobre el uso correcto de los equipos de protección personal.



IOAAR NO PIP: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE LEVANTAMIENTO EN EL (LA) VÍAS DE ACCESO DEL A.A.H.H. PILAR NORES DE GARCÍA EN LA LOCALIDAD DE PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO".



Imagen N°40: Reunión técnica y de coordinación con dirigentes de las calles intervenidas por el proyecto ubicado en el A.H. Pilar Nores de García. Los temas tratados son: aspectos técnicos del proyecto y medidas de seguridad de los vecinos aledaños a la obra.



Imagen N°41: Charlas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, en donde se trató temas de accidentes e incidentes suscitados en obra.



VALORIZACION

N.º 5



05 MAR 2020

Fecha:

Hora:

"Año de la Lucha contra la corrupción y la Impunidad"

N° REG:

INFORME N° 22 - 2020-GRL/GRI/SGS Y C /DPCL

Al : Luis Alberto Ramírez Panduro
Sub gerente de obras

Del : ING. Diana Paola Castro Litano
Inspector de obra

Asunto : Conformidad a la Valorización N° 05

Obra : "IOARR NO PIP: "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO; EN EL (LA) VIAS DE ACCESO DEL AA.HH. PILAR NORES DE GARCIA EN LA LOCALIDAD DE PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO

Ref. : a. CARTA N° 010-2020/SGO-AHPA

FECHA : 05 de marzo del 2020



Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo y a la vez hacerle llegar el informe de conformidad de la valorización N° 05 de la **IOARRS NO PIP** "IOARR NO PIP: "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO; EN EL (LA) VIAS DE ACCESO DEL AA.HH. PILAR NORES DE GARCIA EN LA LOCALIDAD DE PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO, correspondiente al mes de FEBRERO del 2020, presentado por el ingeniero, Marlon Carlos Chuquillanqui Silva, mediante la referencia (a), el mismo que ha sido verificado en obra, cumpliéndose con los lineamientos y requerimientos establecidos para el trámite.

1. GENERALIDADES

OBRA : CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO; EN EL (LA) VIAS DE ACCESO DEL AA.HH. PILAR NORES DE GARCÍA EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO"

UBICACIÓN : "DEL AA.HH. PILAR NORES DE GARCÍA EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO"

EJECUTA : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

VALOR REFERENCIAL CON IGV : S/ 6,908,539.38

MONTO REFERENCIAL CON GA-IGV : S/ 3,517,230.25

FECHA DEL PRESUPUESTO : agosto 2019

PLAZO DE EJECUCION : 240 días calendarios

ENTREGA DE TERRENO : 12 DE OCTUBRE DEL 2019

INICIO DE OBRA : 21 de octubre



“Año de la Lucha contra la corrupción y la Impunidad”

FECHA DE TERMINO DE PLAZO DE EJEC. :	16 de junio 2020
AVANCE DE OBRA DEL MES	: programado : 3.36 %
	Real : 2.95 %
AVANCE FISICO ACUM. EJECUTADO	: 23.45 % (29/02/2020)
AVANCE PROGRAMADIO ACUM.	: 23.86 % (29/02/2020)
Residente	: ING. Marlon Carlos Chuquillanqui Silva
Inspector	: ING. Diana Paola castro litano

2. CONTENIDO DE LA DOCUMENTACION

CONTENIDO
INFORME DEL RESIDENTE
COPIA DE AUTORIZACIÓN DE INTERVENCIÓN DE VÍAS
VALORIZACIÓN DEL MES
RESUMEN DE LA VALORIZACIÓN
HOJA DE LIQUIDACIÓN
PLANILLA DE METRADOS JUSTIFICADOS
CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA
CUADRO COMPARATIVA D LO PROGRAMADO VS LO EJECUTADO
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
ACTA DE ENTREGA DEL TERRENO
ORDEN DE SERVICIO DEL RESIDENTE
ORDENES DE SERVICIO PERSONAL ADMINISTRATIVO
CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL ADMINISTRATIVO
CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL OBRERO
CONTROL DE ALMACÉN
PANEL FOTOGRÁFICO
CUADERNO DE OBRA

3. ANTECEDENTES

Mediante resolución gerencial regional n° 088-2019-GRL-GRI, con fecha 13 de agosto del 2019 es aprobado el saldo del Expediente Técnico del IOARR NO PIP de la obra antes mencionada con un presupuesto ascendente a s/ 5' 854,694.39 sin IGV, con precios vigentes al mes de agosto del 2019, con un plazo de ejecución de 240 días calendarios, obra que se ejecuta mediante ejecución presupuestaria directa – Administración directa obra encargada por la sub gerencia de obra

Con orden de servicio n° 0002888 del 10 de octubre del 2019 es contratado los servicios del ing. Marlon Carlos Chuquillanqui Silva, como responsable de la obra

Mediante memorando N° 052- 2019-GRL-GRI-FGSYC, de fecha, 02 de noviembre del 2019 se designa como inspector al Ingeniero Allan Guilianno Ramírez Sangama, como Inspector.

Mediante carta 001-2020- GRI/AGRS de fecha 03 de enero 2020, el ingeniero Allan Guilianno Ramírez Sangama, presenta su renuncia como Inspector.

con carta N° 004-2020-SGO/AHPA el residente de obra presenta la valorización N° 04 correspondiente al mes de febrero -2020, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un monto bruto de S/. 172,912.35 soles, de manera que se presenta para el control correspondiente, con la



“Año de la Lucha contra la corrupción y la Impunidad”

siguiente documentación

4. EVALUACION DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTAD

visto las copias del cuaderno de obra, el ingeniero residente conjuntamente con el inspector de obra, en la que se consigna, cuantifica y aprueba los trabajos ejecutados para la valorización de obra n° 05 correspondiente al mes de febrero del 2020, las cuales son aprobadas por el inspector de obra y plasmadas en la documentación tramitada indicando a su vez que luego de efectuada la revisión al procedimiento de cálculo de los montos consignados en la valorización n° 05 de la referida obra, se ha podido determinar que se ajustan a los procedimientos que rigen el cálculo de las valorizaciones de obras públicas, en concordancia con la documentación sustentadora presentada.

5. CONCLUSIONES

La valorización de obra N° 05 del mes de febrero - 2020, cuenta con la documentación correspondiente.

El suscrito en calidad de inspector verifico que la documentación presentada se encuentra conforme debido a que se verifico que los metrados descritos en el cuaderno de obra son compatible con la valorización de obra n° 05 del mes de febrero 2020

Se verifico que la obra al mes de febrero del 2020, cuenta con un avance real acumulado ejecutado de 23.45% y un programado de 23.86 %, encontrándose la obra atrasada.

El suscrito realizo la revisión de la documentación presentada en la valorización, correspondiente, por lo cual el suscrito otorga la conformidad a la valorización mencionada

6. RECOMENDACIONES

Se recomienda, disponer las actividades en todos los frentes disponibles a fin de incrementar los avances correspondientes a los siguientes meses y así no se vea afectada la continuidad programada de los trabajos y la ruta crítica, se tiene una valorización por un monto de s/. 947,081.09 soles por la ejecución de la obra; por, lo que el suscrito encuentra conforme la documentación presentada en la presente valorización, asimismo el proyecto se encuentra atrasado con respecto a su calendario actualizado de obra, se recomienda otorgar una ampliación de plazo teniendo en cuenta el análisis del control de las valorizaciones donde se hace énfasis en el rendimiento, siendo este el principal tema de los atrasos del proyecto, además de la falta de responsabilidad de los proveedores de maquinarias.

Se recomienda remitir al proyectista su pronunciamiento respecto al rendimiento con la mano de obras establecido en el análisis de los costos unitarios, a través de la sub gerencia de estudios y proyectos, por lo que se sugiere la modificación de los análisis de costos unitarios con respecto a los rendimiento establecidos en el expediente técnico aprobado.

De acuerdo al análisis in situ de obra se puede apreciar que el plazo es insuficiente



“Año de la Lucha contra la corrupción y la Impunidad”

Se recomienda al residente implementar su logística a fin de tener un correcto seguimiento de los plazos de cancelación de los servicios y evitar así inconvenientes con retraso de abastecimiento de las maquinarias materiales, y con el pago del personal.

Se recomienda, disponer las actividades en todos los frentes disponibles a fin de incrementar los avances correspondientes a los siguientes meses y así no se vea afectada la continuidad programada de los trabajos y la ruta crítica, se tiene una valorización por un monto de s/. 172,912.35 soles por la ejecución de la obra; por, lo que el suscrito encuentra conforme la documentación presentada en la presente valorización

Es cuanto informo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

Atentamente,

INGENIERO CIVIL

DIANA PAOLA CASTRO LITANO
CIP. 162223



02 MAR 2020
Fecha: _____ Hora: _____
N° Reg: _____

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
SUB GERENCIA DE OBRAS
02 MAR 2020
Fecha: _____ Hora: _____
N° REG: _____

Iquitos 02marzo del 2020

CARTA N°010-2020-SGO-MCCHS

SEÑOR : Ing. LUIS ALBERTO RAMÍREZ PANDURO
Sub Gerente de Obras – GRI

REFERENCIA: IOARR NO PIP: "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO; EN EL (LA) VIAS DE ACCESO DEL AA.HH. PILAR NORES DE GARCIA EN LA LOCALIDAD DE PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO".

ASUNTO : VALORIZACION N° 05 – MES DE FEBRERO DEL 2020.

Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo y a la vez remitir a su despacho la **VALORIZACIÓN N°05**, correspondiente al mes de **FEBRERO 2020** del Proyecto: IOARR NO PIP: "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO; EN EL (LA) VIAS DE ACCESO DEL AA.HH. PILAR NORES DE GARCIA EN LA LOCALIDAD DE PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO", elaborado por el suscrito.

Es cuanto cumplo en remitir a su despacho para conocimiento y fines que se sirva determinar.

Atentamente,


MARLON CARLOS CHIRIQUIANO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 225414



INFORME N° 012-2019/SGO/MCCHS

A : ING. JORGE MARTIN REYNA NOMBERTO
SUB GERENTE DE OBRA

De : ING. MARLON CHUQUILLANQUI SILVA
RESIDENTE DE OBRA

Asunto : **REMITO VALORIZACION N° 05**
IOARR NO PIP: "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE
LEVANTAMIENTO; EN EL (LA) VIAS DE ACCESO DEL AA.HH.
PILAR NORES DE GARCIA EN LA LOCALIDAD PUNCHANA,
DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS,
DEPARTAMENTO LORETO"

Fecha : Iquitos, 02 de marzo del 2019

01. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

IOARR NO PIP: "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO; EN EL (LA) VIAS DE ACCESO DEL AA.HH. PILAR NORES DE GARCÍA EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO" PARA EL SALDO DE OBRA
CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2422017

UBICACIÓN
DEPARTAMENTO : LORETO
PROVINCIA : MAYNAS
DISTRITO : PUNCHANA
LOCALIDAD : AA.HH PILAR NORES

RESPONSABLES DEL PROYECTO

INSPECTOR : Ing. Allan Guilianno Ramírez Sangama
RESIDENTE : Ing. Marlond Carlos Chuquillanqui Silva
PERSONAL ADMINISTRATIVO
ASISTENTE DE RESIDENTE : Ing. Jhon Paul Mori Pinedo
ASISTENTE ADMINISTRATIVO : Ines J. Perez Zelada Vasquez
MAESTRO DE OBRA : William Braga Espinoza
TOPOGRAFO : Roberto Carlos Garcia Cabrera
ALMACENERO : Jaira Mozombite Oliveira
PLANILLERO : Elvis Gerald Linares Araujo
CONTROLADOR DE MAQUINA : Alexis Javier Jesus Sanchez
GUARDIAN DE NOCHE : Ely Ruth Payahaua Tuanama
MONTO DE LA INBERSION S/IGV : S/ 5,845,694.39
PLAZO DE EJECUCION : 240 Días calendarios


MARLOND CARLOS CHUQUILLANQUI SILVA
INGENIERO CIVIL
Reg. C.P. N° 225414



2.0 MEMORIA DESCRIPTIVA

2.1. GENERALIDADES DEL IOARR

2.1.1. CONSIDERACIONES PREVIAS DEL IOARR

El presente Expediente Técnico constituye la **REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL IOARR NO PIP: "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO; EN EL (LA) VIAS DE ACCESO DEL AA.HH. PILAR NORES DE GARCÍA EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO"** PARA EL SALDO DE OBRA. El mismo que ha sido concebido para reiniciar los trabajos dejados inconclusos durante su ejecución como Primera Etapa.

Para la elaboración del presente Expediente Técnico se ha tenido en cuenta las consideraciones propias y muy peculiares de la zona donde han de desarrollarse los trabajos, las mismas que deberán ser tomadas a la hora de ejecución tal como es las épocas de creciente y vaciante, ya que durante época de creciente no es posible la ejecución del Proyecto.

El propósito del Proyecto está orientado a reducir el déficit de calles en mal estado que se encuentran sin pavimentación, con la finalidad de mejorar la accesibilidad a las viviendas para así mantener un fácil y recíproco acceso a los beneficios sociales tales como la educación, salud, y los diferentes servicios. El desarrollo del proyecto a nivel de ejecución de obras civiles es materia de la presente memoria descriptiva.

2.2. OBJETIVOS DEL IOARR:

Tiene por objetivo principal la **REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL IOARR NO PIP: "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO; EN VIAS DE ACCESO DEL AA.HH. PILAR NORES DE GARCÍA EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO"** PARA EL SALDO DE OBRA, a fin de dar mejora a la transitabilidad vehicular, peatonal de las personas que viven en dicho Asentamiento Humano y población en general. Y como objetivos secundarios se tiene los siguientes:

- Elevar el nivel de vida de la población del Asentamiento Humano Pilar Nores de García.
- Generar fuentes de trabajo a los pobladores de la zona, durante la ejecución.


MARCO CARLOS CUSI LLANCHO SILVA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 225414



Por tanto, se hace necesario la reformulación del Expediente técnico para mejorar las vías de acceso y la transitabilidad de la población.

2.3. ANTECEDENTES DEL IOARR

Es una particularidad habitual en los Asentamientos Humanos de la selva Loretana que se encuentran al Margen de los Ríos, lagos o quebradas y que presenten inaccesibilidad peatonal y vehicular debido a que en época de creciente estos se inundan y dejan terreno fangoso siendo esto inaccesible para la población.

El Gobierno Regional de Loreto recoge la preocupación y la necesidad de la población del A.A.H.H PILAR NORES DE GARCÍA, y así toma como prioridad la Reformulación del expediente Técnico para el saldo de obra, para lograr de esta manera mejorar las condiciones sociales y económicas de los pobladores de esta zona y población en general.


2.4. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL IOARR

Geográficamente el proyecto se encuentra ubicado en la selva loretana, teniendo una altitud promedio de 105 msnm.

- Región : Loreto
- Departamento : Loreto
- Provincia : Maynas
- Distrito : Punchana

El Proyecto se localiza en el Asentamiento Humano PILAR NORES DE GARCÍA, el cual se encuentra al Norte de la ciudad, ubicado en la zona inundable de la periferia de la ciudad, en el Distrito de Punchana, Provincia de Maynas, Región Loreto.

MARLON CARLOS CHICHA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 225414

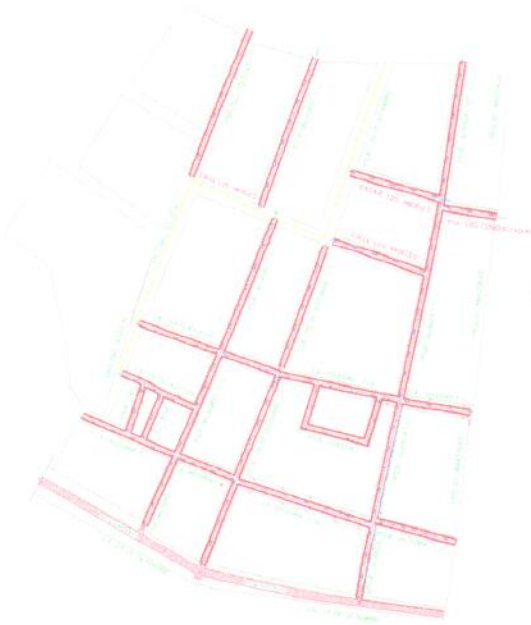

AA.HH. PILAR NORES DE GARCÍA

2.5. CARACTERÍSTICAS DEL AREA A INTERVENIR

La zona donde se van a desarrollar los trabajos constituye un bosque típico de la Selva Baja u Omagua, registrándose altas precipitaciones pluviales, llegando a alcanzarse pluviosidades incluso del orden de 2,800 a 3,000 mm de promedio anual. La temperatura oscila entre 28°C y 32°C en promedio. Los suelos son del tipo mixtos lateríticos con predominancia de material fino, sobre todo arcillas, limos, y arena.

2.6. ACCESO A LA ZONA

El Asentamiento Humano donde se proyecta la Reformulación del Expediente Técnico del IOARR NO PIP se encuentra en la zona norte de la ciudad de Iquitos. A esta zona se puede acceder vía terrestre. Esta vía es adecuada para el transporte de materiales, haciendo fácil el acceso de dichos materiales a la Obra, la falta de cualquier material podría retrasar el avance de ejecución de la obra. Los plazos de travesía por medio de la vía terrestre dependen sustancialmente de los requerimientos hechos por Logística de la Entidad a Ejecutar la Obra.


MARLON CARLOS ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 225414



2.7. TOPOGRAFÍA

El terreno donde se hará la REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL IOARR NO PIP: "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO; EN EL (LA) VIAS DE ACCESO DEL AA.HH. PILAR NORES DE GARCÍA EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO" PARA EL SALDO DE OBRA presenta una topografía ondulada, con pendientes mínimas.

2.8. DESCRIPCIÓN DEL IOARR

2.8.1. ALCANCES

La REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL IOARR NO PIP: "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO; EN EL (LA) VIAS DE ACCESO DEL AA.HH. PILAR NORES DE GARCIA EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO" PARA EL SALDO DE OBRA, elaborado por el Gobierno regional de Loreto, comprende lo siguiente:

En Levantamiento de la cota de terreno natural en la Calles y/o Pasajes, que comprende el Asentamiento Humano Pilar Nores de García, por encima de la cota máxima de creciente, habiéndose calculado esta cota máxima de creciente de acuerdo a cada calle a intervenir.

2.8.2. DESCRIPCIÓN

El IOARR comprende la ejecución de obras de movimiento de tierras, colocando ambos lados bloques de Big Bag, elevando de esta manera el nivel de rasante actual, de tal manera que no se vea afectada en época de creciente del río; la longitud de la vía es de acuerdo al nivel de cota máxima identificada en Cada Calle, el cual es la siguiente:


MARLON CARLOS CHOLEZ SANCHEZ
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 225414



Ítem	Descripción	Longitud (m)
1.00	Pasaje Alianza	502.80
2.00	Pasaje 5 de Diciembre	305.97
3.00	Pasaje Milagros	453.37
4.00	Calle Victoria	343.30
5.00	Pasaje A	42.69
6.00	Pasaje B	44.73
7.00	Calle 14 de Agosto	73.05
8.00	Calle Soledad	323.21
9.00	Prolongación Soledad	150.00
10.00	Calle Los Ángeles	100.00
11.00	Pasaje Los Ángeles	87.55
12.00	Pasaje Los Conquistadores	45.53
13.00	Pasaje Soledad	140.16
	Total	2,612.36 m

Las longitudes de cada calle varían de acuerdo a las progresivas en caso de la Pasaje Alianza de la progresiva 0+000 hasta la progresiva 0+502.80, Pasaje 5 de Diciembre de la progresiva 0+000 hasta la progresiva 0+305.97, Pasaje Milagros de la progresiva 0+000 hasta la progresiva 0+453.37; Calle Victoria de la progresiva 0+000 hasta la progresiva 0+343.30, Pasaje A de la progresiva 0+000 hasta la progresiva 0+42.69; Pasaje B Bolívar progresiva 0+000 hasta la progresiva 00+44.73; Calle 14 de Agosto es de la progresiva 0+000 hasta la progresiva 0+73.05.

En Calle Soledad la progresiva 0+000 hasta la progresiva 0+323.21, Prolongación Soledad es de la progresiva 0+000 hasta la progresiva 0+150; Calle los ángeles es de la progresiva 0+000 hasta la progresiva 0+100; Pasaje los ángeles es de la progresiva 0+000 hasta la progresiva 0+087.55; Pasaje los conquistadores es de la progresiva 0+000 hasta la progresiva 0+045.53 y Pasaje


MARLOND CARLOS CHAVEZ SILVA
INGENIERO CIVIL
Reg. C.P. N° 225414



Soledad es de la progresiva 0+000 hasta la progresiva 0+140.16, todas las anteriores con un ancho de acuerdo a los planos.

La colocación del material de préstamo, se ejecutará previa aprobación y autorización del Ingeniero Inspector o Supervisor de la actividad, quien verificará la calidad del material a utilizar. La longitud total del levantamiento de rasante es de 2,612.36 metros, se construirá taludes de protección para el material de préstamo en el relleno, utilizando bolsas tipo Big Bag en ambos lados de la vía, rellenos con una mezcla cemento arena en una proporción c:a 1:10.

Los trabajos a ejecutarse se resumen en:

Item	DESCRIPCIÓN	Und.	Metrado
01	MEJORAMIENTO DE LAS CA. Y PSJ. DEL AA.HH PILAR NORES DE GARCIA		
01.01	OBRAS PROVISIONALES		
01.01.01	CARTEL DE OBRA DE 3.60m x 5.80m, TIPO GIGANTOGRAFIA inc. COLOCACION	und	1.00
01.01.02	ALQUILER DE ALMACEN	mes	8.00
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.02.01	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO (con teodolito y nivel) Inicio y Final	m2	17,717.82
01.03	SEGURIDAD Y SALUD		
01.03.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	und	1.00
01.03.02	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)	und	1.00
01.03.03	EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA (EPC)	und	1.00
01.04	CORTE DE TERRENO		
01.04.01	CORTE DE TERRENO CON RETROEXCAVADORA	m3	10,369.68
01.05	RELLENOS		
01.05.01	RELLENO CON MATERIAL A-3	m3	25,688.57
01.05.02	RELLENO CON MATERIAL A-2-4	m3	3,396.07
01.06	TALUD P/PROTECCION DE RELLENO		

MARLOND CARLOS ESPINOZA SANCHEZ SILVA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 225414



01.06.01	BOLSACRETO C:A 1:10	m3	337.81
01.06.02	BIG BAG MEZCLA 1:10	m3	22,317.12
01.06.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BIG BAG	m2	21,883.96
01.07	ALCANTARILLA DE CRUCE		
01.07.01	ALCANTARILLA TMC D= 60"	m	132.00
01.07.02	ALCANTARILLA TMC D=24"	m	108.00
01.08	VARIOS		
01.08.01	TUBO DE PVC 4" PARA DESAGUE	m	265.00
01.08.02	TUBERIA PVC SAP Ø 1/2"	m	678.00
01.08.03	CODO PVC-SAP 1/2" x 90°	und	160.00
01.08.04	TEE PVC-SAP 1/2"	und	160.00

2.8.3. ADQUISICION DE MATERIALES

Los materiales serán adquiridos por la Oficina Regional de Administración a través de la oficina ejecutiva de Logística los mismos que serán ingresados al almacén central de la entidad, previa verificación de precios y calidad del producto, de acuerdo a las especificaciones técnicas y presupuesto solicitado por el responsable del área usuaria.

2.8.4. VALOR REFERENCIAL

El Proyecto ha sido presupuestada en **S/ 6,908,539.38 (SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 38/100 SOLES)**, con precios referidos al mes de Agosto – 2019.

COSTO DIRECTO	S/ 5,500,994.37
GASTOS ADMINISTRATIVOS 6.429747 %	S/ 353,700.00
	=====
SUB TOTAL	S/ 5,854,694.39
IGV (18.00 %)	S/ 1,053,844.99
	=====
PRESUPUESTO TOTAL	S/ 6,908,539.38

MARLON CARLOS GONZALEZ SILVA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 225414



2.8.5. MODALIDAD DE EJECUCION.

Será ejecutada por la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa

2.8.6. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución será de Doscientos Cuarenta (240) días calendario.

MARLOND CARLOS PROQUELINO SILVA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 225414



3.0. DEL AVANCE DE OBRA

3.1. DESCRIPCION

En el presente periodo se ha continuado con el alquiler de almacén, se realizaron las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo, se continuo con las actividades de entrega de equipos de protección personal, y equipos de protección colectiva, asimismo se continuo con la administración del plan de seguridad y salud en el trabajo, se continuo con los trabajos de trazo nivel y replanteo, se realizó los trabajos de corte de terreno con retroexcavadora en las progresivas trazadas, se realizaron trabajos de relleno con material A-3, se continuo con los trabajo de relleno con material A-2-4, se realizó los trabajos de encofrado para BIGBAG, se realizó el vacceo de mortero C:A(1:10) en BIGBAG.

3.2. METRADOS EJECUTADOS EN EL PERIODO

Los Metrados ejecutados en el presente periodo se detallan a continuación

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		AVANCE			SALDO
		Und.	Metrado	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
				Metrado	Metrado	Metrado	Metrado
01	MEJORAMIENTO DE LAS CA. Y PSJ. DEL AA.HH PILAR NORES DE GARCIA						
01.01	OBRAS PROVISIONALES						
01.01.01	CARTEL DE OBRA DE 3.60m x 5.80m, TIPO GIGANTOGRAFIA inc. COLOCACION	und	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
01.01.02	ALQUILER DE ALMACEN	mes	8.00	4.00	1.00	5.00	3.00
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES						
01.02.01	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO (con teodolito y nivel) Inicio y Final	m2	17,717.82	15,969.04	1,748.78	17,717.82	0.00
01.03	SEGURIDAD Y SALUD						
01.03.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	und	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
01.03.02	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)	und	1.00	0.41	0.11	0.52	0.48
01.03.03	EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA (EPC)	und	1.00	0.69	0.09	0.78	0.22
01.04	CORTE DE TERRENO					0.00	0.00
01.04.01	CORTE DE TERRENO CON RETROEXCAVADORA	m3	10,369.68	6,000.00		6,000.00	4,369.68
01.05	RELLENOS						
01.05.01	RELLENO CON MATERIAL A-3	m3	25,688.57	3,063.25	890.00	3,953.25	21,735.32
01.05.02	RELLENO CON MATERIAL A-2-4	m3	3,396.07	2,870.35	100.00	2,970.35	425.72
01.06	TALUD P/PROTECCION DE RELLENO					0.00	0.00
01.06.01	BOLSACRETO C:A 1:10	m3	337.81	0.00	0.00	0.00	337.81
01.06.02	BIG BAG MEZCLA 1:10	m3	22,317.12	4,597.30	650.00	5,247.30	17,069.82
01.07	ALCANTARILLA DE CRUCE						
01.07.01	ALCANTARILLA TMC D= 60"	m	132.00	0.00	0.00	0.00	132.00
01.07.02	ALCANTARILLA TMC D=24"	m	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00
01.08	VARIOS						
01.08.01	TUBO DE PVC 4" PARA DESAGUE	m	265.00	0.00	0.00	0.00	265.00
01.08.02	TUBERIA PVC SAP Ø 1/2"	m	678.00	0.00	0.00	0.00	678.00
01.08.03	CODO PVC-SAP 1/2" x 90°	und	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00
01.08.04	TEE PVC-SAP 1/2"	und	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00



3.7. CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

En este mes de octubre se verificaron la calidad de materiales utilizados en el proyecto.

3.8. DEL CONTROL ECONOMICO DE LA OBRA

3.8.1. CONTROL DE VALORIZACIONES

La Valorizaciones tienen la siguiente estructura:

Valorización N° 05 FEBRERO - 2020.

Costo Directo	S/.	162,466.189
Gastos Administrativos	S/.	10,446.16
<hr/>		
Total Monto valorizado (b)	S/.	172,912.35
Monto de inversion s/IGV	S/.	5,845,694.39
Saldo del M. I. mes de octubre	S/.	5,798,147.92
Saldo del M. I. mês de noviembre	S/.	5,601,302.54
Saldo del M. I. mês de diciembre	S/.	4,898,613.30
Saldo del M. I. mês de enero (a)	S/.	4,898,613.30
Saldo del M. I. mês de febrero (a-b)	S/.	4,725,700.95

3.8.2. CAMBIOS Y/O MODIFICACIONES AL PROYECTO ORIGINAL

No se han realizado cambios ni modificaciones al Proyecto Original.

3.9. ASPECTO ADMINISTRATIVO

- ✓ Se ha dado charlas diarias a todo el personal, capacitación en seguridad en obra, charlas informativas de acuerdo con el horario de los pobladores.
- ✓ El Personal técnico administrativo ha cumplido con eficiencia sus funciones recibiendo charlas de Capacitación permanentemente de acuerdo al plan de Trabajo

MARLOND CARLOS CHAVEZ SILVA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 225414



el personal le corresponde el pago por la **quinta Armada** de acuerdo a la orden de servicio de cada uno.

- ✓ La ejecución en el mes de febrero tiene un avance acumulado del 23.45 %, la situación actual se encuentra en Ejecución - Atrasado, esto debido que se ha considerado el tiempo de adquisición de materiales dentro del tiempo de ejecución en el mes de noviembre y que afectara la programación de avance de obra en los siguientes meses.

Durante el presente mes (febrero) el Residente se ha dedicado en mayor proporción a realizar los siguientes trabajos como son:

- ✓ Llenado del cuaderno de obra, coordinaciones permanentes con la Sub Gerencia de Obra, Inspector.
- ✓ El Residente pone de conocimiento al Inspector todos los trabajos realizados y asentados en el cuaderno de obra.
- ✓ Solicito la aprobación de la Valorización mensual de avance de obra del mes de enero.

Es cuanto informo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

Atentamente,

MARLON CARLOS...
INGENIERO CIVIL
Reg. C.P. N° 225414

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 05

OBRA: IOARR NO PIP CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO, EN EL (LA) VÍAS DE ACCESO DEL AAHH PILAR NORES DE GARCÍA EN LA LOCALIDAD DE PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 RESIDENTE: MARLON CARLOS CHUQUILLANQUI SILVA
 INSPECTOR: DIANA PAOLA CASTRO LITANO
 UBICACIÓN: PUNCHANA - MAYNAS - LORETO
 FECHA: FEBRERO DEL 2020

PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS CALENDARIOS
 PRESUPUESTO CONTRATADO: 5,854,694.39 SIN IGV
 PRESUPUESTO REAL CONTRATADO: 5,854,694.39

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				AVANCE				SALDO			
		Und.	Meitrado	P. Unil.	Presup.	ANTERIOR		ACTUAL		Meitrado	%		
						Meitrado	Valorizado S/.	Meitrado	Valorizado S/.				
01	MEJORAMIENTO DE LAS CA. Y PSJ. DEL AAHH PILAR NORES DE GARCIA												
01.01	OBRAS PROVISIONALES												
01.01.01	CARTEL DE OBRA DE 3.60m x 5.80m, TIPO GIGANTOGRAFIA Inc. COLOCACION	und	1.00	844.14	844.14	1.00	844.14	0.00	0.00	1.00	100.00%	0.00	0.00%
01.01.02	ALQUILER DE ALMACEN	mes	8.00	500.00	4,000.00	4.00	2,000.00	1.00	500.00	5.00	62.50%	1,500.00	37.50%
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES												
01.02.01	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO (con teodolito y nivel) Inicio y Final	m2	17,717.62	0.38	6,732.77	15,969.04	6,068.24	1,748.78	664.54	17,717.82	100.00%	0.00	0.00%
01.03	SEGURIDAD Y SALUD												
01.03.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	und	1.00	2,500.00	2,500.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	100.00%	0.00	0.00%
01.03.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)	und	1.00	3,985.00	3,985.00	0.41	1,633.95	0.11	438.35	0.52	52.00%	1,912.80	48.00%
01.03.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA (EPC)	und	1.00	240.00	240.00	0.69	165.60	0.09	21.60	0.78	78.00%	52.80	22.00%
01.04	CORTE DE TERRENO												
01.04.01	CORTE DE TERRENO CON RETROEXCAVADORA	m3	10,369.68	3.00	31,109.04	6,000.00	18,000.00	0.00	0.00	6,000.00	57.86%	4,369.68	42.14%
01.05	RELLENOS												
01.05.01	RELLENO CON MATERIAL A-3	m3	25,888.57	38.73	994,918.32	3,063.25	118,639.67	890.00	34,469.70	3,953.25	15.39%	21,735.32	84.61%
01.05.02	RELLENO CON MATERIAL A-2-4	m3	3,396.07	38.73	131,529.79	2,870.35	111,168.66	100.00	3,873.00	2,970.35	87.46%	16,488.14	12.54%
01.06	TALUD PROTECCION DE RELLENO												
01.06.01	BOLSACRETO C.A 1:10	m3	337.81	161.43	54,532.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	337.81	100.00%
01.06.02	BIG BAG MEZCLA 1:10	m3	22,317.12	188.46	4,205,884.44	4,597.30	866,407.16	650.00	122,499.00	5,247.30	23.51%	17,069.82	76.49%
01.07	ALCANTARILLA DE CRUCE												
01.07.01	ALCANTARILLA TMC D= 60"	m	132.00	288.49	38,080.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	132.00	100.00%
01.07.02	ALCANTARILLA TMC D=24"	m	108.00	89.92	9,711.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	108.00	100.00%
01.08	VIARIOS												
01.08.01	TUBO DE PVC 4" PARA DESAGUE	m	265.00	17.10	4,531.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	265.00	100.00%
01.08.02	TUBERIA PVC SAP Ø 1/2"	m	678.00	12.07	8,183.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	678.00	100.00%
01.08.03	CODO PVC-SAP 1/2" x 90°	und	160.00	13.01	2,081.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	160.00	100.00%
01.08.04	TEE PVC-SAP 1/2"	und	160.00	13.31	2,129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	160.00	100.00%
		COSTO DIRECTO (CD)					1,127,427.32		162,466.19		1,289,893.50		4,211,100.87
		GASTOS ADMINISTRATIVOS 6.429747							10,446.16		82,936.89		270,763.13
		SUB TOTAL							172,912.35		1,372,830.39		4,481,864.00
		TOTAL DEL PRESUPUESTO							172,912.35		1,372,830.39		4,481,864.00
		PORCENTAJE					100.00%		2.95%		23.45%		76.55%

MARLON CARLOS CHUQUILLANQUI SILVA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 225414



PANEL FOTOGRAFICO

FOTO N° 01
AA. HH PILAR NORES DE GARCIA



Vista panorámica: donde se observa la capacitación en seguridad y salud en el trabajo

FOTO N° 02
AA. HH PILAR NORES DE GARCIA



Vista panorámica: donde se observa el abastecimiento de cemento y BIGBAG en el almacén del proyecto.

MARLOND CARLOS GARCIA SILVA
INGENIERO CIVIL
N° 225414



FOTO N° 03
AA. HH PILAR NORES DE GARCIA



Vista panorámica: donde se observa los trabajos con retroexcavadora

FOTO N° 04
AA. HH PILAR NORES DE GARCIA
Vista panorámica



Vista panorámica: donde se observa el abastecimiento de material A-3

MARLONO CARLOS CHAVEZ MARCON SILVA
INGENIERO CIVIL
Reg. C. O. N.º 225414

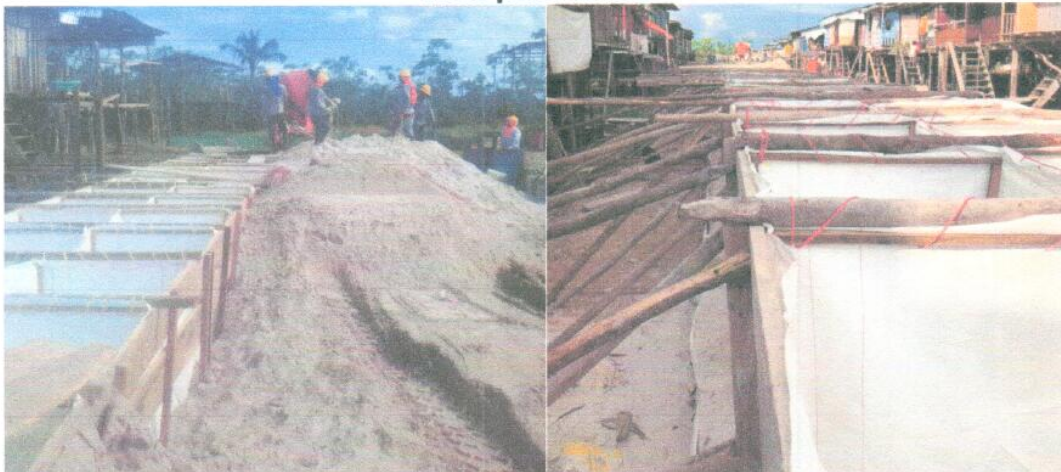


FOTO N° 05
AA. HH PILAR NORES DE GARCIA



Vista panorámica: donde se observa el abastecimiento de material A-2-4

FOTO N° 06
AA. HH PILAR NORES DE GARCIA
Vista panorámica




Vista panorámica: donde se observa el armado de encofrado para BIGBAG.

MARLOND CARLOS CHUZILARRAN SIUVA
INGENIERO CIVIL
REG. PROF. N° 225414



FOTO N° 07
AA. HH PILAR NORES DE GARCIA
Vista panorámica

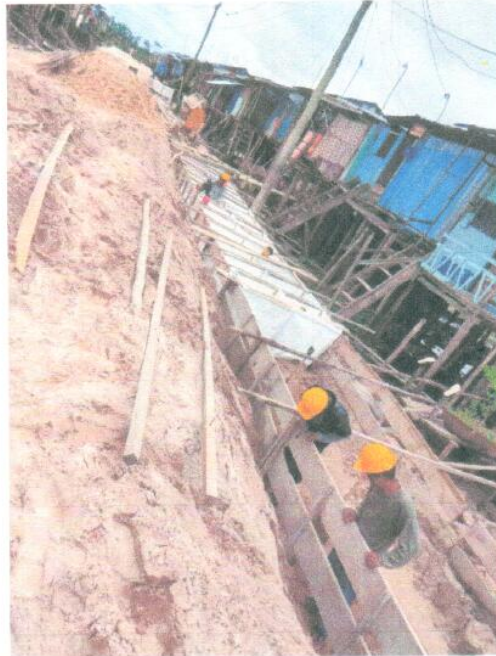

Vista panorámica: donde se observa el armado de encofrado para BIGBAG.

FOTO N° 08
AA. HH PILAR NORES DE GARCIA
Vista panorámica



Vista panorámica: donde se observa vaceo de mortero en BIGBAG.



FOTO N° 09
AA. HH PILAR NORES DE GARCIA



Vista panorámica: donde se observa vaceo de mortero en BIGBAG

MARLON CARLOS CHUQUI...
... CIVIL
... 225414



VALORIZACION

N.º 6

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
SUB GERENCIA DE OBRAS
Fecha: 06 JUL 2020
Hora:
N° REG:

LORETO
GOBIERNO REGIONAL
compromiso con TODOS



SUB GERENCIA DE
SUPERVISION Y
CONTROL

"Año de la Lucha contra la corrupción y la Impunidad"

INFORME N° 25 - 2020-GRL/GRI/SGS Y C /DPCL

Al : Luis Alberto Ramírez Panduro
Sub gerente de obras

Del : ING. Diana Paola Castro Litano
Inspector de obra

Asunto : Conformidad a la Valorización N° 06

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Sub Gerencia de Supervisión y Control
06 JUL 2020
Fecha:
Hora:
N° Reg:

Obra : "IOARR NO PIP: "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO; EN EL (LA) VIAS DE ACCESO DEL AA.HH. PILAR NORES DE GARCIA EN LA LOCALIDAD DE PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO

Ref. : a. CARTA N° 010-2020/SGO-AHPA

FECHA : de 06 julio del 2020

Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo y a la vez hacerle llegar el informe de conformidad de la valorización N° 06 de la **IOARRS NO PIP** "IOARR NO PIP: "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO; EN EL (LA) VIAS DE ACCESO DEL AA.HH. PILAR NORES DE GARCIA EN LA LOCALIDAD DE PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO, correspondiente al mes de marzo del 2020, presentado por el ingeniero, Marlon Carlos Chuquillanqui Silva, mediante la referencia (a), el mismo que ha sido verificado en obra, cumpliéndose con los lineamientos y requerimientos establecidos para el trámite.

1. GENERALIDADES

OBRA : CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO; EN EL (LA) VIAS DE ACCESO DEL AA.HH. PILAR NORES DE GARCIA EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO"

UBICACIÓN : "DEL AA.HH. PILAR NORES DE GARCIA EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO"

EJECUTA : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
VALOR REFERENCIAL CON IGV : S/ 6,908,539.38
MONTO REFERENCIAL CON GA-IGV : S/ 3,517,230.25
FECHA DEL PRESUPUESTO : agosto 2019
PLAZO DE EJECUCION : 240 días calendarios
ENTREGA DE TERRENO : 12 DE OCTUBRE DEL 2019



“Año de la Lucha contra la corrupción y la Impunidad”

INICIO DE OBRA	:	21 de octubre	
FECHA DE TERMINO DE PLAZO DE EJEC.	:	16 de junio 2020	
AVANCE DE OBRA DEL MES	:	programado	: 29.76 %
		Real	: 2.34 %
AVANCE FISICO ACUM. EJECUTADO	:	25.79 %	(15/03/2020)
AVANCE PROGRAMADIO ACUM.	:	53.62 %	(15/0232020)
Residente	:	ING. Marlon Carlos Chuquillanqui Silva	
Inspector	:	ING. Diana Paola castro litano	

2. CONTENIDO DE LA DOCUMENTACION

CONTENIDO
INFORME DEL RESIDENTE
COPIA DE AUTORIZACIÓN DE INTERVENCIÓN DE VÍAS
VALORIZACIÓN DEL MES
RESUMEN DE LA VALORIZACIÓN
HOJA DE LIQUIDACIÓN
PLANILLA DE METRADOS JUSTIFICADOS
CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA
CUADRO COMPARATIVA D LO PROGRAMADO VS LO EJECUTADO
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
ACTA DE ENTREGA DEL TERRENO
ORDEN DE SERVICIO DEL RESIDENTE
ORDENES DE SERVICIO PERSONAL ADMINISTRATIVO
CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL ADMINISTRATIVO
CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL OBRERO
CONTROL DE ALMACÉN
PANEL FOTOGRÁFICO
CUADERNO DE OBRA

3. ANTECEDENTES

Mediante resolución gerencial regional n° 088-2019-GRL-GRI, con fecha 13 de agosto del 2019 es aprobado el saldo del Expediente Técnico del IOARR NO PIP de la obra antes mencionada con un presupuesto ascendente a s/ 5' 854,694.39 sin IGV, con precios vigentes al mes de agosto del 2019, con un plazo de ejecución de 240 días calendarios, obra que se ejecuta mediante ejecución presupuestaria directa –Administración directa obra encargada por la sub gerencia de obra

Con orden de servicio n° 0002888 del 10 de octubre del 2019 es contratado los servicios del ing. Marlon Carlos Chuquillanqui Silva, como responsable de la obra

Mediante memorando N° 052- 2019-GRL-GRI-FGSYC, de fecha, 02 de noviembre del 2019 se designa como inspector al Ingeniero Allan Guilianno Ramírez Sangama, como Inspector.

Mediante carta 001-2020- GRI/AGRS de fecha 03 de enero 2020, el ingeniero Allan Guilianno Ramírez Sangama, presenta su renuncia como Inspector.



“Año de la Lucha contra la corrupción y la Impunidad”

con carta N° 004-2020-SGO/AHPA el residente de obra presenta la valorización N° 04 correspondiente al mes de febrero -2020, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un monto bruto de S/. 172,912.35 soles, de manera que se presenta para el control correspondiente, con la siguiente documentación

Mediante Decreto Supremo N° 094-2020-PCM se prorrogó el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, N° 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM y N° 072-2020-PCM, y prorrogado mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM y N° 083-2020-PCM hasta el martes 30 de junio del 2020 disponiéndose el aislamiento social obligatorio por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19.

Mediante Decreto Legislativo N° 1486 se establecen las disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de las inversiones públicas

Mediante la Directiva N°005-2020-OSCE/CD se establecen los alcances y disposiciones para la reactivación de obras públicas y contratos de supervisión, en el marco de la segunda disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo N° 1486.

Mediante Decreto Supremo N°101-2020-PCM del 04/06/2020 se aprueba la Fase 2 de la Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, y modifica el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM

4. EVALUACION DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTAD

visto las copias del cuaderno de obra, el ingeniero residente conjuntamente con el inspector de obra, en la que se consigna, cuantifica y aprueba los trabajos ejecutados para la valorización de obra n° 05 correspondiente al mes de febrero del 2020, las cuales son aprobadas por el inspector de obra y plasmadas en la documentación tramitada indicando a su vez que luego de efectuada la revisión al procedimiento de cálculo de los montos consignados en la valorización n° 06 de la referida obra, se ha podido determinar que se ajustan a los procedimientos que rigen el cálculo de las valorizaciones de obras públicas, en concordancia con la documentación sustentadora presentada.

El Decreto Supremo N°101-2020-PCM publicado el 04/06/2020 dispone la reactivación de obras públicas y sus respectivos contratos de supervisión contratadas conforme al régimen general de contrataciones del Estado, paralizadas por la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional producida por el COVID-19, y por tanto el inicio del cómputo del plazo establecido en el literal a) de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1486, que establece disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de las inversiones públicas.

Se solicita por medio de la sub gerencia de obras presentar presentar, los documentos indicados en el literal a) de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1486, los mismos que a continuación se detallan:



“Año de la Lucha contra la corrupción y la Impunidad”

- Cuantificación de la ampliación de plazo contractual, basada en la ruta crítica.
- Nuevo cronograma de ejecución, que incluye la fecha de inicio o reinicio del plazo de ejecución, según corresponda.
- Programa de ejecución de obra (CPM).
- Calendario de avance de obra actualizado.
- Nuevo calendario de adquisición de materiales y de utilización de equipos, teniendo en cuenta las medidas del sector competente.
- **Plan de seguridad y salud para los trabajadores actualizado.**

5. CONCLUSIONES

La valorización de obra N° 06 del mes de marzo - 2020, cuenta con la documentación correspondiente.

El suscrito en calidad de inspector verifico que la documentación presentada se encuentra conforme debido a que se verifico que los metrados descritos en el cuaderno de obra son compatible con la valorización de obra n° 06 del mes de marzo 2020

Se verifico que la obra al mes de marzo del 2020, cuenta con un avance real acumulado ejecutado de 25.79 % y un programado de 53.62 %, encontrándose la obra atrasada, debido a que en el mes de marzo solo se trabajó 15 días. El suscrito realizo la revisión de la documentación presentada en la valorización, correspondiente, por lo cual el suscrito otorga la conformidad a la valorización mencionada

Se solicita por medio de la sub gerencia de obras presentar presentar, los documentos indicados en el literal a) de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1486.

Se solicita emitir un informe situacional del estado del proyecto.

6. RECOMENDACIONES

Se recomienda remitir al proyectista su pronunciamiento respecto al rendimiento con la mano de obras establecido en el análisis de los costos unitarios, a través de la sub gerencia de estudios y proyectos, por lo que se sugiere la modificación de los análisis de costos unitarios con respecto a los rendimiento establecidos en el expediente técnico aprobado.

De acuerdo al análisis in situ de obra se puede apreciar que el plazo es insuficiente
Se recomienda al residente implementar su logística a fin de tener un correcto seguimiento de los plazos de cancelación de los servicios y evitar así inconvenientes con retraso de abastecimiento de las maquinarias materiales, y con el pago del personal.



“Año de la Lucha contra la corrupción y la Impunidad”

Se recomienda, disponer las actividades en todos los frentes disponibles a fin de incrementar los avances correspondientes a los siguientes meses y así no se vea afectada la continuidad programada de los trabajos y la ruta crítica, se tiene una valorización por un monto de s/. 136,941.34 soles por la ejecución de la obra; por, lo que el suscrito encuentra conforme la documentación presentada en la presente valorización

Es cuanto informo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

Atentamente,

INGENIERO CIVIL

DIANA PAOLA CASTRO LITANO
CIP. 182223

LORETO

GOBIERNO REGIONAL

Sub Gerencia de Obras
Compromiso con Todos
DE INFRAESTRUCTURA
Supervisión y Control



AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD

01 JUL 2020

Fecha: _____ Hora: _____

N° Reg: _____

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
SUB GERENCIA DE OBRAS

Iquitos 01 julio del 2020

01 JUL 2020

Fecha: _____ Hora: _____

N° REG: _____

CARTA N°012-2020-SGO-MCCHS

SEÑOR : Ing. LUIS ALBERTO RAMÍREZ PANDURO
Sub Gerente de Obras – GRI

REFERENCIA: IOARR NO PIP: "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO; EN EL (LA) VIAS DE ACCESO DEL AA.HH. PILAR NORES DE GARCIA EN LA LOCALIDAD DE PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO".

ASUNTO : VALORIZACION N° 06 – MES DE MARZO DEL 2020.

Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo y a la vez remitir a su despacho la **VALORIZACIÓN N°06**, correspondiente al mes de **MARZO 2020** del Proyecto: IOARR NO PIP: "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO; EN EL (LA) VIAS DE ACCESO DEL AA.HH. PILAR NORES DE GARCIA EN LA LOCALIDAD DE PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO", elaborado por el suscrito.

Es cuanto cumplo en remitir a su despacho para conocimiento y fines que se sirva determinar.

Atentamente,


MARLON CARLOS CHUCULPA SILVA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 225414

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 06

OBRA: JOARR NO PIP CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO, EN EL (LA) VÍAS DE ACCESO DEL AAHH PILAR NORES DE GARCÍA EN LA LOCALIDAD DE PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE Loreto.
 ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 RESIDENTE: MARLON CARLOS CHUQUILLANQUI SILVA
 INSPECTOR: DIANA PAOLA CASTRO LITANO
 UBICACIÓN: PUNCHANA - MAYNAS - LORETO
 FECHA: Marzo-20

PLAZO DE EJECUCION: 240 DIAS CALENDARIOS
 PRESUPUESTO CONTRATADO: 5,854,694.39 SIN IGV
 PRESUPUESTO REAL CONTRATADO: 5,854,694.39

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			ANTERIOR		ACTUAL		AVANCE		ACUMULADO		SALDO		
		Und.	Metrado	P. Unil.	Presup.	Metrado	Valorizado S/.	Metrado	Valorizado S/.	Metrado	Valorizado S/.	Metrado	Valorizado S/.	Metrado	Valorizado S/.
01	MEJORAMIENTO DE LAS CA. Y PSJ. DEL AA.HH PILAR NORES DE GARCIA														
01.01	OBRAS PROVISIONALES														
01.01.01	CARTEL DE OBRA DE 3.60m x 5.80m, TIPO GIGANTOGRAFIA Inc. COLOCACION	und	1.00	844.14	844.14	1.00	844.14	0.00	0.00	1.00	844.14	100.00%	0.00	0.00%	
01.01.02	ALQUILER DE ALMACEN	mes	8.00	500.00	4,000.00	5.00	2,500.00	1.00	500.00	6.00	3,000.00	75.00%	2.00	1,000.00	25.00%
01.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES														
01.02.01	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO (con teodolito y nivel) Inicio y Final	m2	17,717.82	0.38	6,732.77	17,717.82	6,732.77	0.00	0.00	17,717.82	6,732.77	100.00%	0.00	0.00%	
01.03	SEGURIDAD Y SALUD														
01.03.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	und	1.00	2,500.00	2,500.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	100.00%	0.00	0.00%	
01.03.02	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)	und	1.00	3,985.00	3,985.00	0.52	2,072.20	0.11	438.35	0.63	2,510.55	63.00%	0.37	1,474.45	37.00%
01.03.03	EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA (EPC)	und	1.00	240.00	240.00	0.78	187.20	0.09	21.60	0.87	208.80	87.00%	0.13	31.20	13.00%
01.04	CORTE DE TERRENO														
01.04.01	CORTE DE TERRENO CON RETROEXCAVADORA	m3	10,369.68	3.00	31,109.04	6,000.00	18,000.00	0.00	0.00	6,000.00	18,000.00	57.86%	4,369.68	13,109.04	42.14%
01.05	RELLENOS														
01.05.01	RELLENO CON MATERIAL A-3	m3	25,698.57	38.73	994,918.32	3,953.25	153,109.37	790.00	30,596.70	4,743.25	183,705.07	18.46%	20,945.32	811,212.24	81.54%
01.05.02	RELLENO CON MATERIAL A-2-4	m3	3,396.07	38.73	131,529.79	2,970.35	115,041.66	0.00	0.00	2,970.35	115,041.66	87.46%	425.72	15,488.14	12.54%
01.06	TALUD P/PROTECCION DE RELLENO														
01.06.01	BOLSACRETO C/A 1:10	m3	337.81	161.43	54,532.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	337.81	54,532.67	100.00%
01.06.02	BIG BAG MEZCLA 1:10	m3	22,317.12	188.46	4,205,884.44	5,247.30	988,906.16	515.29	97,111.55	5,762.59	1,086,017.71	25.82%	16,554.53	3,119,866.72	74.18%
01.07	ALCANTARILLA DE CRUCE														
01.07.01	ALCANTARILLA TMC D= 60"	m	132.00	288.49	38,080.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	132.00	38,080.68	100.00%
01.07.02	ALCANTARILLA TMC D=24"	m	108.00	89.92	9,711.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	108.00	9,711.36	100.00%
01.08	VARIOS														
01.08.01	TUBO DE PVC 4" PARA DESAGUE	m	265.00	17.10	4,531.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	265.00	4,531.50	100.00%
01.08.02	TUBERIA PVC SAP Ø 12"	m	678.00	12.07	8,183.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	678.00	8,183.46	100.00%
01.08.03	CODO PVC-SAP 1/2" x 90°	und	160.00	13.01	2,081.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	160.00	2,081.60	100.00%
01.08.04	TEE PVC-SAP 1/2"	und	160.00	13.31	2,129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	160.00	2,129.60	100.00%
COSTO DIRECTO (CD)					5,500,994.37		1,289,893.50		125,668.20		1,416,561.70			4,082,432.66	
GASTOS ADMINISTRATIVOS 6.429747					353,700.02		82,936.89		8,273.04		91,209.93			262,490.09	
SUB TOTAL					5,854,694.39		1,372,830.39		136,941.24		1,508,771.63			4,344,922.75	
TOTAL DEL PRESUPUESTO					5,854,694.39		1,372,830.39		136,941.24		1,508,771.63			4,344,922.75	
PORCENTAJE					100.00%		23.45%		2.34%		25.79%			74.21%	

INGENIERO CIVIL
 REG. CIP. N° 225414



PANEL FOTOGRAFICO

FOTO N° 01
AA. HH PILAR NORES DE GARCIA



Vista panorámica: donde se observa la capacitación en seguridad y salud en el trabajo

FOTO N° 02
AA. HH PILAR NORES DE GARCIA



Vista panorámica: donde se observa el abastecimiento de cemento y BIGBAG en el almacén del proyecto.

MARLOND CARLOS C. SILVA
CIVIL
Reg. C.O. N° 225414

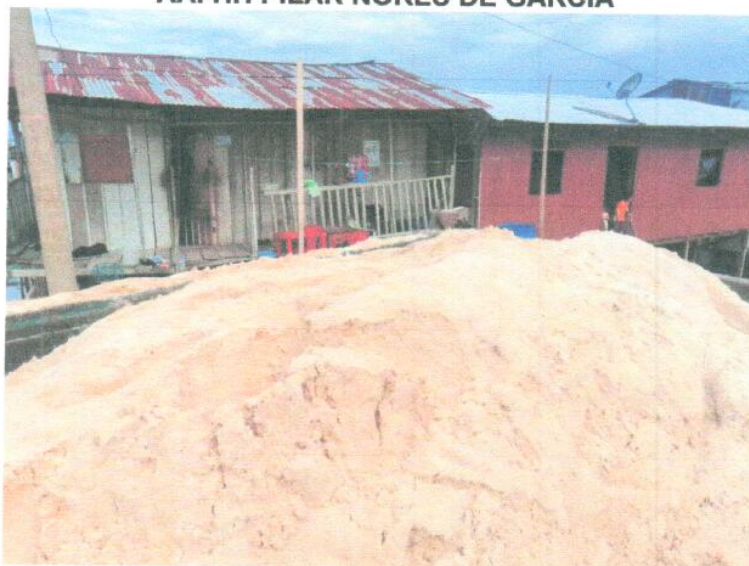


FOTO N° 03
AA. HH PILAR NORES DE GARCIA



Vista panorámica: donde se observa los trabajos con retroexcavadora

FOTO N° 04
AA. HH PILAR NORES DE GARCIA




Vista panorámica: donde se observa el abastecimiento de material A-3

MARLON CARLOS CHUCU... SILVA
INGENIERO CIVIL
N° 228414



FOTO N° 05
AA. HH PILAR NORES DE GARCIA

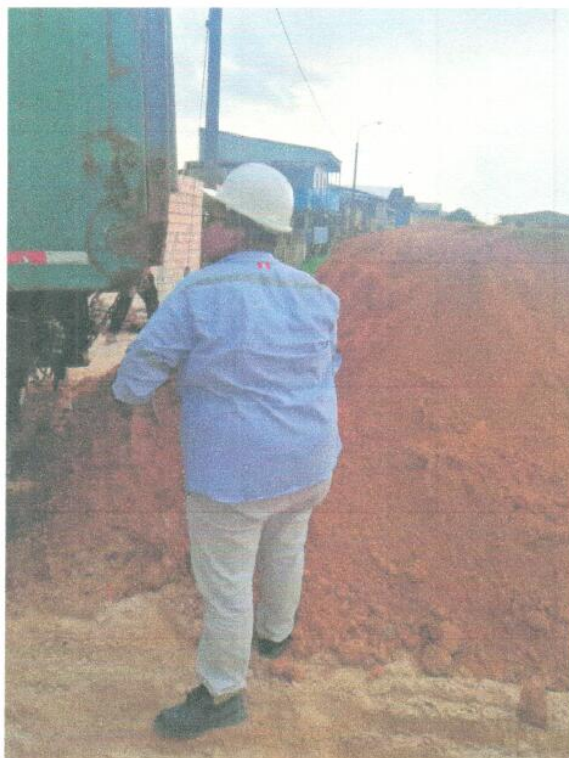

Vista panorámica: donde se observa el abastecimiento de material A-2-4


FOTO N° 06
AA. HH PILAR NORES DE GARCIA



Vista panorámica: donde se observa el armado de encofrado para BIGBAG.



FOTO N° 07
AA. HH PILAR NORES DE GARCIA
Vista panorámica

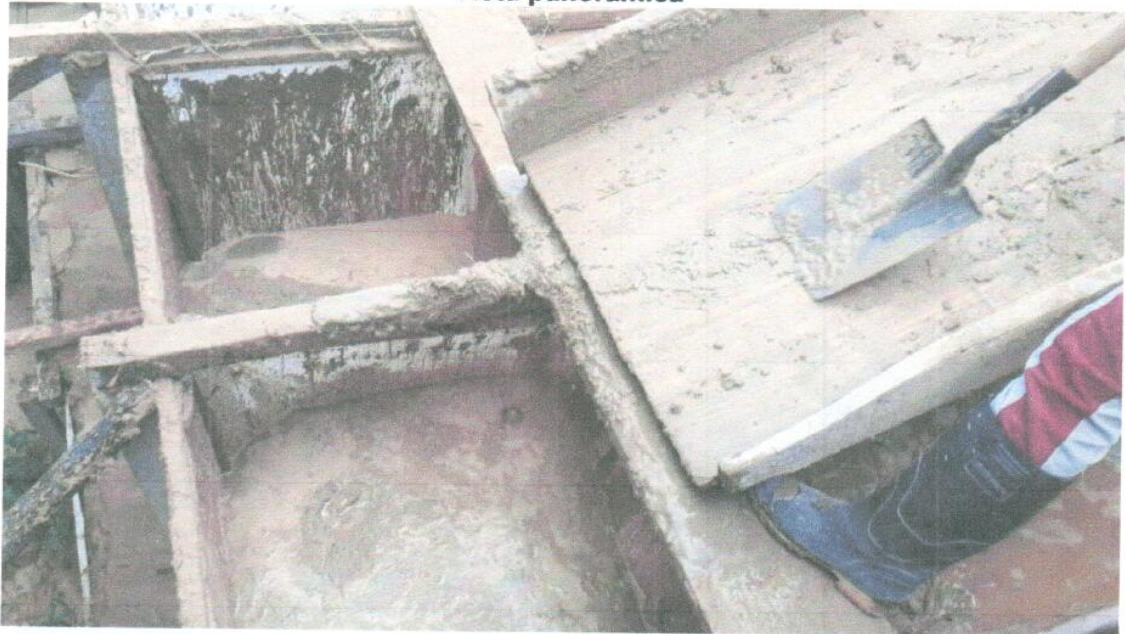

Vista panorámica: donde se observa vaceo de mortero en BIGBAG.

MARLOND CARLOS C. MOURA
INGENIERO CIVIL
Reg. N° 225414
