




VALORIZACION

N.º 3



CONSORCIO HOSPITALARIO
FERNANDO TORRES
Presidente
Presente Bedón
ON: 07038517

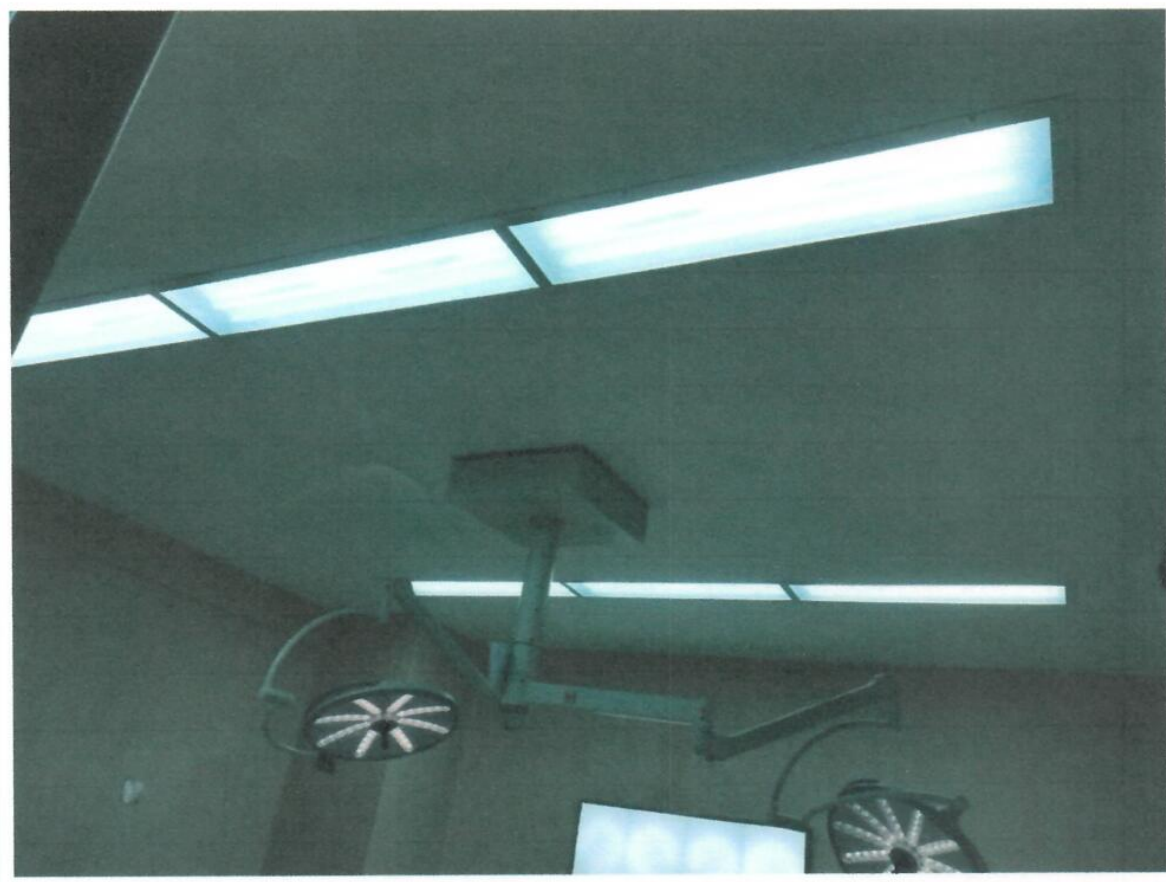

CONSORCIO HOSPITALARIO
[Signature]
Fernando X. Sanchez Bedón
Representante Común
DNI: 07038517







CONSORCIO HOSPITALARIO
Fernando M. Sánchez-Sedón
Representante Común
DNI: 07038517

LAVANDERIA





CONSORCIO HOSPITALARIO

Fernando M. Sanchez Bedón
Fernando M. Sanchez Bedón
Representante Común
DNI: 07038517






"Año de la Universalización de la Salud"

Belén, 10 de agosto de 2020

Oficio n.º 1030-2020-GRL-GRI-SGSyC

Ingeniero Edi Wisberto Ruiz Zárate
Gerente Regional de Infraestructura
Presente



Asunto: Conformidad de Valorización de Obra n° 03
Correspondiente a marzo de 2020.

Obra: "Remodelación de la Sala de Operaciones o Quirófano y Ambiente de Unidades Operativas, Renovación de Maquinas Lavadoras Tipo Lavandería, Reparación de Accesorios Para Esterilizador o Autoclave de Vapor, en el (LA) EE.SS. Hospital Regional de Loreto "Felipe Arriola Iglesias" - Punchana en la Localidad Punchana – Distrito de Punchana Provincia de Maynas – Departamento de Loreto."

Ref. : a. Informe n° 0080-2020-GRL/GRI/SGSyC/OLVB
b. Carta n° 23-2020-C.H.-F.S.B.

Tengo el agrado de saludarle, a su vez remitirle la documentación de la **Valorización n° 03 por ejecución de obra, correspondiente a marzo del 2020**, que asciende a la suma de **(S/. 414 587.31), Cuatrocientos catorce mil quinientos ochenta y siete con 31/100 soles**, dando su conformidad el Inspector de Obra mediante referencia a), incluido IGV, de acuerdo al siguiente detalle.

Valorización Bruta n° 03 – marzo 2020	S/. 351 345.18
Reajuste	S/. 0.00
Amortizaciones	S/. 0.00
Por adelanto directo	S/. 0.00
Por adelanto de materiales	S/. 0.00
IGV. 18.00%	S/. 63 242.13
Monto Neto a Pagar	S/. 414 587.31

Asimismo, la ejecución de la obra al mes de marzo del 2020, tiene un avance físico real acumulado de 100.00%, **encontrándose culminada.**

Por lo tanto, encontrándose conforme la documentación que sustenta el Inspector de Obra, se solicita continuar con el trámite respectivo a favor del **Consortio Hospitalario.**

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regional de Infraestructura

Ing. PAUL FLORES AQUEPUCHO
Sub Gerente de Supervisión y Control

Copia: Inspector de Obra: OLVB
SGSyC – File obra (01)
SGSyC – File correlativo (01)
SGSyC – File personal (01)
Trámite: 19706
RFA/dap.



INFORME N° 0080-2020-GRL-GRI-SGSyC/OLVB-VALORIZACION N° 03 MEJORAMIENTO HOSPITAL

Belén, 03 de Agosto del 2020.

Ing. Raúl FLORES AQUEPUCHO
Sub Gerente de Supervisión y Control.

Asunto

Conformidad Técnica – Pago de Valorización de Avance de Obra N° 03 Correspondiente al mes de Marzo de la Obra: "REMODELACION DE LA SALA DE OPERACIONES O QUIROFANO Y AMBIENTE DE UNIDADES OPERATIVAS; RENOVACION DE MAQUINAS LAVADORAS TIPO LAVANCERIA; REPARACION DE ACCESORIOS PARA ESTERILIZADOR O AUTOCLAVE DE VAPOR; EN EL (LA) EE.SS. HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE ARRIOLA IGLESIAS" – PUNCHANA EN LA LOCALIDAD PUNCHANA – DISTRITO DE PUNCHANA – PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO"

Contratista: CONSORCIO HOSPITALARIO

Referencia : Carta N° 23-2020-C.H.-F.S.B.

Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarle muy cordialmente, así mismo informarle que el Consorcio Hospitalario ha presentado la Valorización de Obra N° 03, que corresponde al mes de marzo 2020, a fin de determinar si cumple con los lineamientos y requerimientos establecidos para el trámite de pago, de acuerdo a lo siguiente:


GENERALIDADES:

UBICACIÓN	: PUNCHANA – MAYNAS – LORETO.
CONTRATISTA	: CONSORCIO HOSPITALARIO.
PROCESO DE SELECCION	: AS N° 020-2018-CS-GORELORETO.
CONTRATO DE OBRA	: CONTRATO N° 003-2019-GRL-ORA.
FIRMA DE CONTRATO	: 22 de enero del 2019.
VALOR REFERENCIAL	: S/. 931,347.30 Soles (con I.G.V.)
MONTO CONTRACTUAL	: S/. 931,000.00 Soles (con I.G.V.)
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA	: TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
ADELANTO DIRECTO	: S/. 93,100.00 no solicita
ADELANTO DE MATERIALES	: S/ 186,200.00 no solicita
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	: 22 de marzo del 2019
FECHA DE TERMINO DE OBRA	: 20 de abril del 2019
REPRESENTANTE LEGAL	: Señor Fernando SANCHEZ AVIDON.
RESIDENTE	: Ing. Francisco Noé SUAÑA LAZARO, C.I.P. N° 54492
INSPECTOR	: Ing. Orestes Lucio VARILLAS BOZA

ANTECEDENTES:

Con Carta N° 23-2020-C.H.-F.S.B., recepcionada con fecha 30/07/2020, el Consorcio Hospitalario presenta la Valorización de obra N° 03, correspondiente al mes de marzo - 2020, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, de manera que solicita su pago correspondiente, con la siguiente documentación como anexo:

PROVEEDOR N° 19406
 A: Supervisor
 PARA: Obra a CRT
Tramite
Correspondiente



Orestes Varillas Boza
 VOB





VALORIZACION DEL MES.

- Solicitud de Pago de Parte del Inspector de Obra
- Pago a Cuenta al Contratista
- Hoja de Resumen de Valorización
- Gráfico Comparativo de Avance de Físico Programado Vs. Avance Físico Ejecutado.
- Cálculo de Reintegro, Deducciones y Amortizaciones.
- Planilla Valorizada.
- Relación de Partidas y Metrados Ejecutados
- Copia de Fórmula Polinómica del Expediente Técnico
- Índices Unificados
 - Índice Unificado a la Fecha del Presupuesto Base
 - Índice Unificado a la Fecha de la Valorización
- Recursos utilizados en el Mes Valorizados
 - Relación del Personal Técnico y Administrativo
 - Relación del Personal Obrero
 - Relación de Materiales Utilizados
 - Relación de Maquinaria y Equipos
- Diseño de Mezcla de Concreto
- Ensayos de Compresión del Concreto
- Panel Fotográfico
- Copias de Asientos de Cuaderno de Obra
- Copias de Calendario Valorizado Vigente
- Informe de Seguridad

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

- Certificado de Habilidad del Residente
- Resolución que Aprueba el Expediente Técnico
- Comprobantes de Pago
 - Adelanto Directo
 - Adelanto de Materiales
- Pago de Tributos
 - Sencico
 - Essalud
 - SCTR
 - Conafoviser
- Copia de Carta Fianzas
 - Carta Fianza de Adelanto Directo
 - Carta Fianza de Adelanto de Materiales
 - Carta Fianza de Fiel Cumplimiento
- Copia de Acta de Entrega de Terreno
- Copia de Contrato de Ejecución de Obra
- Copia de Contrato de Consorcio

EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:

Visto las copias del Cuaderno de Obra, del Ingeniero Residente conjuntamente con el Inspector de obra, en la que se consigna, cuantifica y aprueba los trabajos ejecutados para la Valorización de Obra N° 03, correspondiente al mes de marzo- 2020, las cuales son aprobados y plasmados en la documentación tramitada indicando a su vez que luego de efectuada la revisión al procedimiento del cálculo de los montos consignados en la Valorización N° 03, de la obra de la referencia, se ha podido determinar que se ajustan a los procedimientos que rigen el cálculo de las valorizaciones de obras públicas, en concordancia con la documentación sustentadora presentada.

La presente Valorización se ha evaluado en campo de acuerdo a las normas legales y en concordancia con la documentación y cálculos adjuntos se ha encontrado procedente efectuar el pago con cargo al contrato, por lo que el monto neto asciende a la suma de CUATROCIENTOS CATORCE MIL QUINIETOS OCHENTISIETE y 31/100 Soles (S/. 414,587.31), con IGV, el cual es tramitada de acuerdo al siguiente detalle:






MONTO NETO A CANCELAR	
Valorizacion bruta N° 03 - marzo 2020	S/. 351,345.18
Reintegro contrato principal	S/. 0.00
Amortizacion de adelanto de directo	S/. 0.00
Amortizacion de adelanto de materiales	S/. 0.00
	S/. 351,345.18
Reajuste	
Reajuste de valorizacion	S/. 0.00
Regularizacion Reajuste	S/. 0.00
Deduccion	
Deduccion que no corresponde Adelanto directo	S/. 0.00
Deduccion que no corresponde Adelanto materiales	S/. 0.00
Garantia de fiel cumplimiento	S/. 0.00
Retencion Fondo de Garantia Fiel Cumplimiento	S/. 0.00
IGV 18,00%	S/. 63,242.13
Total neto a pagar a contratista	S/. 414,587.31

CONCLUSIONES:

La Valorización de Obra N° 03 del mes de marzo 2020, cuenta con la documentación sustentadora correspondiente a las Valorizaciones de obras tramitadas y Amortizaciones efectuadas hasta la fecha del 30 marzo, que el residente solicita la suspensión del plazo contractual de acuerdo al Artículo 153 del RLCE son:

PERIODO	PROGRAMADO			REAL EJECUTADO			ESTADO (adelantada / atrasada)
	PARCIAL	ACUMULADO	% ACUM	PARCIAL	ACUMULADO	% ACUM	
22-mar-19							
mar-19	197,900.22	197,900.22	25.08%	259,772.39	259,772.39	32.92%	ADELANTADA
abr-19	270,586.51	468,486.73	59.38%	177,865.48	437,637.87	55.47%	ATRASADA
mar-20	320,496.32	788,983.05	100.00%	351,345.18	788,983.05	100.00%	
TOTAL	788,983.05			788,983.05			

CURVA DE CONTROL DE AVANCE FÍSICO

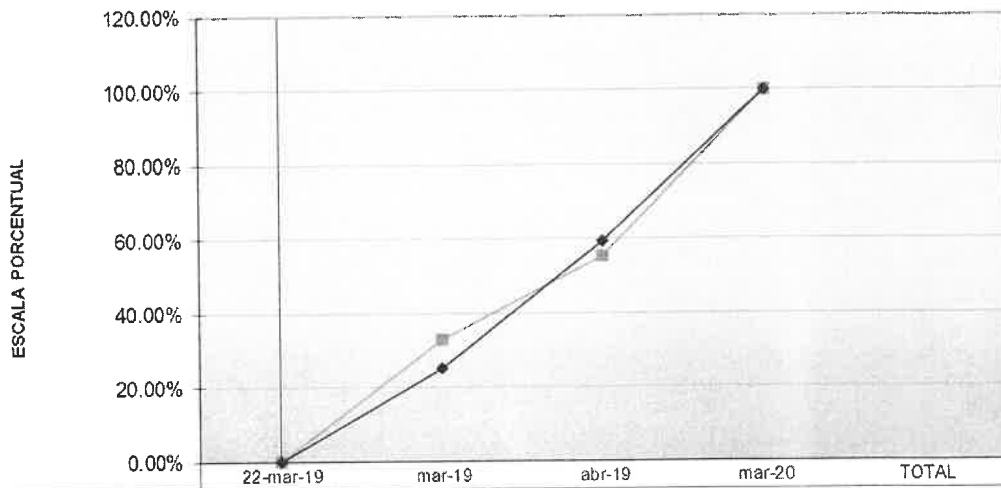

PERIODO	AVANCE REAL EJECUT	AVANCE PROGRAMADO
22-mar-19	0.00%	0.00%
mar-19	32.92%	25.08%
abr-19	55.47%	59.38%
mar-20	100.00%	100.00%
TOTAL	100.00%	100.00%

PERIODOS DE CONTROL

Oficinas: Varios
Vob
2021



RECOMENDACIÓN:

- Al contar con la opinión favorable y validación del monto consignado, por parte del suscrito según Carta N°23-2019-C.H.-F.S.B., se da Conformidad Técnica por lo que recomiendo continuar con el trámite a la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Loreto, tramitar el pago de la valorización N° 03 correspondiente al mes de marzo - 2020, por un monto de **CUATROCIENTOS CATORCE MIL QUINIETOS OCHENTISIETE y 31/100 Soles (S/. 414,587.31)**, con IGV; a favor del **CONSORCIO HOSPITALARIO**, para la ejecución de la obra **"REMODELACION DE LA SALA DE OPERACIONES O QUIROFANO Y AMBIENTE DE UNIDADES OPERATIVAS; RENOVACION DE MAQUINAS LAVADORAS TIPO LAVANCERIA; REPARACION DE ACCESORIOS PARA ESTERILIZADOR O AUTOCLAVE DE VAPOR; EN EL (LA) EE.SS. HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE ARRIOLA IGLESIAS" – PUNCHANA EN LA LOCALIDAD PUNCHANA – DISTRITO DE PUNCHANA – PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO"**.
- Así mismo para la cancelación de dicha valorización la firma contratista acredita el pago a SENCICO por la suma de S/. 829.00 y la constancia de estar al día en sus pagos a ESSALUD - CONAFOVISER, ONP, SCTR. Presentando comprobante de pago al mes de la valorización, en cumplimiento de la Ley.

respectivo.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y tramite

Atentamente,

Atentamente.

Orestes Lucio Varillas Boza
Ingeniero Civil

Reg. Colégia de Ingenieros del Peru N° 75729



INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR

OBRA	: "REMODELACION DE LA SALA DE OPERACIONES O QUIROFANO Y AMBIENTE DE UNIDADES OPERATIVAS; RENOVACION DE MAQUINAS LAVADORAS TIPO LAVANCERIA; REPARACION DE ACCESORIOS PARA ESTERILIZADOR O AUTOCLAVE DE VAPOR; EN EL (LA) EE.SS. HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE ARRIOLA IGLESIAS" – PUNCHANA EN LA LOCALIDAD PUNCHANA – DISTRITO DE PUNCHANA – PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO"
UBICACIÓN	: PUNCHANA – MAYNAS – LORETO.
CONTRATISTA	: CONSORCIO HOSPITALARIO.
PROCESO DE SELECCION	: AS N° 020-2018-CS-GORELORETO.
CONTRATO DE OBRA	: CONTRATO N° 003-2019-GRL-ORA.
FIRMA DE CONTRATO	: 22 de enero del 2019.
VALOR REFERENCIAL	: S/. 931,347.30 Soles (con I.G.V.)
MONTO CONTRACTUAL	: S/. 931,000.00 Soles (con I.G.V.)
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA	: TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
ADELANTO DIRECTO	: S/. 93,100.00 no solicita
ADELANTO DE MATERIALES	: S/ 186,200.00 no solicita
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	: 22 de marzo del 2019
FECHA DE TERMINO DE OBRA	: 20 de abril del 2019
REPRESENTANTE LEGAL	: Señor Fernando SANCHEZ AVIDON.
RESIDENTE	: Ing. Francisco Noé SUAÑA LAZARO, C.I.P. N° 54492
INSPECTOR	: Ing. Orestes Lucio VARILLAS BOZA

CONTROL ADMINISTRATIVO

La parte administrativa de la obra está siendo controlado por el **INSPECTOR**, nombrado con Memorándum N° 014-2019-GRL-GRI-SGSyC, del 07/02/2019; por el Gobierno Regional de Loreto, con fines de controlar la parte legal, administrativa así como la parte física en la ejecución de obra y cada mes poner en conocimiento de la Gerencia Regional de Infraestructura - Sub Gerencia de Supervisión y Control, los por menores y sucesos de ocurrencia en obra, con reporte del estado Obra y la Valorización del Avance físico del mes.

De las solicitudes de suspensión de plazo solicitados por el Consorcio, las obras adicionales vinculantes necesarios o las exigencias para su pronunciamiento del G.R.L. a favor o en contra, las autorizaciones para la ejecución de obra adicional con fines de protección de los ambientes del mejoramiento de la sala de cirugía, renovación de máquinas lavadoras y reparación de accesorios para esterilización o autoclave de vapor, son la parte administrativa responsable de la Inspección en la ejecución de la obra hasta su término.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

La ejecución del proyecto denominado, "REMODELACION DE LA SALA DE OPERACIONES O QUIROFANO Y AMBIENTE DE UNIDADES OPERATIVAS; RENOVACION DE MAQUINAS LAVADORAS TIPO LAVANCERIA; REPARACION DE ACCESORIOS PARA ESTERILIZADOR O AUTOCLAVE DE VAPOR; EN EL (LA) EE.SS. HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE ARRIOLA IGLESIAS" – PUNCHANA EN LA LOCALIDAD PUNCHANA – DISTRITO DE PUNCHANA – PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO", es para remodelar o mejorar los ambientes de la sala de cirugía,

Orestes Lucio Varillas Boza
VBO



área de esterilización y zona de lavandería segura y cómoda con todas las instalaciones que corresponde a la norma técnica sanitaria que requiere, que servirá para la población médica y el uso adecuado para el mejor tratamiento a los pacientes del ámbito de radio de influencia de la infraestructura médica y alrededores, con mayor población beneficiaria que requiere el Distrito de Punchana, siendo prioritario el contar de mejores ambientes para el desarrollo de sus actividades en cirugía, con un mejoramiento materiales de calidad y de acorde a la realidad.

Dentro de la descripción de la obra se determina que el mejoramiento ha cumplido al 100% en cumplimiento del expediente técnico de la obra, en todas sus metas proyectadas de acuerdo al expediente técnico y con todas sus especificaciones técnicas, independientemente a la restricción de las áreas de trabajo, toda vez que muchas veces los médicos jefe de cirugía han solicitado la paralización por sobrecarga de pacientes en lista para su operación y que los ruidos ocasionados durante los trabajos en lugares de la sala de cirugía han fomentado la molestia a los médicos que por su propia actividad en la operación que realizan le era intolerante el picado y/o bullicio de trabajos en zonas cercanas.

El presente proyecto comprende la REMODELACION DE LA SALA DE OPERACIONES O QUIROFANO Y AMBIENTE DE UNIDADES OPERATIVAS; RENOVACION DE MAQUINAS LAVADORAS TIPO LAVANCERIA; REPARACION DE ACCESORIOS PARA ESTERILIZADOR O AUTOCLAVE DE VAPOR; EN EL (LA) EE.SS. HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE ARRIOLA IGLESIAS" – PUNCHANA EN LA LOCALIDAD PUNCHANA – DISTRITO DE PUNCHANA – PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO el cual está constituido de 01 Formula:

FORMULA 01

El que suscribe inspector de la obra materia de este informe solicito con **INFORME N° 0017-2019-GRL-GRI-SGSyC/OLVB-INFORME SOLICITANDO CALCULO DE FORMULA POLINOMICA**, la corrección de la formula polinómica toda vez que existía agrupación en los monomios, no cumpliendo que la sumatoria sea la unidad (1), funciones que se desarrolló en cumplimiento de mis funciones.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo del Proyecto es proporcionar un: "ADECUADO SERVICIO A LOS PACIENTES"

- Contribuir a mejorar las condiciones de atención de los pacientes de distintas enfermedades.
- Aportar para que el presupuesto sea invertido con materiales de calidad.
- Dotar de un acabado diferenciando a los que existía.
- Optimizar los recursos diferenciando a la modernidad y duradero.

CRITERIOS DE DISEÑO

Para el mejoramiento de las zonas involucradas, se tuvo en cuenta las normativas vigentes para el diseño de locales de salud, mediante el cual se le clasificó:

- Acabados en las salas de cirugía con vinil de marca para eso se viene realizando acabados en tarrajeo bastante nivelados, en el pintado se realizara mediante empastado y similar acabado tendrá el piso.
- Puertas de madera contraplacada y ventanas de vidrio.
- Cerrajería en general.
- Pintado al Cieloraso de aligerado.
- Piso pulido y vinil.
- Tarrajeo en muros
- Pintura en general.
- Sistema Eléctrico de acuerdo a la necesidad del área.

0017-2019-GRL-GRI-SGSyC/OLVB-INFORME SOLICITANDO CALCULO DE FORMULA POLINOMICA



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EJECUTADO.

En el IOARR de proyecto: REMODELACIÓN DE SALA DE OPERACIONES O QUIRÓFANO Y AMBIENTE DE UNIDADES OPERATIVAS, RENOVACIÓN DE MÁQUINAS LAVADORAS TIPO LAVANDERÍA; REPARACIÓN DE ACCESORIOS PARA ESTERILIZACIÓN O ENCLAVE DE VAPOR; EN EL (LA) EE.SS. HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE ARRIOLA IGLESIAS", PUNCHANA EN LA LOCALIDAD DE PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO. Se realizó al 100% de las siguientes Partidas:

PRIMER MODULO I (SALA DE OPERACIONES)

- **ESTRUCTURAS**
 1. TRABAJOS DE LIMPIEZA
 2. TRABAJOS DE REMOCIONES
 3. TRANSPORTES DE MATERIALES
 4. TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE OBRA
 5. SEGURIDAD Y SALUD
- **ARQUITECTURA**
 1. MUROS
 2. REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
 3. CIELORRASO
 4. PISOS Y ENCHAPES
 5. ZOCALOS Y CONTRAZOCALES
 6. CARPINTERIA DE MADERA
 7. CARPINTERIA METALICA
 8. CERRAJERIA
 9. PINTURA
- **INSTALACIONES ELECTRICAS**
 1. SALIDA DE ALUMBRADO
 2. SALIDA DE TOMACORRIENTES
 3. INSTALACIONES DE ARTEFACTOS DE INTERIORES
- **EQUIPAMIENTO**
Sala de Operaciones

EQUIPOS COMPLEMENTARIOS DE SALA DE OPERACIONES

ITEM	CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	M-89	3	Mesa angular de acero inoxidable para instrumental
2	M-91	10	Mesa de acero inoxidable rodable para múltiples usos
3	M-90	3	Mesa de acero inoxidable tipo mayo
4	D-2a	3	Porta balde de acero inoxidable rodable con balde de acero inoxidable
5	D-1	3	Porta bolsa metálica rodable, con bolsa de lona
6	M-116	3	Porta lavatorio doble metálico rodable inc. Lavatorio de acero
7	T-78	3	Reloj cronómetro de pared.
8	T-79	3	Reloj de una esfera de pared.

Verificar
VoBo



9		1	Lavachata de acero inoxidable de 1 cuerpo inc. Accesorios, fluxometro y roceador tipo ducha de mano
10		3	Lavabos de cirujano de acero inoxidable de 1 cuerpo inc. Griferia con sensor y accesorios
11		1	Lavadero de instrumental de acero inoxidable con dos pozas y
12		1	Mesa de trabajo de acero inoxidable
13		1	Tablero escurridor de acero inoxidable inc. Accesorios de drenaje

SEGUNDO MODULO II (CENTRO DE ESTERILIZACION)

• **ESTRUCTURAS**

1. TRABAJOS DE LIMPIEZA
2. TRABAJOS DE REMOCIONES
3. TRANSPORTES DE MATERIALES
4. TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE OBRA
5. SEGURIDAD Y SALUD

• **ARQUITECTURA**

1. MUROS
2. REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
3. PISOS Y ENCHAPES
4. ZOCALOS Y CONTRAZOCALES
5. CARPINTERIA DE MADERA
6. CARPINTERIA METALICA
7. CERRAJERIA
8. PINTURA

• **INSTALACIONES SANITARIAS**

1. SUMINISTRO DE APARATOS DE BAÑOS


• **INSTALACIONES ELECTRICAS**

1. SALIDA DE ALUMBRADO
2. SALIDA DE TOMACORRIENTES

• **EQUIPAMIENTO**

Centro de Esterilización

EQUIPOS COMPLEMENTARIOS DE CENTRO DE ESTERILIZACION			
ITEM	CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	M-60	3	Estantería de acero inoxidable de 01 cuerpo 05 divisiones
2	M-94	1	Mesa de trabajo de acero inoxidable de 1.40 x 0.70 m
3	M-36	5	Silla metálica apilable
4	M-114	3	Cubo de acero inoxidable para desperdicios, con tapa accionada a
5	E-114	1	Extintor contra incendios CO2 de 12 kg. o 30 lb aprox.
6		1	Repotenciación de AutoClave a Vapor





TERCER MODULO III (LAVANDERIA)

- **ESTRUCTURAS**
 1. TRABAJOS DE LIMPIEZA
 2. TRABAJOS DE REMOCIONES
 3. TRANSPORTES DE MATERIALES
 4. TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE OBRA
 5. SEGURIDAD Y SALUD
- **ARQUITECTURA**
 1. MUROS
 2. REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
 3. PISOS Y ENCHAPES
 4. ZOCALOS Y CONTRAZOCALES
 5. CARPINTERIA DE MADERA
 6. CARPINTERIA METALICA
 7. CERRAJERIA
 8. PINTURA
 9. POZA DE REMOJO
- **INSTALACIONES ELECTRICAS**
 1. SALIDA DE ALUMBRADO
 2. SALIDA DE TOMACORRIENTES
- **EQUIPAMIENTO**

Servicio de Lavandería

EQUIPOS COMPLEMENTARIOS DE LAVANDERIA			
ITEM	CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	K-104	3	Carro para transporte de ropa limpia
2	K-103	3	Carro para transporte de ropa sucia
3	K-126	2	Carro transportador de ropa húmeda
4	IMES43	1	Lavadora Flotante C/ CALENT. Eléctrico /100 KG

CONTROL DE AVANCE DE OBRA.-


Este capítulo se refiere netamente al control del avance físico de ejecución de la obra, en esta oportunidad es el primer mes incluyendo las suspensiones de plazo que se dieron a solicitud del jefe de la sala de cirugía, lo que motivaron que se amplíe el plazo original, que se encuentra actualmente reportando en el siguiente cuadro, las valorización del avance físico con el monto y % reportados en su término de obra.

AVANCES FÍSICO VALORIZADO DE OBRA:

✓ Avance Físico marzo 2020 (Val. N° 03)	:	S/. 351,345.18	= 55.47 %
✓ Avance Acumulada a la fecha	:	S/. 437,637.87	= 55.47 %
✓ Saldo por valorizar	:	S/. 00.00	= 00.00 %

Notas:

- Estos datos reflejan los pagos que se realizaron por parte de la entidad de acuerdo a la valorización N° 01, 02 y 03 faltando incorporar el 18% del IGV.






- Esta valorización es la última se está remitiendo con fines de que se ejecute el pago correspondiente.
- No se adjunta en el cuadro de las amortizaciones de adelantos ya que el Consorcio Hospitalario no tramita ningún adelanto tanto Directo y de Adelanto de materiales.

AVANCES FÍSICO DE OBRA:


En el presente Informe, se reporta la ejecución de la obra contratada al 100%, dando cumplimiento de acuerdo a las especificaciones del expediente técnico.


Drestes Lucio Varillas Boza
Ingeniero Civil
INSPECTOR


Drestes Lucio Varillas Boza



ANEXO DE FOTOS

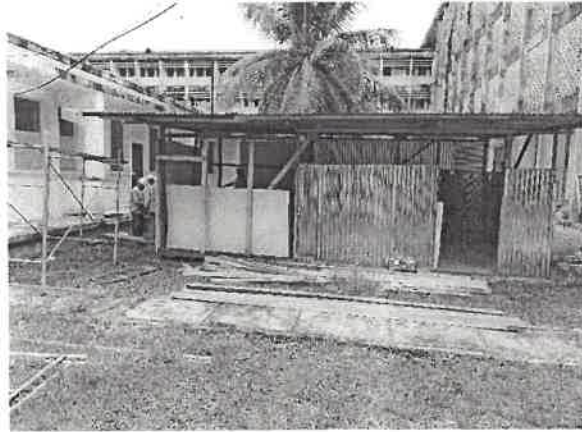


Ordenes Verificadas
V O B O


1
UWO

CONSORCIO HOSPITALARIO

CARTA N° 23-2020-C.H.F.S.B.



Iquitos, 16 de Marzo del 2020



Señores:

ING. EDI WISBERTO RUIZ ZARATE

Gerente Regional de Infraestructura

Atención:

Ing. Oreste Lucio Varillas Boza
Inspector de Obras.

Ref.:

CONTRATO N° 003-20109-GRL-ORA
REMODELACION DE SALA DE OPERACIONES O QUIROFANO Y AMBIENTE DE UNIDADES OPERATIVAS; RENOVACION DE MAQUINAS LAVADORAS TIPO LAVANDERIA; REPARACION DE ACCESORIOS PARA ESTERILIZADOR O AUTOCLAVE DE VAPOR; EN EL (LA) EE.SS. HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE ARRIOLA IGLESIAS" – PUNCHANA EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, DSTRITO DE PUNCHANA – PROVINCIA MAYNAS – DEPARTAMENTO DE LORETO.

Asunto:

REMITE DOCUMENTACION DE LA VALORIZACION N° 03
(MARZO – 2020)



De mi mayor consideración:

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarle cordialmente y al mismo tiempo remito la documentación de VALORIZACION N° 03 (Marzo-2020), para su verificación, aprobación y trámite correspondiente.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,



CONSORCIO HOSPITALARIO
Fernando M. Sanchez Bedón
Representante Común
DNI: 07038517

PROVIDO N° 19706
A: Ing. Oreste Lucio Varillas Boza
PARA: Su Atención

PROVIDO N° 19706
A: S654C
PARA: Atención



Domicilio: Jr. Morona N° 1368 – Iquitos Cel. 995 055259

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

CONCURSO: AS Nº 020-2018-CS-GORELORETO
CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITALARIO
PRESUPUESTO CONTRATADO s/IGV: SI. 788,983.05

UBICAC.: Punchana
DISTRITO: Punchana, Maynas-Iquito
PROV.: Maynas
REGION: Loreto

OBRA: REMODELACION DE SALA DE OPERACIONES O QUIROFANO Y AMBIENTE DE UNIDADES OPERATIVAS; RENOVACION DE MAQUINAS LAVADORAS TIPO LAVANDERIA; REPARACION DE ACCESORIOS PARA ESTERILIZADOR O AUTOCLAVE DE VAPORE; EN EL (LA) EE.SS. HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE ARRIOLA (IGLESIAS)" - PUNCHANA, EN LA LOCALIDAD DE PUNCHANA - DISTRITO DE PUNCHANA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO

PRESUPUESTO REFERENCIAL s/IGV: SI. 789,277.37

FACTOR DE RELACION 0.99963

FECHA DE INICIO DE OBRA: 22-Mar-19

PLAZO EJECUCION: 30 dias calendaris

FECHA TERMINO CONTRAC.: 20-Abr-19

VALORIZACION MENSUAL N° 03

DEL 3-Mar-20 **AL** 13-Mar-20

REPROGRAMADO: 13-Mar-20

PRESUPUESTO REFERENCIAL

VALORIZACION MENSUAL N° 03 DEL 03/03/20 AL 13/03/20

PART.	DESCRIPCION (Monto por partida principal)	PRESUPUESTO REFERENCIAL		VALORIZACION ANTERIOR		PTE. VALORIZACION		ACUMULADO ACTUAL		SALDOS POR	
		UND	METRADO	P.UNIT. SI.	SI.	METRADO	VALOR SI.	METRADO	VALOR SI.	METRADO	VALOR SI.
01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES	m2	1.00	141.07	141.07	1.00	141.07	1.00	141.07	100%	-
02	ALMACEN										
02.01	TRABAJOS PRELIMINARES	m2	300.00	0.42	126.00	300.00	126.00	300.00	126.00	100%	-
03	LIMPIEZA DEL OFICINA										
03.01	REMOCCIONES										
03.02	DES-MONTAJE DE VENTANAS	und	4.00	42.79	171.16	4.00	171.16	4.00	171.16	100%	-
04	DES-MONTAJE DE COBERTURA (TEJA TIPO ANDINA)	m2	6.00	42.79	256.74	6.00	256.74	6.00	256.74	100%	-
04.01	TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS	TON	4.00	199.35	797.40	4.00	797.40	4.00	797.40	100%	-
05	TRANSPORTE DE EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS										
05.01	TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO	m2	487.94	1.93	903.12	487.94	903.12	487.94	903.12	100%	-
06	REPLANTEO DURANTE EL PROCESO										
06.01	SEGURIDAD Y SALUD	und	1.00	342.00	342.00	1.00	342.00	1.00	342.00	100%	-
06.01	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL										
06.01	ARQUITECTURA										
07	MUROS										
07.01	MURO DE LADRILLO TUBULAR DE ARCILLA (12X15X24cm), ASENT	m2	2.60	71.26	185.28	2.60	185.28	2.60	185.28	100%	-
08	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS										
08.01	TARRAJEO EN INTERIORES	m2	2.60	24.87	64.66	2.60	64.66	2.60	64.66	100%	-
08.02	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE	m2	5.00	41.42	207.10	5.00	207.10	5.00	207.10	100%	-
09	VESTIDURA DE DERRAMES	m	28.20	16.08	453.46	28.20	453.46	28.20	453.46	100%	-
10	CIELORRASOS										
10.01	CIELORRASO CON BALDOSA ACUSTICA 0.60X0.60M	m2	110.00	163.44	17,978.40	110.00	17,978.40	110.00	17,978.40	100%	-
11	PISOS Y CONTRAZOCALOS										
11.01	CONTRAPISOS DE E=35MM	m2	202.00	34.66	7,001.32	61.16	2,119.81	140.84	4,881.51	72.2%	-
11.02	PISO VINILICO FLEXIBLE E= 2MM	m2	202.00	128.07	25,870.14	202.00	25,870.14	202.00	25,870.14	100%	-
11.03	ENCHAPE VINILICO FLEXIBLE E= 2MM	m2	222.00	128.07	28,431.54	222.00	28,431.54	222.00	28,431.54	100%	-
12	CARPINTERIA DE MADERA										
12.01	PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA, CON SOBRE LUZ DE VIL	m2	15.00	490.97	7,364.55	15.00	7,364.55	15.00	7,364.55	100%	-
12.02	BISAGRA DE AGERO DE DOBLE ACCION PARA PUERTA VAIVEN	und	8.00	78.38	627.04	8.00	627.04	8.00	627.04	100%	-
12.03	CERRADURA TIPO C	und	8.00	90.00	720.00	8.00	720.00	8.00	720.00	100%	-
13	PINTURA										

CONSORCIO HOSPITALARIO
Fernando M. Samper Beón
 Representante Común
 DNI: 02639517

INGENIERO CIVIL
ORESTES VARELLAS BOZA
 Colegiado INSUBEN
 N° 175129

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

CONCURSO: AS N° 020-2018-CS-GORELORETO
CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITALARIO
PRESUPUESTO CONTRATADO s/IGV: S/. 788,983.05

UBICAC.: Punchana
DISTRITO: Punchana, Maynas-Iquitos
PROV.: Maynas
REGION: Loreto

OBRA: REMODELACION DE SALA DE OPERACIONES O QUIROFANO Y AMBIENTE DE UNIDADES OPERATIVAS; RENOVACION DE MAQUINAS LAVADORAS TIPO LAVANDERIA; REPARACION DE ACCESORIOS PARA ESTERILIZADOR O AUTOCLAVE DE VAPOR; EN EL (LA) EE.SS. HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE ARRIOLA IGLESIAS", PUNCHANA, EN LA LOCALIDAD DE PUNCHANA - DISTRITO DE PUNCHANA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO

PRESUPUESTO REFERENCIAL s/IGV: S/. 789,277.37

FACTOR DE RELACION 0.99963

FECHA DE INICIO DE OBRA: 22-Mar-19

PLAZO EJECUCION: 30 dias calendarios

FECHA TERMINO CONTRAC.: 20-Abr-19

REPROGRAMADO: 13-Mar-20

DEL 3-Mar-20 **AL** 13-Mar-20

VALORIZACION MENSUAL N° 03

Supervisor/Inspector: Ing. ORESTES VARILLAS BOZA
Residente: Ing. FRANCISCO NOE SOANA LAZAR

PART.	DESCRIPCION (Monto por partida principal)	PRESUPUESTO REFERENCIAL		VALORIZACION ANTERIOR		VALORIZACION MENSUAL N° 03 DEL 03/03/20 AL 13/03/20		SALDOS POR				
		UND	METRADO	P.UNIT. S/.	SI.	METRADO	VALOR S/.	METRADO	VALOR S/.	METRADO	VALOR S/.	
06.01	PINTURA OLEOMATE 2 MANOS EN MUROS INTERIORES	m2	388.00	21.68	8,411.84	92.16	1,998.03	295.84	6,413.81	388.00	8,411.84	100%
07	VARIOS											
07.01	MESA DE CONCRETO CON TABLERO DE GRANITO	m	8.40	349.19	2,933.20	6.30	2,199.90	2.10	733.30	8.40	2,933.20	100%
07.02	LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA	glb	1.00	245.44	245.44	1.00	245.44	-	-	1.00	245.44	100%
07.03	PLACA ACRILICA DE SEÑALIZACION FOTOLUMINISCENTE DE 20X	und	2.00	488.34	976.68	2.00	976.68	2.00	976.68	2.00	976.68	100%
07.04	LETRERO ACRILICA DE SEÑALIZACION FOTOLUMINISCENTE DE 3	und	16.00	99.27	1,588.32	16.00	1,588.32	16.00	1,588.32	16.00	1,588.32	100%
01	INSTALACIONES ELCTRICAS											
01.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON TOMA A TIE	und	6.00	148.87	893.22	6.00	893.22	-	-	6.00	893.22	100%
02	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE H=1.40M.	und	6.00	147.53	885.18	6.00	885.18	-	-	6.00	885.18	100%
03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTO ADOSADO HERMETIC	und	25.00	280.69	7,017.25	25.00	7,017.25	25.00	7,017.25	25.00	7,017.25	100%
01	ESTRUCTURAS											
01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES											
01.01	ALMACEN	m2	1.00	141.07	141.07	1.00	141.07	-	-	1.00	141.07	100%
02	TRABAJOS PRELIMINARES											
02.01	LIMPIEZA DEL OFICINA	m2	65.00	0.42	27.30	65.00	27.30	-	-	65.00	27.30	100%
03	REMOCCIONES											
03.01	DESMONTAJE DE PUERTAS	und	1.00	42.79	42.79	1.00	42.79	-	-	1.00	42.79	100%
04	TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS											
04.01	TRANSPORTE DE EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	TON	2.00	199.35	398.70	2.00	398.70	-	-	2.00	398.70	100%
05	TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO											
05.01	REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	69.00	1.99	133.17	51.75	99.88	17.25	33.29	69.00	133.17	100%
06	SEGURIDAD Y SALUD											
06.01	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	1.00	342.00	342.00	1.00	342.00	1.00	342.00	1.00	342.00	100%
06.02	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGUR	glb	1.00	150.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	1.00	150.00	100%
01	ARQUITECTURA											
01.01	MUROS											
01.01	MURO DE LAORILLO TUBULAR DE ARCILLA (12X15X24cm.) ASENT	m2	8.00	71.26	570.08	8.00	570.08	8.00	570.08	8.00	570.08	100%
02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS											
02.01	TARRAJEO EN INTERIORES	m2	25.50	24.87	634.19	25.50	634.19	25.50	634.19	25.50	634.19	100%
02.02	VESTIDURA DE DERRAMES	m	28.20	16.08	453.46	28.20	453.46	28.20	453.46	28.20	453.46	100%
03	PISOS Y CONTRAZOCALOS											

CONSORCIO HOSPITALARIO
Fernando M. Sanchez Bedón
 Representante Común
 DNI: 47038517

Reg. Certificado de Ingeniería N° 13729
 INGENIERO CIVIL
 VARILLAS BOZA

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

CONCURSO: AS N° 020-2018-CS-GORELORETO
CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITALARIO
PRESUPUESTO CONTRATADO \$IGY: SI. 788,983.05

UBICAC.: Punchana
DISTRITO: Punchana, Maynas-Iquitos
PROV.: Maynas
REGION: Loreto

OBRA: REMODELACION DE SALA DE OPERACIONES O QUIROFANO Y AMBIENTE DE UNIDADES OPERATIVAS; RENOVACION DE MAQUINAS LAVADORAS TIPO LAVANDERIA; REPARACION DE ACCESORIOS PARA ESTERILIZADOR O AUTOCLAVE DE VAPOR; EN EL (LA) EE.SS. HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE ARRIOLA IGLESIAS" - PUNCHANA, EN LA LOCALIDAD DE PUNCHANA - DISTRITO DE PUNCHANA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO

PRESUPUESTO REFERENCIAL \$IGY: SI. 789,277.37

FACTOR DE RELACION 0.99963

FECHA DE INICIO DE OBRA: 22-Mar-19

PLAZO EJECUCION: 30 dias calendarios

FECHA TERMINO CONTRAC.: 20-Abr-19

REPROGRAMADO: 13-Mar-20

DEL 3-Mar-20 **AL** 13-Mar-20

Supervisor/Inspector: Ing°. ORESTES VARIILLAS BOZA
Residente: Ing°. FRANCISCO NOE SOÑANA LAZAR

VALORIZACION MENSUAL N° 03

PART.	DESCRIPCION (Monto por partida principal)	PRESUPUESTO REFERENCIAL		VALORIZACION MENSUAL N° 03 DEL 03/03/20 AL 13/03/20		SALDOS POR						
		METRO	P.UNIT. SI.	ACUMULADO ANTERIOR METRADO VALOR SI.	PTE. VALORIZACION METRADO VALOR SI.	ACUMULADO ACTUAL METRADO VALOR SI.	% VALORIZACION METRADO VALOR SI.					
33.01	CONTRAPISOS DE E=35MM	m2	34.66	2,398.47	34.60	1,199.23	34.60	1,199.23	69.20	2,398.47	100%	
33.02	PISO VINILICO FLEXIBLE E= 2MM	m2	128.07	8,862.44	69.20	8,862.44	69.20	8,862.44	69.20	8,862.44	100%	
33.03	CONTRAZOCALO VINILICO FLEXIBLE H=0.10M	m	111.27	28,040.04	252.00	28,040.04	252.00	28,040.04	252.00	28,040.04	100%	
34	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA											
34.01	BISAGRA DE ACERO DE DOBLE ACCION PARA PUERTA VAIVEN	und	8.00	627.04	8.00	627.04	8.00	627.04	8.00	627.04	100%	
34.02	CERRADURA TIPO C	und	8.00	720.00	8.00	720.00	8.00	720.00	8.00	720.00	100%	
35	PINTURA											
35.01	PINTURA OLEOMATE 2 MANOS EN MUROS INTERIORES	m2	68.00	21.68	1,495.92	21.45	465.04	47.55	1,030.88	69.00	1,495.92	100%
36	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS											
36.01	SUMINISTRO DE INODORO TIPO (C-4) DE CERAMICA O LOZA VITRE	und	1.00	250.00	1.00	250.00	1.00	250.00	1.00	250.00	100%	
36.02	SUMINISTRO DE JABONERA (Q-3) CON DISPENSADOR DE JABON LI	und	1.00	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00	1.00	50.00	100%	
36.03	SUMINISTRO DE LAVATORIO TIPO (A-3) DE CERAMICA O LOZA VITR	und	1.00	240.00	1.00	240.00	1.00	240.00	1.00	240.00	100%	
37	INSTALACIONES ELECTRICAS											
37.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON TOMA A TIE	und	3.00	148.87	448.61	3.00	448.61	3.00	448.61	3.00	448.61	100%
37.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE H=1.40M.	und	2.00	147.53	295.06	2.00	295.06	2.00	295.06	2.00	295.06	100%
37.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTO ADOSADO HERMETIC	und	8.00	280.69	2,245.52	8.00	2,245.52	8.00	2,245.52	8.00	2,245.52	100%
38	ESTRUCTURAS											
38.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES											
38.01	ALMACEN	m2	1.00	141.07	141.07	1.00	141.07	1.00	141.07	1.00	141.07	100%
38.02	TRABAJOS PRELIMINARES											
38.02	LIMPIEZA DEL OFICINA	m2	65.00	0.42	27.30	65.00	27.30	65.00	27.30	65.00	27.30	100%
38.03	TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS	TON	1.00	199.35	199.35	1.00	199.35	1.00	199.35	1.00	199.35	100%
38.04	TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO											
38.04	REFLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	69.00	1.93	133.17	69.00	133.17	69.00	133.17	69.00	133.17	100%
38.05	SEGURIDAD Y SALID											
38.05	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	1.00	342.00	342.00	1.00	342.00	1.00	342.00	1.00	342.00	100%
39	ARQUITECTURA											
39.01	MUROS											
39.01	MURO DE LADRILLO TUBULAR DE ARCILLA (12X15X24cm.) ASENT	m2	6.00	71.26	427.56	6.00	427.56	6.00	427.56	6.00	427.56	100%
39.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS											

CONSORCIO HOSPITALARIO
 Fernando Sánchez Bedón
 Representante Común

Ortiz, L. A. Variillas Boza
 INGENIERO CIVIL
 Reg. Colegio Ingeneros N° 15729

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

CONCURSO: AS Nº 020-2018-CS-GORELORETO
CONTRATISTA: CONSORCIO HOSPITALARIO
PRESUPUESTO CONTRATADO s/IGV: SI. 788,983.05

UBICAC.: Punchana
DISTRITO: Punchana, Maynas-Iquito
PROV.: Maynas
REGION: Loreto

REMODELACION DE SALA DE OPERACIONES O QUIROFANO Y AMBIENTE DE UNIDADES OPERATIVAS; RENOVACION DE MAQUINAS LAVADORAS TIPO LAVANDERIA; REPARACION DE ACCESORIOS PARA ESTERILIZADOR O AUTOCLAVE DE VAPOR; EN EL (LA) EE.SS. HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE ARRIOLA IGLESIAS" - PUNCHANA, EN LA LOCALIDAD DE PUNCHANA - DISTRITO DE PUNCHANA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO

PRESUPUESTO REFERENCIAL s/IGV: SI. 789,277.37

FACTOR DE RELACION 0.99963

FECHA DE INICIO DE OBRA: 22-Mar-19

PLAZO EJECUCION: 30 dias calendarios

FECHA TERMINO CONTRAC.: 20-Abr-19

VALORIZACION MENSUAL Nº 03

Supervisor/Inspector: Ing. ORESTES VARIILLAS BOZA

Residente: Ing. FRANCISCO NOE SOANA LAZARC

DEL 3-Mar-20 AL 13-Mar-20

REPROGRAMADO: 13-Mar-20

PART.	DESCRIPCION (Monto por partida principal)	PRESUPUESTO REFERENCIAL		VALORIZACION MENSUAL Nº 03 DEL 03/03/20 AL 13/03/20				SALDOS POR					
		UND	METRADO	P. UNIT.	PRESUP. S.	ACUMULADO ANTERIOR METRADO	VALOR S.	PTE. VALORIZACION METRADO	VALOR S.	ACUMULADO ACTUAL METRADO	VALOR S.	%	VALORIZAR METRADO
32.01	TARRAJEO EN INTERIORES	m2	12.00	24.87	298.44	12.00	298.44	-	12.00	298.44	100%	-	-
32.02	VESTIDURA DE DERRAMES	m	8.00	16.08	128.64	8.00	128.64	8.00	8.00	128.64	100%	-	-
33	PISOS Y CONTRAZOCALOS												
33.01	CONTRAPISOS DE E=35MM	m2	200.00	34.66	6,932.00	200.00	6,932.00	200.00	200.00	6,932.00	100%	-	-
33.02	PISO DE CERAMICO VITRIFICADO 30X30CM	m2	50.00	83.75	4,187.50	50.00	4,187.50	50.00	50.00	4,187.50	100%	-	-
33.03	CONTRAZOCALO DE CERAMICOSEMINATE H=0.10M	m	69.00	19.54	1,348.26	69.00	1,348.26	69.00	69.00	1,348.26	100%	-	-
34	PINTURA												
34.01	PINTURA OLEOMATE 2 MANOS EN MUROS INTERIORES	m2	69.00	21.68	1,495.92	69.00	1,495.92	69.00	69.00	1,495.92	100%	-	-
35	POZA DE REMOJO												
35.01	POZA DE CONCRETO CON TABLERO DE GRANITO	m	8.40	349.19	2,933.20	8.40	2,933.20	8.40	8.40	2,933.20	100%	-	-
	INSTALACIONES ELECTRICAS												
31	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON TOMA A TIE	und	3.00	146.87	446.61	3.00	446.61	3.00	3.00	446.61	100%	-	-
32	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE H=1.40M.	und	2.00	147.53	295.06	2.00	295.06	2.00	2.00	295.06	100%	-	-
33	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTO ADOSADO HERMETICO	und	4.00	280.69	1,122.76	4.00	1,122.76	4.00	4.00	1,122.76	100%	-	-
	COSTO DIRECTO				183,614.81		15,479.02			168,135.79			183,614.81
	GASTOS GRAVS.			10.00%	18,361.48		1,547.90			16,813.58			18,361.48
	UTILIDAD			8.00%	14,689.18		1,238.32			13,450.86			14,689.18
	EQUIPAMIENTO sin IGV				572,317.58		419,539.57			152,778.01			572,317.58
	SUB TOTAL				788,983.05		437,804.81			351,178.24			788,983.05
	Factor de Relacio			1.00000	788,983.05		437,804.81			351,178.24			788,983.05
	Regularizacion por cierre						166.94						
	TOTAL A CONSIDERAR PTE. VALORIZACION						351,345.18						
	IGV 18%				142,016.95		78,804.87			63,212.08			142,016.95
	TOTAL GRAL				931,000.00		516,609.68			414,390.32			931,000.00
	Porcentajes de avance:				931,000.00		55.47%			44.53%			100.00%
	Programado						59.38%			40.62%			100.00%

Equipam 675,334.74

TOTAL A CONSIDERAR PTE. VALORIZACION

IGV 18%
 TOTAL GRAL
 Porcentajes de avance:
 Programado

Orestes L. Variillas Boza
 INGENIERO CIVIL
 Reg. Colegio Ingenieros N° 75729

CONSORCIO HOSPITALARIO

Fernando M. S. Arce Bedón
 Representante Común
 DNI: 47038517
