



VALORIZACION

N.º 1



"Año de la Universalización de la Salud"



Belén, 12 de noviembre del 2020

Oficio n° 1946-2020-GRL-GRI-SGSyC

Ingeniero Edi Wisberto Ruiz Zarate
Gerente Regional de Infraestructura
Presente



Asunto: Remite Valorización de Obra n° 01 mes de octubre 2020.

Obra: "Mejoramiento de Veredas Peatonales en las Localidades de Huacrachiro, Bellavista, San Carlos y Ancash, del Distrito de Puinahua, Provincia de Requena, Departamento de Loreto"

Ref. : a. Informe n° 126-2020-GRL/GRI/SGSyC/JAZP
b. Carta n° 007-2020-CVP.

Tengo el agrado de saludarle a usted, en atención a la referencia a), remitirle la valorización n° 01 por ejecución de obra, correspondiente al mes de octubre del 2020, revisada y aprobada por el Inspector, la misma que asciende a la suma de **(S/. 273,150.74)**, de acuerdo al reajuste y amortización por adelanto directo, consideramos el monto neto a pagar la suma de **Doscientos cuarenta y nueve mil trescientos ochenta y seis con 64/100 Soles (S/. 249,386.64)**, sin incluir IGV, de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización bruta n° 01 – octubre 2020	S/. 273,150.74
Reajuste	S/. 3,550.96
Amortización adelanto directo	S/. -27,315.06
Amortización adelanto materiales	S/. 0.00
Neto a Pagar	S/. 249,386.64

Asimismo, la obra a octubre del 2020, tiene un avance real acumulado ejecutado de 8.46%, versus un avance programado de 9.29%, encontrándose la obra en ejecución y **adelantada**.

Por lo tanto, encontrándose **conforme** la documentación que sustenta el Inspector, solicito continuar con el trámite respectivo a favor de **Constructora y Consultoría M.C Empresa Individual de Responsabilidad Limitada**, factura electrónica E001-106 que se adjunta.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regional de Infraestructura

Ing. RAJA FLORES AQUEPUCMO
Sub Gerente de Supervisión y Control

Copia: SGSyC - File obra (01)
SGSyC - File correlativo (01)
SGSyC - File personal (01)
Registro: 33166
RFA/SGSyC/iva.



"Año de la Universalización de la Salud"

INFORME N° 126-2020-GRL/GRI/SGSyC/JAZP


AL : **Ing. Raúl Flores Aquepucho**
Sub Gerente de Supervisión y Control

DE : **Ing. José Armando Zumarán Pérez**
Inspector de Obra

ASUNTO : Remite Valorización N° 01 – Mes de Octubre 2020.
Obra: **"MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH DEL DISTRITO DE PUINAHUA-PROVINCIA DE REQUENA- DEPARTAMENTO DE LORETO"**. Código Unico 2352929.

REFERENCIA : 1 CARTA N° 007/2020-CVP.
2 PROVEIDO N° 33166 (SGSyC).

FECHA : Iquitos, 11 de Noviembre de 2020.



Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo muy cordialmente e informar sobre lo indicado en el asunto.

DATOS GENERALES

Obra : "Mejoramiento de Veredas Peatonales en las Localidades de Huacrachiro, Bellavista, San Carlos y Ancash del Distrito de Puinahua-Provincia de Requena- Departamento de Loreto". Código Unico 2352929.

Entidad : Gobierno Regional de Loreto.

Proceso de Selección : Licitación Pública N° 010-2020-CSO-GRL (PRIMERA CONVOCATORIA).

Contrato : Contrato N° 037-2020-GRL-GRI.

Sistema de Contrato : Contrata a Precios Unitarios.

Otorgamiento de la Buena Pro : 07-Septiembre-2020.

Contratista : CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA.
Integrado por : CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA MC E.I.R.L.
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES MAR & MAR S.A.C.
M.L. CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

Financiamiento : Recursos Ordinarios (Cuenta de Fideicomiso).

Valor Referencial : S/. 2'940,388.11 Sin IGV.

Valor Contractual : S/. 3'019,196.04 Sin IGV.

Fecha del Valor Referencial : Julio de 2020.

Adelanto Directo : S/ 301,920.00 (Septiembre 2020).

Suscripción del Contrato : 22- Septiembre -2020.

Plazo de ejecución Contractual : 90 días calendario.

Fecha de Entrega de Terreno : 07-Octubre-2020.

Fecha de Inicio Contractual : 19-Octubre-2020.

Término de Plazo Contractual : 16-Enero-2021.

Fecha de Recepción de la Obra : .

Residente de Obra : Ing° Jorge Esteban Tocas Quispe.

Inspector de Obra : Ing° José Armando Zumarán Pérez.

Avance Físico Programado : 10.86%.

Avance Físico Prog. Acumul. : 10.86%.

Avance Físico Real : 9.29%.



"Año de la Universalización de la Salud"

Avance Físico Real Acumul. : 9.29%.
Situación actual de la obra : ATRASADA.

ANTECEDENTES.-

- Con fecha 21 de Setiembre de 2020 se firmó el Contrato N° 035-2020-GRL-GRI de la obra: "Mejoramiento de Veredas Peatonales en las Localidades de Huacrachiro, Bellavista, San Carlos y Ancash del Distrito de Puinahua-Provincia de Requena-Departamento de Loreto".
- Con fecha 07 de Octubre de 2020 se dio por finalizado el acto de Entrega del Terreno en las localidades de Huacrachiro, Bellavista, San Carlos y Ancash.
- De común acuerdo entre las partes, mediante Carta N° 667-2020-GRL/GRI/SGSyC y CARTA N° 005/2020-CVP, de la entidad y del Contratista, respectivamente, se fijó como fecha de inicio de obra el día **19 de Octubre de 2020**.

ANALISIS

Se ha tomado conocimiento de la Valorización N° 01, practicada por el Residente, y presentada mediante documento 1 de la referencia, la cual pasamos a evaluar.

De la revisión de las copias del Cuaderno de Obra, el Ing. Residente, Jorge Esteban Tocas Quispe, en su Asiento N° 013 del cuaderno de obra (páginas 9 a 10), de fecha 31 de Octubre de 2020, presenta los metrados ejecutados, para la elaboración de la Valorización N° 01. El Inspector, mediante Asiento N° 14 del cuaderno de obra (página 11) aprueba dichos metrados y, en forma conjunta, elaboran la Valorización N° 01 de Octubre de 2020.

La Valorización N° 01 arroja el siguiente resultado en forma global:

Valorización Contractual	S.	273,150.74	
Reajuste Neto		3,550.96	
Amortización Adelanto Directo		27,315.06	
Amortización Adelanto Materiales		00.00	
Sub total			249,386.64
Retención por Garantía de Fiel Cumplimiento			0.00
TOTAL VALORIZADO S.			249,386.64


Monto valorización : S/ 273,150.74

VALOR ACUMULADO: S/ 2,940,143.08 (sin IGV) AVANCE 9.29%.

PERIODO	PROGRAMADO			REAL EJECUTADO			ESTADO (adelantada / atrasada)
	PARCIAL	ACUMULADO	% ACUM	PARCIAL	ACUMULADO	% ACUM	
oct-20	248,855.43	248,855.43	8.46%		273,150.74	9.29%	ADELANTADA
nov-20	970,279.00	1,219,134.43	41.47%				
dic-20	1,376,439.60	2,595,574.03	88.28%				
ene-21	344,569.05	2,940,143.08	100.00%				
feb-21							
	2,940,143.08			-			



"Año de la Universalización de la Salud"

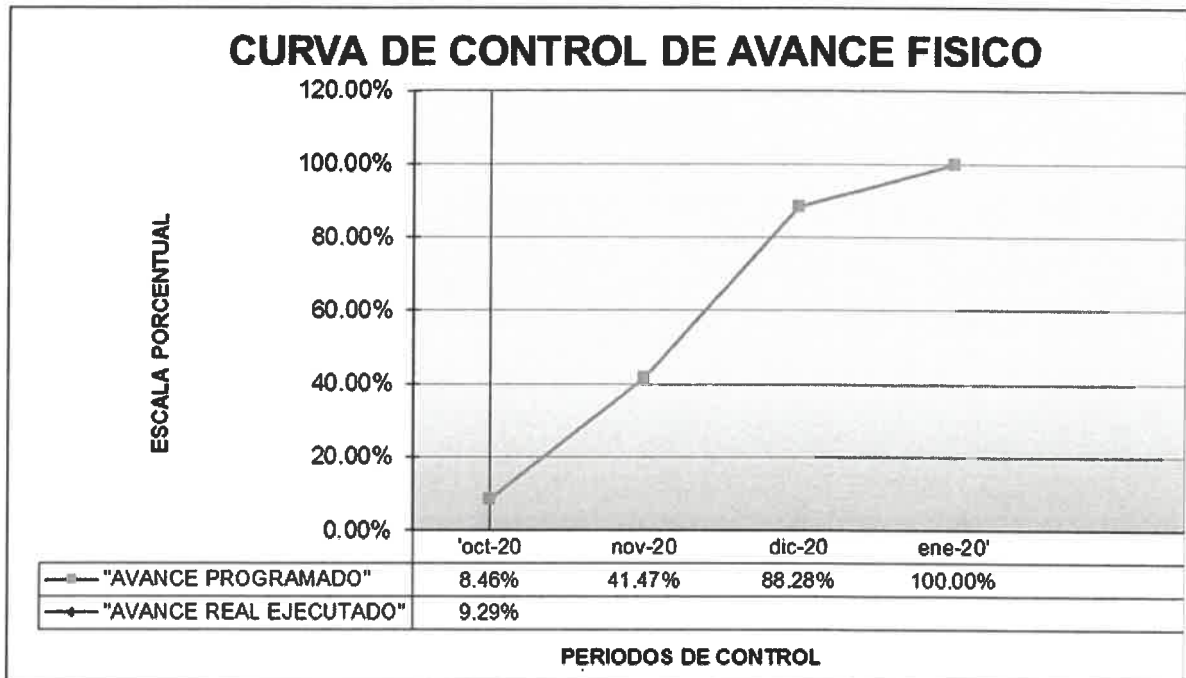

CONCLUSION

Se ha cumplido con presentar toda la documentación pertinente de la Valorización N° 01 del Contratista. De acuerdo al CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA vigente, el porcentaje de avance programado acumulado para el mes de Octubre 2020 es de 8.46% y el avance de obra acumulado real es de 9.29%, por lo tanto la obra se encuentra **adelantada** en un 0.83%.

RECOMENDACION

Continuar con el trámite respectivo para el pago de la Valorización N° 01 por un monto de **S/ 249,386.64 (Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Ochenta y Seis con 64/100 Soles)**, correspondiente.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y tramite respectivo.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regional de Infraestructura
Sub. Gerencia de Supervisión y Control


JOSÉ ARMANDO ZUMARAN PÉREZ
Ingeniero Civil
CIR N°10738

José Armando Zumarán Pérez
Ingeniero Civil
N° Reg. Prof.: 10738

ok 1946

GOBIERNO N° 33166





GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
05 NOV 2020
Hora: 11:05 AM Firma: [Signature]
Reg. N°

Iquitos, 31 de octubre de 2020

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LICITACIONES
33166
05 NOV 2020
Hora: Fecha:
CONTROL REGISTRO

CARTA N° 007/2020-CVP

Señores:
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO – SEDE CENTRAL
Ing. Edi Wisberto Ruiz Zarate – Gerente Regional de Infraestructura
Atención: Ing. José Armando Zumarán Pérez – Inspector de Obra

Presente.-

Referencia: CONTRATO N° 037-2020-CSO-GRL-GRI, Obra "MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH, DEL DISTRITO DE PUINAHUA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO"

Asunto: Valorización N° 01 - Mes octubre 2020

De nuestra consideración:

Mediante la presente los saludamos muy cordialmente y, al mismo tiempo, les hacemos llegar adjunto a la presente la VALORIZACION DE OBRA N° 01, por la ejecución de la obra de la referencia, correspondiente al mes de OCTUBRE 2020, para su revisión, aprobación y trámite correspondiente para su cancelación.

Sin otro particular, quedamos a sus órdenes.

Atentamente,

CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA
[Signature]
MARDE PASCUAL CORREA MEDINA
REPRESENTANTE COMUN

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Sub Gerencia de Supervisión y Control
05 NOV 2020
Fecha: 33166 Hora: 12:11 PM
N° Reg:

PROVEIDO N° 33166
A: SCSyC - GRL
PARA: Trámite y cancelación
08/11/2020



PROVEIDO N° 33166
A: Ing. Zumarán
PARA: [Signature]
[Circular stamp]

ARCHIVO

**VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 01
PERIODO DEL 19/10/2020 AL 31/10/2020**

"MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH, DEL DISTRITO DE PUHINAHUA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO"

LICITACION PUBLICA N° 010-2020-C80-GRL (PRIMERA CONVOCATORIA)
MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH DEL DISTRITO DEL DISTRITO DEL PUHINAHUA
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH- PUHINAHUA - REQUENA - LORETO
CONSORCIO VEREDAS PUHINAHUA
ING. JORGE ESTEBAN TOCAS QUISE
ING. JOSE ARMANDO ZUMARAN FÉREZ
UNICA

Valor Referencial (CIGV)
Valor Referencial (SIGV)
Monto Ofertado (SIGV)
Plazo de Ejecución

S/. 3,469,857.87
S/. 2,940,388.11
S/. 3,019,166.04
: 90 d/c

Jul-20
Jul-20
Jul-20

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL				ANTERIOR				ACTUAL				ACUMULADO				SALDO		
		Und	Medrado	Unitario	Parcial	Medrado	Parcial	%	Medrado	Parcial	%	Medrado	Parcial	%	Medrado	Parcial	Medrado	Parcial	%	
																				Medrado
01	COMUNIDAD - HUACRACHIRO																			
01.01	01.01	und	1.00	990.38	990.38	-	0.00%	1.00	990.38	100.00%	1.00	990.38	100.00%	1.00	990.38	1.00	990.38	100.00%	0.00%	
01.01	01.02	mes	3.00	2,000.00	6,000.00	-	0.00%	3.00	2,000.00	33.33%	3.00	2,000.00	33.33%	3.00	2,000.00	2.00	4,000.00	66.67%	0.00%	
01.01	01.03	ton	413.42	20.00	8,268.40	-	0.00%	413.42	8,268.40	70.00%	289.39	5,787.88	70.00%	289.39	5,787.88	124.03	2,480.60	30.00%	0.00%	
01.01	01.04	ton	413.42	120.00	49,610.40	-	0.00%	413.42	49,610.40	70.00%	289.39	34,727.28	70.00%	289.39	34,727.28	124.03	14,883.60	30.00%	0.00%	
01.01	01.05	ton	413.42	45.00	18,653.90	-	0.00%	413.42	18,653.90	70.00%	289.39	13,022.73	70.00%	289.39	13,022.73	124.03	5,581.35	30.00%	0.00%	
01.01	01.06	ton	413.42	38.00	15,711.96	-	0.00%	413.42	15,711.96	70.00%	289.39	11,284.43	70.00%	289.39	11,284.43	124.03	3,720.90	30.00%	0.00%	
01.01	01.07	und	2.00	405.55	811.10	-	0.00%	2.00	811.10	100.00%	2.00	811.10	100.00%	2.00	811.10	2.00	811.10	100.00%	0.00%	
01.02	01.01	GLB	1.00	10,800.00	10,800.00	-	0.00%	1.00	10,800.00	30.00%	0.30	3,240.00	30.00%	0.30	3,240.00	0.70	7,560.00	70.00%	0.00%	
01.02	01.02	GLB	1.00	7,000.00	7,000.00	-	0.00%	1.00	7,000.00	100.00%	1.00	7,000.00	100.00%	1.00	7,000.00	1.00	7,000.00	100.00%	0.00%	
01.02	01.03	GLB	1.00	2,000.00	2,000.00	-	0.00%	1.00	2,000.00	100.00%	1.00	2,000.00	100.00%	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	100.00%	0.00%	
01.03	01.01	M2	3,385.30	2.70	9,140.31	-	0.00%	3,385.30	9,140.31	100.00%	3,385.30	9,140.31	100.00%	3,385.30	9,140.31	3,385.30	9,140.31	100.00%	0.00%	
01.03	01.02	M2	3,385.30	2.69	9,105.46	-	0.00%	3,385.30	9,105.46	100.00%	3,385.30	9,105.46	100.00%	3,385.30	9,105.46	3,385.30	9,105.46	100.00%	0.00%	
01.04	01.01	M3	507.80	48.23	24,481.19	-	0.00%	507.80	24,481.19	0.00%	-	-	0.00%	-	-	507.80	24,481.19	100.00%	0.00%	
01.04	01.02	M3	388.53	108.26	35,882.35	-	0.00%	388.53	35,882.35	0.00%	-	-	0.00%	-	-	388.53	35,882.35	100.00%	0.00%	
01.04	01.03	M2	3,985.00	8.14	20,783.90	-	0.00%	3,985.00	20,783.90	0.00%	-	-	0.00%	-	-	3,985.00	20,783.90	100.00%	0.00%	
01.04	01.04	M3	634.74	19.29	12,244.13	-	0.00%	634.74	12,244.13	0.00%	-	-	0.00%	-	-	634.74	12,244.13	100.00%	0.00%	
01.05	01.01	M2	135.41	20.49	2,768.24	-	0.00%	135.41	2,768.24	0.00%	-	-	0.00%	-	-	135.41	2,768.24	100.00%	0.00%	
01.05	01.02	M3	685.68	643.77	441,857.91	-	0.00%	685.68	441,857.91	0.00%	-	-	0.00%	-	-	685.68	441,857.91	100.00%	0.00%	
01.05	01.03	M2	1,184.86	35.83	42,453.53	-	0.00%	1,184.86	42,453.53	0.00%	-	-	0.00%	-	-	1,184.86	42,453.53	100.00%	0.00%	
01.05	01.04	M	1,128.43	8.94	10,088.16	-	0.00%	1,128.43	10,088.16	0.00%	-	-	0.00%	-	-	1,128.43	10,088.16	100.00%	0.00%	
01.05	01.05	M2	3,385.30	0.78	2,640.53	-	0.00%	3,385.30	2,640.53	0.00%	-	-	0.00%	-	-	3,385.30	2,640.53	100.00%	0.00%	
01.05	01.06	m	4,231.63	1.86	7,870.83	-	0.00%	4,231.63	7,870.83	0.00%	-	-	0.00%	-	-	4,231.63	7,870.83	100.00%	0.00%	
01.06	01.01	und	1.00	12,000.00	12,000.00	-	0.00%	1.00	12,000.00	0.00%	-	-	0.00%	-	-	1.00	12,000.00	100.00%	0.00%	
01.06	01.02	und	1.00	5,000.00	5,000.00	-	0.00%	1.00	5,000.00	0.00%	-	-	0.00%	-	-	1.00	5,000.00	100.00%	0.00%	
01.06	01.03	und	1.00	5,000.00	5,000.00	-	0.00%	1.00	5,000.00	0.00%	-	-	0.00%	-	-	1.00	5,000.00	100.00%	0.00%	
01.06	01.04	und	1.00	7,000.00	7,000.00	-	0.00%	1.00	7,000.00	0.00%	-	-	0.00%	-	-	1.00	7,000.00	100.00%	0.00%	
01.06	01.05	und	1.00	5,000.00	5,000.00	-	0.00%	1.00	5,000.00	20.00%	0.20	1,400.00	20.00%	0.20	1,400.00	0.60	5,600.00	80.00%	0.00%	
01.06	01.05	und	1.00	5,000.00	5,000.00	-	0.00%	1.00	5,000.00	100.00%	1.00	5,000.00	100.00%	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	100.00%	0.00%	



CONSORCIO VEREDAS PUHINAHUA
MARCE PASCUAL CORREA MEDINA
REPRESENTANTE COMUN

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 01
PERIODO DEL 19/10/2020 AL 31/10/2020

Obra: MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO
 Proceso: LICITACION PUBLICA N° 010-2020-CSD-ORL (PRIMERA CONVOCATORIA)
 Meta: MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH DEL DISTRITO DEL PUHINAHUA
 Entidad: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 Ubicación: HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH - PUHINAHUA - REQUENA - LORETO
 Contratista: CONSORCIO VEREDAS PUHINAHUA
 Residente: ING. JORGE ESTEBAN TOCÁS QUISPE
 Inspector: ING. JOSE ARMANDO ZUMARAN PÉREZ
 Fórmula 001: ÚNICA

Valor Referencial (C/IGV)
 Valor Referencial (S/IGV)
 Monto Ofertado (S/IGV)
 Plazo de Ejecución

S/ 3,469,657.97
 S/ 2,940,383.11
 S/ 3,019,196.04
 : 90 d.c

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL			ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO			SALDO		
		Und	Metrado	Unidad	Parcial	Metrado	%	Parcial	Metrado	%	Parcial	Metrado	%	Parcial	Metrado	%
01.06.01.08	PROGRAMA DE ABANDONO EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION	und	1.00	15,000.00	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	15,000.00	-	100.00%
01.06.02.01	MEDIOS DE CONCIERTACION	und	524.37	2,621.85	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	2,621.85	-	100.00%
01.06.02.02	LETREROS DE PREVENCIÓN VIAL	und	506.37	2,531.85	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	2,531.85	-	100.00%
02.01.01	COMUNIDAD - BELLAVISTA	mes	1.00	990.38	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	990.38	-	100.00%
02.01.02	CARTEL DE OBRA DE (3.80 X 2.40M), GIGANTOGRAFIA	ton	3.00	6,000.00	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	6,000.00	-	100.00%
02.01.03	ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN	ton	226.05	261.00	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	261.00	-	100.00%
02.01.04	FLETE TERRESTRE	ton	226.05	4,591.00	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	4,591.00	-	100.00%
02.01.05	FLETE FLUVIAL	ton	226.05	53,891.90	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	53,891.90	-	100.00%
02.01.06	FLETE CARGUIJO Y DESCARGUIJO	ton	226.05	238.00	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	238.00	-	100.00%
02.01.07	TRASTO DE MATERIALES	ton	226.05	10,127.25	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	10,127.25	-	100.00%
02.02.01	POZA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LADRILLO TARRAJEADO DE 1.00 X 2.00 X 1.20 m.	und	2.00	30.00	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	30.00	-	100.00%
02.02.02	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	und	405.58	811.16	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	811.16	-	100.00%
02.02.03	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	GLB	1.00	10,800.00	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	10,800.00	-	100.00%
02.02.04	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD, DURANTE EL TRABAJO.	GLB	1.00	7,000.00	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	7,000.00	-	100.00%
02.03.01	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	GLB	1.00	2,000.00	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	2,000.00	-	100.00%
02.03.02	TRABAJOS PRELIMINARES	M2	1,833.84	2.70	4,951.37	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	4,951.37	-	100.00%
02.03.03	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL (Con pico, lampa y carretilla)	M2	1,833.84	2.69	4,933.03	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	4,933.03	-	100.00%
02.04.01	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO	M3	275.08	48.23	13,267.11	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	13,267.11	-	100.00%
02.04.02	EXCAVACION DE TERRENO MANUAL	M3	146.71	108.23	15,593.81	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	15,593.81	-	100.00%
02.04.03	CAMA DE ARENA e = 0.10 m. - ANTICONTAMINANTE	M2	1,833.84	6.14	11,297.78	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	11,297.78	-	100.00%
02.04.04	NIVELACION REGLADO Y APISONADO MANUAL	M3	343.85	18.26	6,632.87	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	6,632.87	-	100.00%
02.05.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXGEDENTE A 100M. DE LA OBRA	M2	91.59	29.49	2,703.94	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	2,703.94	-	100.00%
02.05.02	VEREDA PEATONAL L = 9.10 (2.10)	M3	376.85	643.77	242,604.72	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	242,604.72	-	100.00%
02.05.03	SOLADO MEZCLA 1:10 e=2" vaciado con carretilla	M2	641.84	35.83	22,897.13	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	22,897.13	-	100.00%
02.05.04	MORTERO f'e=210 Kg/m2	M	611.84	8.94	5,469.85	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	5,469.85	-	100.00%
02.05.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	1,833.84	0.78	1,430.40	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	1,430.40	-	100.00%
02.06.01	RELLENO DE JUNTAS DE DILATACION Y AISLAMIENTO DE 1" X 2" CON MORTERO ASFALTICO Y TECNOROC	m	2,292.30	1.86	4,833.68	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	4,833.68	-	100.00%
02.06.02	CURADO	und	1.00	12,000.00	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	12,000.00	-	100.00%
02.06.03	BRUNADO	und	1.00	5,000.00	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	5,000.00	-	100.00%
02.06.04	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	und	1.00	7,000.00	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	7,000.00	-	100.00%
02.06.05	MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL	und	1.00	5,000.00	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	5,000.00	-	100.00%
02.06.06	ELABORACION E IMPL. Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	und	1.00	5,000.00	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	5,000.00	-	100.00%
02.06.07	PROGRAMAS DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y MITIGACION DE LA CONSTRUCCION	und	1.00	7,000.00	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	7,000.00	-	100.00%
02.06.08	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS EN LA CONSTRUCCION	und	1.00	5,000.00	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	5,000.00	-	100.00%
02.06.09	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	und	1.00	5,000.00	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	5,000.00	-	100.00%
02.06.10	PLAN DE MONITOREO DE SEGURIDAD AMBIENTAL Y SALUD EN LA CONSTRUCCION	und	1.00	15,000.00	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	15,000.00	-	100.00%
02.06.11	PROGRAMA DE ABANDONO EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION	und	5.00	524.37	2,621.85	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	2,621.85	-	100.00%
02.06.12	MEDIOS DE CONCIERTACION	und	5.00	506.37	2,531.85	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	2,531.85	-	100.00%
02.06.13	LETREROS DE PREVENCIÓN VIAL	und	1.00	990.38	990.38	100.00%	0.00%	990.38	1.00	100.00%	990.38	100.00%	990.38	-	0.00%	
03.01.01	COMUNIDAD - SAN CARLOS	mes	3.00	2,000.00	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	2,000.00	-	100.00%
03.01.02	CARTEL DE OBRA DE (3.60 X 2.40M), GIGANTOGRAFIA	ton	283.24	20.00	5,984.80	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	5,984.80	-	100.00%
03.01.03	ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN	ton	283.24	420.00	35,188.80	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	35,188.80	-	100.00%
03.01.04	FLETE TERRESTRE	ton	283.24	20.00	5,984.80	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	5,984.80	-	100.00%
03.01.05	FLETE FLUVIAL	ton	283.24	420.00	35,188.80	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	35,188.80	-	100.00%


JORGE ESTEBAN TOCÁS QUISPE
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 54592


CONSORCIO VEREDAS PUHINAHUA
 MARÍA ESCAL-CORREA MEDINA
 REPRESENTANTE COMÚN

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 01
PERIODO DEL 19/10/2020 AL 31/10/2020

MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO*

Obra: Licitación Pública N° 010-2020-C50-GR. (PRIMERA CONVOCATORIA)
Proceso: MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH DEL DISTRITO DE PUNAHUA
Meta: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Entidad: HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH - PUNAHUA - REQUENA - LORETO
Ubicación: CONSORCIO VEREDAS PUNAHUA
Contratista: ING. JORGE ESTEBAN TOCAS QUIRPE
Residencia: ING. JOSE ARMANDO ZUJARAN PEREZ
Inspector: UNICA
Formulas: 001

Valor Referencial (CIGV)
Valor Referencial (SIGV)
Monto Ofertado (SIGV)
Plazo de Ejecución

S/ 3,468,657.97
S/ 2,940,388.11
S/ 3,019,196.04
: 90 d.c.

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL			ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO			SALDO			
		Und	Metrado	Unifloro	Parcial	Metrado	Parcial	%	Metrado	Parcial	%	Metrado	Parcial	%	Metrado	Parcial	%
03.01.05	FLETE CARGUIO Y DESCARGUIO	ton	293.24	45.00	13,195.80	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	13,195.80	100.00%	
03.01.06	TRASTEO DE MATERIALES	ton	293.24	30.00	8,797.20	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	8,797.20	100.00%	
03.01.07	POZA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LADRILLO TARRAJEADO DE 1.00 X 2.00 X 1.20 m.	und	2.00	405.58	811.16	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	811.16	100.00%	
03.02	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA																
03.02.01	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	GLB	1.00	10,800.00	10,800.00	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	10,800.00	100.00%	
03.02.02	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD, DURANTE EL TRABAJO.	GLB	1.00	7,000.00	7,000.00	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	7,000.00	100.00%	
03.02.03	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	GLB	1.00	2,000.00	2,000.00	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	2,000.00	100.00%	
03.03	TRABAJOS PRELIMINARES																
03.03.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL (Con pico, lampa y carretilla)	M2	2,881.95	2.70	7,781.27	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	7,781.27	100.00%	
03.03.02	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO	M2	2,881.95	2.69	7,752.45	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	7,752.45	100.00%	
03.03.03	DEMOLICION DE VEREDA EXISTENTE	m3	1,393.30	16.72	23,295.98	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	23,295.98	100.00%	
03.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS																
03.04.01	EXCAVACION DE TERRENO MANUAL	M3	432.29	48.23	20,649.35	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	20,649.35	100.00%	
03.04.02	CAMA DE ARENA e = 0.10 m. - ANTICONTAMINANTE	M3	230.56	106.29	24,506.22	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	24,506.22	100.00%	
03.04.03	NIVELACION REGLADO Y APOSONADO MANUAL	M2	2,881.95	6.14	17,695.17	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	17,695.17	100.00%	
03.04.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 100M. DE LA OBRA c/carretilla	M3	540.37	19.29	10,423.74	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	10,423.74	100.00%	
03.05	SOLIDO MEZCLA 1:10 e=2" - vaseado con carretilla																
03.05.01	MORTERO F e=210 Kg/cm2	M3	144.10	28.49	4,248.51	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	4,248.51	100.00%	
03.05.02	ENCORADO Y DESENCORADO	M3	490.06	643.77	315,498.80	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	315,498.80	100.00%	
03.05.03	RELLENO DE JUNTAS DE DILATACION Y AISLAMIENTO DE 1" X 2" CON MORTERO ASFALTICO Y TECNOPOL	M2	1,098.88	35.63	38,141.00	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	38,141.00	100.00%	
03.05.04	CURADO	M	960.65	8.94	8,598.21	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	8,598.21	100.00%	
03.05.05	BRUJADO	M	2,881.95	0.78	2,247.92	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	2,247.92	100.00%	
03.05.06	BRUJADO	m	6,896.52	1.88	12,753.13	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	12,753.13	100.00%	
03.06	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL																
03.06.01	MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL	und	1.00	12,000.00	12,000.00	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	12,000.00	100.00%	
03.06.01.01	ELABORACION E IMPL. Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	und	1.00	5,000.00	5,000.00	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	5,000.00	100.00%	
03.06.01.02	PROGRAMAS DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y MITIGACION DE LA CONSTRUCCION	und	1.00	5,000.00	5,000.00	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	5,000.00	100.00%	
03.06.01.03	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS EN LA CONSTRUCCION	und	1.00	7,000.00	7,000.00	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	7,000.00	100.00%	
03.06.01.04	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	und	1.00	5,000.00	5,000.00	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	5,000.00	100.00%	
03.06.01.05	PLAN DE MONITOREO DE SEGURIDAD AMBIENTAL Y SALUD EN LA CONSTRUCCION	und	1.00	15,000.00	15,000.00	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	15,000.00	100.00%	
03.06.01.06	PROGRAMA DE ABANDONO EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION	und	1.00	5,000.00	5,000.00	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	5,000.00	100.00%	
03.06.02	MEDIOS DE COINCIDENTACION																
03.06.02.01	LETREOS AMBIENTALES	und	5.00	524.37	2,621.85	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	2,621.85	100.00%	
03.06.02.02	LETREOS DE PREVENCIÓN VIAL	und	5.00	508.37	2,531.85	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	2,531.85	100.00%	
04	COMUNIDAD - ANCASH																
04.01	OBRAS PROVISIONALES																
04.01.01	CARTEL DE OBRA DE (3.60 X 2.40M). SIGANTOGRAFIA	und	1.00	990.38	990.38	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	990.38	100.00%	
04.01.02	ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN	mes	3.00	2,000.00	6,000.00	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	6,000.00	100.00%	
04.01.03	FLETE TERRESTRE	ton	246.58	20.00	4,931.60	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	4,931.60	100.00%	
04.01.04	FLETE FLUVIAL	ton	246.58	12.00	29,589.60	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	29,589.60	100.00%	
04.01.05	FLETE CARGUIO Y DESCARGUIO	ton	246.58	45.00	11,096.10	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	11,096.10	100.00%	
04.01.06	TRASTE DE MATERIALES	ton	246.58	30.00	7,397.40	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	7,397.40	100.00%	
04.01.07	POZA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LADRILLO TARRAJEADO DE 1.00 X 2.00 X 1.20 m.	und	2.00	405.58	811.16	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	811.16	100.00%	
04.02	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA																
04.02.01	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	GLB	1.00	10,800.00	10,800.00	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	10,800.00	100.00%	
04.02.02	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD, DURANTE EL TRABAJO.	GLB	1.00	7,000.00	7,000.00	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	7,000.00	100.00%	
04.02.03	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	GLB	1.00	2,000.00	2,000.00	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	2,000.00	100.00%	
04.03	TRABAJOS PRELIMINARES																
04.03.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL (Con pico, lampa y carretilla)	M2	2,011.64	2.70	5,431.43	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	5,431.43	100.00%	



CONSORCIO VEREDAS PUNAHUA
MARD PASCUAL CORREA MEDINA
REPRESENTANTE COMUN

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 01
PERIODO DEL 19/10/2020 AL 31/10/2020

"MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO"
LICITACION PUBLICA N° 010-2020-C50-GRJ (PRIMERA CONVOCATORIA)

MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH DEL DISTRITO DEL PUHINAHUA
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH - PUHINAHUA - REQUENA - LORETO
CONSORCIO VEREDAS PUHINAHUA

ING. JORGE ESTEBAN TOCAS QUISPE
Inspector

ING. JOSE ARMANDO ZUMARAN PÉREZ
Formula 001

UNICA

Valor Referencial (CIGV)
Valor Referencial (SIGV)
Monto Ofertado (SIGV)
Plazo de Ejecución

S/. 3,468,667.87
S/. 2,940,388.11
S/. 3,019,196.04
: 90 día

Jul-20
Jul-20
Jul-20

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL			ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO			SALDO	
		Und	Medrado	Unitario	Parcial	Medrado	Parcial	%	Medrado	Parcial	%	Medrado	Parcial	Medrado	Parcial
04.03.02	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO	M2	2,011.64	2.69	5,411.31	-	0.00%	2,011.64	5,411.31	100.00%	2,011.64	-	2,011.64	-	0.00%
04.04	DEMOLICION DE VEREDA EXISTENTE	m3	1,206.98	16.72	20,180.71	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	100.00%
04.04.01	Movimiento de tierras	M3	301.75	46.23	14,553.40	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	100.00%
04.04.02	Excavacion de terreno manual	M3	160.93	108.29	17,105.25	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	100.00%
04.04.03	Cama de arena a = 0.10 m. - Anticongelaminante	M2	2,011.64	6.14	12,351.47	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	100.00%
04.04.04	Nivelacion reglado y apisonado manual	M3	377.18	19.29	7,275.80	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	100.00%
04.05	Eliminacion de material excedente a 100m. de la obra alcastrilla	M2	103.59	29.49	2,968.10	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	100.00%
04.05.01	Solado Mezcla 1:10 e=2" vaciado con carretilla	M3	413.39	649.77	266,128.06	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	100.00%
04.05.02	Mortero f=210 Kg/cm2	M2	704.07	35.63	25,226.83	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	100.00%
04.05.03	Encofrado y desencofrado	M	670.55	8.94	5,984.72	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	100.00%
04.05.04	Relleno de juntas de dilatacion y aislamiento de 1" x 2" con mortero asfaltico y tecnopor	M2	2,011.64	0.78	1,569.08	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	100.00%
04.05.05	Curado	m	2,514.55	1.86	4,677.06	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	100.00%
04.06	Brunado	und	5.00	524.37	2,621.85	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	100.00%
04.06.01	Plan de manejo ambiental	und	5.00	508.37	2,531.85	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	100.00%
04.06.02	Medidas de mitigacion ambiental	und	1.00	12,000.00	12,000.00	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	100.00%
04.06.01.01	Elaboracion e impl. y administracion de plan de seguridad y salud en el trabajo	und	1.00	5,000.00	5,000.00	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	100.00%
04.06.01.02	Programas de medidas preventivas y mitigacion de la construccion	und	1.00	5,000.00	5,000.00	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	100.00%
04.06.01.03	Programa de manejo de residuos en la construccion	und	1.00	7,000.00	7,000.00	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	100.00%
04.06.01.04	Capacitacion en seguridad y salud	und	1.00	5,000.00	5,000.00	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	100.00%
04.06.01.05	Plan de monitoreo de seguridad ambiental y salud en la construccion	und	1.00	15,000.00	15,000.00	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	100.00%
04.06.01.06	Programa de abandono en la etapa de construccion	und	1.00	5,000.00	5,000.00	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	100.00%
04.06.02	Medios de concertizacion	und	5.00	524.37	2,621.85	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	100.00%
04.06.02.01	Letreros ambientales	und	5.00	508.37	2,531.85	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	100.00%
04.06.02.02	Letreros de prevencion vial	und	5.00	508.37	2,531.85	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	100.00%
	TOTAL COSTO DIRECTO	CD		2,450,323.43	2,450,323.43	0.00%		0.00%		9.05%					90.95%
	GASTOS GENERALES	GG	10.00%	CD	245,032.34										
	UTILIDAD	UT	9.99%	CD	244,787.31										
	PLAN COVID				79,082.96										
	SUB TOTAL				3,019,196.04										
	Factor de relacion = 1.0000				3,019,196.04										
	IGV		0.00%		0.00										
	TOTAL PRESUPUESTO = SIGV.				3,019,196.04										

CONSORCIO VEREDAS PUHINAHUA
MARCE PASCUAL CORREA MEDINA
REPRESENTANTE COMUN

JORGE ESTEBAN TOCAS QUISPE
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 54522

PANEL FOTOGRAFICO

OBRA: "MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH, DEL DISTRITO DE PUINAHUA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO"



FOTO N° 01: Se puede observar los trabajos de Replanteo de la Obra en Huacrachiro



FOTO N° 02: Se puede observar los trabajos de Replanteo de la Obra en Huacrachiro




Jorge Esteban Tocas Quispe

JORGE ESTEBAN TOCAS QUISPE

INGENIERO CIVIL

Reg. CIP N° 54502



CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA

MARDE PASCUAL CORREA MEDINA

REPRESENTANTE COMUN

PANEL FOTOGRAFICO

OBRA: "MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH, DEL DISTRITO DE PUINAHUA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO"



FOTO N° 03: Se puede observar los trabajadores reunidos con sus epps en Huacrachiro

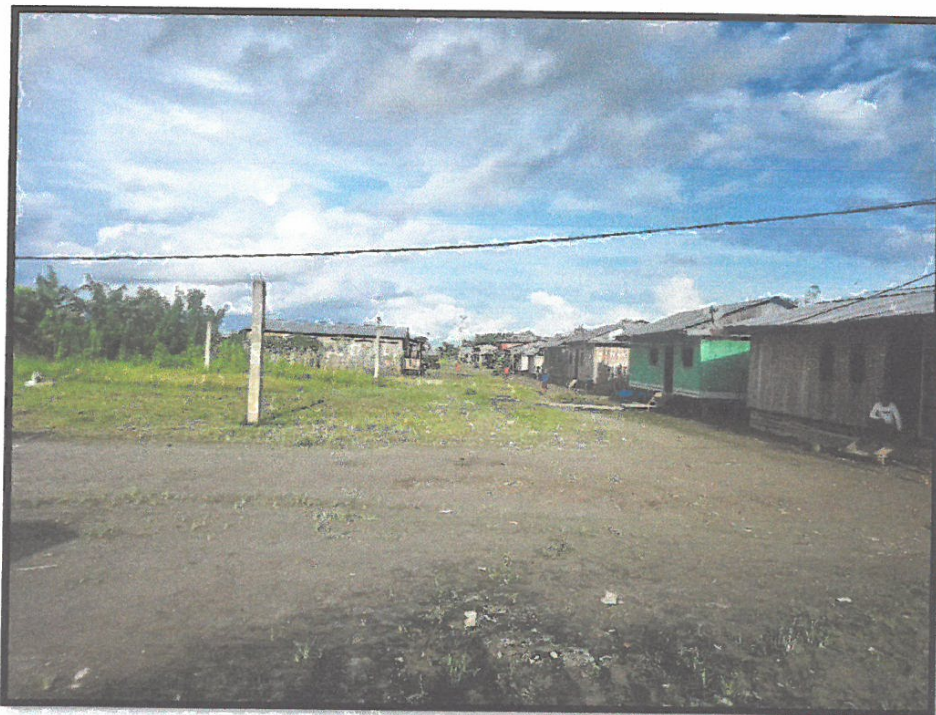


FOTO N° 04: Se puede observar los trabajadores de limpieza en Huacrachiro



JORGE ESTEBAN TOCAS QUISPE
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 54552

CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA

MARDE PASCUAL CORREA MEDINA
REPRESENTANTE COMUN

PANEL FOTOGRAFICO

OBRA: "MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH, DEL DISTRITO DE PUINAHUA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO"



FOTO Nº 05: Se puede observar los trabajos de Replanteo de la Obra en Ancash



FOTO Nº 06: Se puede observar los trabajos de Replanteo de la Obra en Ancash



Jorge Esteban Tocas Quispe
JORGE ESTEBAN TOCAS QUISPE
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP Nº 64562

Marde Pascual Correa Medina
 CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA
 MARDE PASCUAL CORREA MEDINA
 REPRESENTANTE COMUN

PANEL FOTOGRAFICO

OBRA: "MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH, DEL DISTRITO DE PUINAHUA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO"



FOTO N° 07: Se puede observar los trabajos de Replanteo de la Obra en Bellavista



FOTO N° 08: Se puede observar los trabajos de Replanteo de la Obra en Bellavista



JORGE ESTEBAN TOCÁS QUISPE
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 54502

CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA

MARDE PASQUAL CORREA MEDINA
REPRESENTANTE COMUN

PANEL FOTOGRAFICO

OBRA: "MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH, DEL DISTRITO DE PUINAHUA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO"




FOTO N° 09: Se puede observar las bolsas de cemento con destino a las comunidades de Huacrachiro Bellavista y Ancash.



FOTO N° 10: Se puede observar las bolsas de cemento con destino a las comunidades de Huacrachiro Bellavista y Ancash.



Jorge Esteban Tocas Quispe
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 54502

CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA

Marde Pascual Correa Medina
 REPRESENTANTE COMUN



VALORIZACION

N.º 2



“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Oficina Ejecutiva de Logística
SECRETARIA
Belén, 10 de Diciembre 2020

Oficio N° 03806-2020-GRL/GRI

CCP
DIOMAR ROJAS PISCO
Jefe de la Oficina Ejecutiva de Logística
Gobierno Regional de Loreto
Presente.-

11 DIC 2020
N° de Registro
Firma
Fecha

Asunto: **Conformidad de Valorización N°02 de Obra. – Mes de Noviembre de 2020.**

Obra: “MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH DEL DISTRITO DE PUINAHUA PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO”.

- a) Oficio N°2272-2020-GRL-GRI-SGSYC
- b) Informe N°155-2020-GRL-GRI-SGSyC-JAZP
- c) Carta N°002-2020-CSHBSA

Es grato dirigirme a usted y en atención a los documentos de la referencia, se remite la documentación de la **Valorización N°02; por ejecución de obra**, correspondiente al mes de noviembre de 2020, de la obra indicada en el asunto, cuyo monto asciende a la suma **1,283,220.33 soles, (Un Millón doscientos ochenta y tres mil doscientos veinte con 33/100 soles) sin IGV, Consorcio Veredas Puinahua**. Adjuntando la Factura Electrónica E001-104, de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización Bruta N° 02	S/ 1,425,800.36
Reajuste neto	S/ 00,000.00
Amortización Adelanto Directo	S/ 142,580.03
Amortización adelanto por materiales	S/ 0.00
Deduc. Reaj. que no corresponde A/D	S/ 0.00
Deduc. Reaj. Que no corresponde A/M	S/ 0.00
Neto a Pagar	S/ 1,283,220.33

Asimismo, la obra al mes de noviembre de 2020, tiene un avance real ejecutado acumulado de 57.78% versus un programado de 41.47% encontrándose la obra adelantada y en ejecución.

Para los fines subsiguientes se adjunta:

- 01 File de manila con 190
- Factura electrónica N° E001-104

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente


C.c. SGSyC Crono
GRI File Personal
EWRZ/tbg
Tramite : 36826

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Ing. Edy Wisberto Ruiz Zarate
Gerente Regional de Infraestructura



"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

Belén, 10 de diciembre de 2020



Oficio n. 2272-2020-GRL/GRI/SGSyC

Ingeniero Edi Wisberto Ruiz Zárate
Gerente Regional de Infraestructura
Presente

Asunto: Conformidad de Valorización N°2 de
Obra noviembre de 2020.

Obra: "MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN
LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA,
SAN CARLOS Y ANCASH DEL DISTRITO DE PUINAHUA
PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE
LORETO".

Ref.: a. Informe N°155-2020-GRL-GRI-SGSyC-JAZP
b. Carta N°002-2020-CSHBSA

Tengo el agrado de saludarle cordialmente, a su vez alcanzarle la documentación de la **Valorización n° 02, por ejecución de obra**, que asciende a la suma **S/ 1,283,220.33 soles, (Un Millón Doscientos ochenta y tres mil doscientos veinte con 33/100 soles) sin IGV**, presentado por el supervisor de la obra y su conformidad mediante la referencia b), **correspondiente a noviembre de 2020**, de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización Bruta N° 02	S/ 1,425,800.36
Reajuste neto	S/ 00,000.00
Amortización Adelanto Directo	S/ 142,580.03
Amortización adelanto por materiales	S/ 0.00
Deduc. Reaj. que no corresponde A/D	S/ 0.00
Deduc. Reaj. Que no corresponde A/M	S/ 0.00
Neto a Pagar	S/ 1,283,220.33

Asimismo, la obra a noviembre de 2020 tiene un avance físico acumulado del 57.78%, versus el calendario programado de 41.47%, siendo el estado de la obra adelantada y en ejecución.

Por lo tanto, encontrándose conforme la documentación que sustenta el Inspector, se solicita continuar con el trámite respectivo **a favor de Consorcio Veredas Puinahua**. Adjuntando la Factura Electrónica E001-104

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regional de Infraestructura

Ing. RAUL FLORES AQUEPUCHO
Sub Gerente de Supervisión y Control

Copia: Coordinador de Obra
Ing. José Armando Zumaran Pérez
SGSyC – File de obra (01)
SGSyC – File correlativo (01)
SGSyC – File personal (01)



"Año de la Universalización de la Salud"

INFORME N° 155-2020-GRL/GRI/SGSyC/JAZP

AL : **Ing. Raúl Flores Aquepucho**
Sub Gerente de Supervisión y Control

DE : **Ing. José Armando Zumarán Pérez**
Inspector de Obra

ASUNTO : Remite Valorización N° 02 – Mes de Noviembre 2020.
Obra: **"MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH DEL DISTRITO DE PUINAHUA-PROVINCIA DE REQUENA- DEPARTAMENTO DE LORETO"**. Código Unico 2352929.

REFERENCIA : 1 CARTA N° 002/2020-CSHBSA.
2 CARTA N° 014/2020-CVP.
3 PROVEIDO N° 36826 (SGSyC).

FECHA : Iquitos, 07 de Diciembre de 2020.

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Sub Gerencia de Supervisión y Control

10 DIC 2020

Fecha: 36826 Hora: 8:43 AM

N° Reg: _____

Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo muy cordialmente e informar sobre lo indicado en el asunto.

DATOS GENERALES

Obra : "Mejoramiento de Veredas Peatonales en las Localidades de Huacrachiro, Bellavista, San Carlos y Ancash del Distrito de Puinahua-Provincia de Requena- Departamento de Loreto". Código Unico 2352929.

Entidad : Gobierno Regional de Loreto.

Proceso de Selección : Licitación Pública N° 010-2020-CSO-GRL (PRIMERA CONVOCATORIA).

Contrato : Contrato N° 037-2020-GRL-GRI.

Sistema de Contrato : Contrata a Precios Unitarios.

Otorgamiento de la Buena Pro : 07-Septiembre-2020.

Contratista : CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA.
Integrado por : CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA MC E.I.R.L.
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES MAR & MAR S.A.C.
M.L. CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

Financiamiento : Recursos Ordinarios (Cuenta de Fideicomiso).

Valor Referencial : S/. 2'940,388.11 Sin IGV.

Valor Contractual : S/. 3'019,196.04 Sin IGV.

Fecha del Valor Referencial : Julio de 2020.

Adelanto Directo : S/ 301,920.00 (Septiembre 2020).

Suscripción del Contrato : 22- Septiembre -2020.

Plazo de ejecución Contractual : 90 días calendario.

Fecha de Entrega de Terreno : 07-October-2020.

Fecha de Inicio Contractual : 19-October-2020.

Término de Plazo Contractual : 16-Enero-2021.

Fecha de Recepción de la Obra : .

Residente de Obra : Ing° Jorge Esteban Tocas Quispe.

Inspector de Obra : Ing° José Armando Zumarán Pérez.

Avance Físico Programado : 33.01%.

Avance Físico Prog. Acumul. : 41.47%.



"Año de la Universalización de la Salud"

Avance Físico Real : 48.49%.
Avance Físico Real Acumul. : 57.78%.
Situación actual de la obra : ADELANTADA.

ANTECEDENTES.-

- Con fecha 21 de Setiembre de 2020 se firmó el Contrato N° 035-2020-GRL-GRI de la obra: **"Mejoramiento de Veredas Peatonales en las Localidades de Huacrachiro, Bellavista, San Carlos y Ancash del Distrito de Puinahua-Provincia de Requena-Departamento de Loreto"**.
- Con fecha 07 de Octubre de 2020 se dio por finalizado el acto de Entrega del Terreno en las localidades de Huacrachiro, Bellavista, San Carlos y Ancash.
- De común acuerdo entre las partes, mediante Carta N° 667-2020-GRL/GRI/SGSyC y CARTA N° 005/2020-CVP, de la entidad y del Contratista, respectivamente, se fijó como fecha de inicio de obra el día **19 de Octubre de 2020**.

ANALISIS

Se ha tomado conocimiento de la Valorización N° 02, practicada por el Residente, y presentada mediante documento 2 de la referencia, la cual es presentada por el Supervisor a la Gerencia Regional de Infraestructura mediante el documento 1 de la referencia, cuyo contenido pasamos a evaluar.

De la revisión de las copias del Cuaderno de Obra, el Ing. Residente, Jorge Esteban Tocas Quispe, en su Asiento N° 051 del cuaderno de obra (páginas 52 a 54), de fecha 30 de Noviembre de 2020, presenta los metrados ejecutados, para la elaboración de la Valorización N° 02. El Supervisor, mediante Asiento N° 52 del cuaderno de obra (página 35) aprueba dichos metrados y, en forma conjunta, elaboran la Valorización N° 02 de Noviembre de 2020.

La Valorización N° 02 arroja el siguiente resultado en forma global:

Valorización Contractual	S.	1'425,800.36	
Reajuste Neto		(21,387.01)(*)	
Amortización Adelanto Directo		142,580.03	
Amortización Adelanto Materiales		00.00	
Sub total			1'283,220.33
Retención por Garantía de Fiel Cumplimiento			0.00
TOTAL VALORIZADO S.			1'283,220.33

(*) Este pago será considerado en la liquidación de la obra.


Monto valorización : S/ 1'425,800.36

VALOR ACUMULADO: S/ 2,940,143.08 (sin IGV) AVANCE **48.49%**.

PERIODO	PROGRAMADO			REAL EJECUTADO			ESTADO (adelantada / atrasada)
	PARCIAL	ACUMULADO	% ACUM	PARCIAL	ACUMULADO	% ACUM	
oct-20	248,855.43	248,855.43	8.46%	273,150.74	273,150.74	9.29%	ADELANTADA
nov-20	970,279.00	1,219,134.43	41.47%	1,425,800.36	1,698,951.10	57.78%	ADELANTADA
dic-20	1,376,439.60	2,595,574.03	88.28%				
ene-21	344,569.05	2,940,143.08	100.00%				
feb-21							
	2,940,143.08			1,698,951.10			



"Año de la Universalización de la Salud"

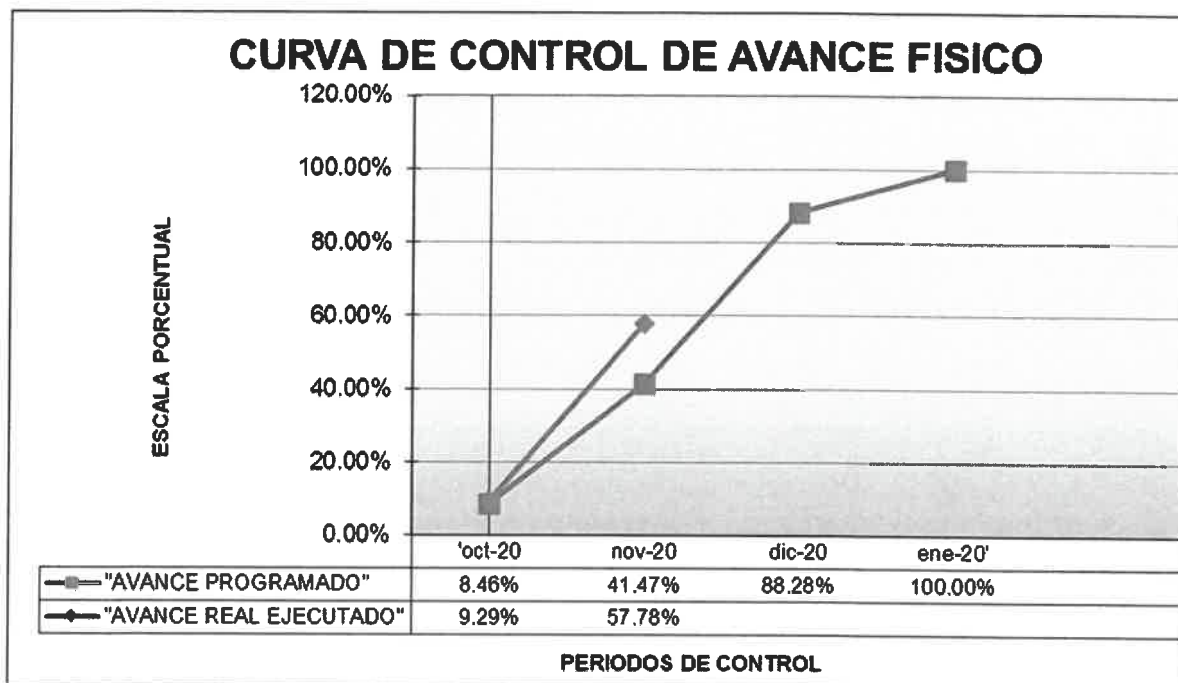

CONCLUSION

Se ha cumplido con presentar toda la documentación pertinente de la Valorización N° 02 del Contratista. De acuerdo al CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA vigente, el porcentaje de avance programado acumulado para el mes de Noviembre 2020 es de 41.47% y el avance de obra acumulado real es de 57.78%, por lo tanto la obra se encuentra **adelantada** en un 16.31%.

RECOMENDACION

Continuar con el trámite respectivo para el pago de la Valorización N° 02 por un monto de **S/ 1'283,220.33 (Un Millón Doscientos Ochenta y Tres Mil Doscientos Veinte y 33/100 Soles)**, correspondiente.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y tramite respectivo.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regional de Infraestructura
Sub. Gerencia de Supervisión y Control

JOSÉ ARMANDO ZUMARAN PÉREZ
Ingeniero Civil
CIR N°10738

José Armando Zumarán Pérez
Ingeniero Civil
N° Reg. Prof.: 10738

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 Sub Gerencia de Supervisión y Control

04 DIC 2020

Fecha: 36826 Hora: 10:17 Am

N° Reg: 7



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

03 DIC 2020

Hora: 3:35 pm

Reg. N°

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

Iquitos, 02 de diciembre del 2020

CARTA N° 002-2020-CSHBSA

Señores:
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ING. EDI WISBERTO RUIZ ZARATE
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 Atención:
 SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 OFICINA DE ADM. DOCUMENTARIA
 UNIDAD TRAMITE DOCUMENTARIO

36826

03 DIC 2020

Hora: _____ Firma: _____

CONTROL

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Asunto Ref.

03 DIC 2020

Hora: 2.35 pm

Reg. N°

REMITE VALORIZACION DE OBRA N° 002
NOVIEMBRE 2020
 : OBRA "MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH, DEL DISTRITO DE PUINAHUA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO"
Carta N° 014/2020-CVP (02-12-2020)

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de remitir la **Valorización de Obra N° 002** correspondiente al mes de **NOVIEMBRE del 2020**, en **01 original y 03 copias**, la misma que se encuentra con un avance físico del 47.22% y un acumulado de 56.27%, cuyo neto a cobrar por el contratista (Ejecutor de Obra) asciende a **S/. 1'304,325.84 (Un Millón Trescientos Cuatro Mil Trescientos Veinticinco con 84/100 Soles)**, de los trabajos ejecutados en la obra: "MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH, DEL DISTRITO DE PUINAHUA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO" por la firma Contratista **CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA**, en el periodo del **01/11/2020 al 30/11/2020**.

A la vez de acuerdo a lo indicado en el asunto, se ha elaborado la solicitud de pago de Obra al mes de **NOVIEMBRE 2020**, cuyo detalle es el siguiente:

1.	Valorización Bruta N° 002 – NOVIEMBRE (2020)	S/. 1'425,800.36
2.	Reajuste Neto (+)	S/. 21,105.51
3.	Amortización de Adelanto Directo (-)	S/. 142,580.03
4.	Amortización de Adelanto Materiales (-)	S/. 0.00
	NETO A FACTURAR	S/. 1'304,325.84
5.	Garantía de Fiel Cumplimiento	S/. 0.00
	NETO A PAGAR	S/. 1'304,325.84

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

JAZHELL ALEXIS FLORES RODRIGUEZ
 Representante Comun

URB. SARGENTO LORES L- 18 IQUITOS-MAYNAS-LORETO

PROVEIDO N° 36826

A: SSGYC - GR

PARA SU ATENCION

CEL: 999369597

03/12/2020

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 02
PERIODO DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020

"MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH, DEL DISTRITO DE PUNAHUA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO"

MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH DEL DISTRITO DEL PUNAHUA

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH- PUNAHUA - REQUENA - LORETO

CONSORCIO VEREDAS PUNAHUA

ING. JORGE ESTEBAN TOCAS QUIBSE

Supervisor

Forma 001 UNICA

Valor Referencial (C/IGV)
Valor Referencial (S/IGV)
Monto Ofertado (S/IGV)
Plazo de Ejecución

S/ 3,469,857.97
S/ 2,940,383.11
S/ 3,079,188.04
: 90 d.c.

14-20

14-20

14-20

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL			ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO			SALDO	
		Und	Medida	Unitario	Parcial	Medida	%	Parcial	Medida	%	Parcial	Medida	%	Medida	Parcial
01.01.01	COMUNIDAD - HUACRACHIRO														
01.01.01	OBRAS PROVISIONALES														
01.01.02	CARTEL DE OBRA DE (3.00 X 2.40M), GIGANTOGRAFIA	und	1.00	960.38	960.38	1.00	100.00%	960.38	1.00	1.00	100.00%	960.38	1.00	1.00	100.00%
01.01.03	ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN	mes	3.00	2,000.00	2,000.00	1.00	33.33%	2,000.00	2,000.00	2,000.00	66.67%	4,000.00	2.00	2,000.00	33.33%
01.01.04	FLETE TERRESTRE	ton	413.42	20.00	8,268.40	2,689.39	70.00%	5,787.88	2,689.39	2,689.39	66.67%	4,000.00	1.00	2,000.00	33.33%
01.01.05	FLETE FLUVIAL	ton	413.42	120.00	49,608.00	16,102.40	70.00%	34,727.28	16,102.40	16,102.40	70.00%	34,727.28	124.03	14,883.60	30.00%
01.01.06	FLETE CARREJO Y DESCARGUIJO	ton	413.42	45.00	18,803.90	289.39	70.00%	13,022.73	289.39	289.39	70.00%	13,022.73	124.03	5,584.35	30.00%
01.01.07	TRANORTE DE MATERIALES	ton	413.42	30.00	12,462.60	289.39	70.00%	8,681.82	289.39	289.39	70.00%	8,681.82	124.03	3,720.90	30.00%
01.02.01	POZA DE ALIENAMIENTO DE AGUA DE LADRILLO TARRAJEADO DE 1.00 X 2.00 X 1.20 TL.	und	2.00	405.58	811.16	-	0.00%	-	2.00	2.00	100.00%	811.16	2.00	811.16	100.00%
01.02.01	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA														
01.02.01	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	GLB	1.00	10,000.00	10,000.00	0.30	30.00%	3,240.00	0.30	0.30	30.00%	3,240.00	0.30	3,240.00	30.00%
01.02.02	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD, DURANTE EL TRABAJO.	GLB	1.00	7,000.00	7,000.00	-	0.00%	-	1.00	1.00	100.00%	7,000.00	1.00	7,000.00	100.00%
01.02.03	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD.	GLB	1.00	2,000.00	2,000.00	-	0.00%	-	1.00	1.00	100.00%	2,000.00	1.00	2,000.00	100.00%
01.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES														
01.03.01	LIQUIDAZION DE TERRENO MANUAL (Con piso, lomo y cunetas)	M2	3,385.30	2.70	9,140.31	3,385.30	100.00%	9,140.31	3,385.30	3,385.30	100.00%	9,140.31	3,385.30	3,385.30	100.00%
01.04.01	TRAZO RIELER Y REPLANTEO	M2	3,385.30	2.69	9,108.46	3,385.30	100.00%	9,108.46	3,385.30	3,385.30	100.00%	9,108.46	3,385.30	3,385.30	100.00%
01.04.01	EXCAVACION DE TERRENO MANUAL	M3	507.80	48.23	24,491.16	-	0.00%	-	442.89	442.89	87.22%	21,360.58	64.91	3,130.61	12.79%
01.04.02	CAMA DE ARENA $\phi = 10$ m., ANTICONTAMINANTE	M3	338.53	106.29	35,923.35	-	0.00%	-	295.26	295.26	87.22%	31,383.19	43.27	4,593.17	12.79%
01.04.03	REVELACION REGADA Y ARIPONADO MANUAL	M2	3,385.30	6.14	20,783.90	-	0.00%	-	2,952.60	2,952.60	87.22%	18,128.96	432.40	2,684.94	12.79%
01.04.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 100% DE LA OBRA <i>cuemillas</i>	M3	338.53	18.29	12,244.13	-	0.00%	-	553.61	553.61	87.22%	10,679.14	81.13	1,565.00	12.79%
01.05.01	VEREDA PEATONAL $\phi = 2.70 \times 2.70$ m	M2	135.41	29.49	3,983.24	-	0.00%	-	118.10	118.10	87.22%	3,482.77	17.31	510.47	12.79%
01.05.02	MORTERO 1:1:2 $\phi = 27$ recubrido con cantinella	M3	685.69	643.77	447,857.01	-	0.00%	-	606.76	606.76	87.22%	590,613.89	88.92	57,244.03	12.79%
01.05.03	ENCERADO Y DESBARRIDO	M2	1,184.99	35.83	42,453.53	-	0.00%	-	1,033.41	1,033.41	87.22%	37,027.08	151.45	5,406.45	12.79%
01.05.04	RELLENOS DE JUNTAS DE DILATACION Y ABLAMIENTO DE 1" X 2" CON MORTERO ASFALTICO Y TECNORIP	M	1,128.43	8.84	10,088.18	-	0.00%	-	8,796.75	8,796.75	87.22%	984.20	144.23	1,889.42	12.79%
01.05.05	CURADO	M2	3,385.30	0.79	2,663.53	-	0.00%	-	2,303.03	2,303.03	87.22%	2,952.60	432.70	337.51	12.79%
01.05.06	BRUNADO	m	4,231.63	1.86	7,870.93	-	0.00%	-	6,864.80	6,864.80	87.22%	3,690.75	540.68	1,006.04	12.79%
01.06.01	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL														
01.06.01	ELABORACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	und	1.00	12,000.00	12,000.00	-	0.00%	-	1.00	1.00	100.00%	12,000.00	1.00	12,000.00	100.00%
01.06.02	PROGRAMAS DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y MITIGACION DE LA CONSTRUCCION	und	1.00	5,000.00	5,000.00	-	0.00%	-	1.00	1.00	100.00%	5,000.00	1.00	5,000.00	100.00%
01.06.03	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS EN LA CONSTRUCCION	und	1.00	5,000.00	5,000.00	-	0.00%	-	1.00	1.00	100.00%	5,000.00	1.00	5,000.00	100.00%
01.06.04	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	und	1.00	7,000.00	7,000.00	-	0.00%	-	1,400.00	1,400.00	20.00%	1,400.00	0.40	2,800.00	40.00%
01.06.05	PLAN DE MONITOREO DE SEGURIDAD AMBIENTAL Y SALUD EN LA CONSTRUCCION	und	1.00	5,000.00	5,000.00	-	0.00%	-	1.00	1.00	100.00%	5,000.00	1.00	5,000.00	100.00%

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA
JAZHELL ALEXIS FLORES RODRIGUEZ
Representante Común

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA
Ing. Miguel Eugenio Delgado Godos
JEFE DE SUPERVISION - CIP 30410

CONSORCIO VEREDAS PUNAHUA
MARCE PASCUAL CORREA MEDINA
REPRESENTANTE COMUN



123

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 02
PERIODO DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020

Obra "MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH, DEL DISTRITO DE PUNAHUA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO"
 LICITACION PUBLICA N° 010-2020-GSO-ORL (PRIMERA CONVOCATORIA)
 MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH DEL DISTRITO DEL PUNAHUA
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH- PUNAHUA - REQUENA - LORETO
 CONSORCIO VEREDAS PUNAHUA
 ING. JORGE ESTEBAN TOCAS QUISEP
 ING. MIGUEL DELGADO GODOZ
 UNICA

Valor Referencial (CIGV)
 Valor Referencial (SIGV)
 Monto Ofertado (SIGV)
 Plazo de Ejecución

S/ 3,488,857.97
 S/ 2,940,388.11
 S/ 3,019,198.04
 : 90 d.c

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL			ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO			BALDO		
		Unid	Metrado	Unitario	Parcial	Metrado	Parcial	%	Metrado	Parcial	%	Metrado	Parcial	%	Metrado	Parcial
01.06.01.06	PROGRAMA DE ABANDONO EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION	und	1.00	15,000.00	15,000.00	-	0.00%	1.00	15,000.00	100.00%	1.00	15,000.00	100.00%	-	-	0.00%
01.06.02.01	MEDIOS DE CONCIERTACION	und	5.00	524.37	2,021.85	-	0.00%	5.00	2,621.85	100.00%	5.00	2,621.85	100.00%	-	-	0.00%
01.06.02.02	LETREOS DE PREVENCIÓN VIAL	und	5.00	506.37	2,531.85	-	0.00%	5.00	2,531.85	100.00%	5.00	2,531.85	100.00%	-	-	0.00%
02.01.01	02 COMUNIDAD - BELLAVISTA															
02.01.01	CARTEL DE OBRA DE (3.60 X 2.40M), GIGANTOGRAFIA	und	1.00	990.38	990.38	1.00	100.00%	1.00	2,000.00	0.00%	1.00	990.38	100.00%	-	-	0.00%
02.01.02	ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN	mes	3.00	2,000.00	6,000.00	1,000.00	16.67%	1.50	3,000.00	33.33%	1.50	3,000.00	50.00%	-	-	50.00%
02.01.03	FILETE TERRESTRE	ton	225.05	20.00	4,501.00	157.54	70.00%	157.54	3,150.70	0.00%	157.54	3,150.70	70.00%	67.51	1,350.20	30.00%
02.01.04	FILETE FLUVIAL	ton	225.05	28.00	6,301.00	37,493.33	70.00%	157.54	37,493.33	0.00%	157.54	37,493.33	70.00%	67.51	13,502.30	30.00%
02.01.05	FILETE CARGUJO	ton	225.05	48.00	10,802.00	157.54	70.00%	157.54	7,089.08	0.00%	157.54	7,089.08	70.00%	67.51	3,037.95	30.00%
02.01.06	TRASLADO DE MATERIALES	ton	225.05	30.00	6,751.50	157.54	70.00%	157.54	4,726.05	0.00%	157.54	4,726.05	70.00%	67.51	3,037.95	30.00%
02.01.07	POZA DE ALIAGRAMIENTO DE AGUA DE LADRILLO TARRAJEADO DE (1.00 X 2.00 X 1.20 m)	und	2.00	405.58	811.16	-	0.00%	2.00	811.16	100.00%	2.00	811.16	100.00%	-	-	0.00%
02.02.01	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	GLB	1.00	10,800.00	10,800.00	3,240.00	30.00%	0.30	3,240.00	30.00%	0.60	6,480.00	60.00%	0.40	4,320.00	40.00%
02.02.02	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD, DURANTE EL TRABAJO.	GLB	1.00	7,000.00	7,000.00	-	0.00%	1.00	7,000.00	100.00%	1.00	7,000.00	100.00%	-	-	0.00%
02.02.03	SEÑALIZACION TEMPORAL, DE SEGURIDAD	GLB	1.00	2,000.00	2,000.00	-	0.00%	1.00	2,000.00	100.00%	1.00	2,000.00	100.00%	-	-	0.00%
02.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES															
02.03.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL (Con pico, limpa y carretilla)	M2	1,833.84	2.70	4,951.37	1,833.84	100.00%	1,833.84	4,951.37	0.00%	1,833.84	4,951.37	100.00%	-	-	0.00%
02.03.02	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO	M2	1,833.84	2.98	4,983.05	1,833.84	100.00%	1,833.84	4,933.03	0.00%	1,833.84	4,933.03	100.00%	-	-	0.00%
02.04.01	EXCAVACION DE TERRENO MANUAL	M3	275.08	48.25	13,267.11	-	0.00%	261.46	12,610.22	95.05%	261.46	12,610.22	95.05%	13.62	656.89	4.95%
02.04.02	CAJAS DE ARENA ø = 0.19 m. - ANTICONTAMINANTE	M3	146.71	108.33	15,883.81	-	0.00%	139.45	14,822.14	95.05%	139.45	14,822.14	95.05%	7.26	771.67	4.95%
02.04.03	NIVELACION REGULADA Y APISONADO MANUAL	M2	1,833.84	6.14	11,259.78	-	0.00%	1,743.08	10,702.51	95.05%	1,743.08	10,702.51	95.05%	90.76	557.27	4.95%
02.04.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 10M. DE LA OBRA, PLANTILLA	M3	343.85	19.29	6,622.87	-	0.00%	326.83	6,304.55	95.05%	326.83	6,304.55	95.05%	17.02	328.32	4.95%
02.05.01	MEZCLA PEGAMENTAL A 10% M	M2	91.89	29.49	2,703.94	-	0.00%	87.15	2,570.05	95.05%	87.15	2,570.05	95.05%	4.54	133.88	4.95%
02.05.02	MORTERO 1:2:10 Kg/cm2	M3	378.85	64.17	24,294.72	-	0.00%	358.20	230,598.41	95.05%	358.20	230,598.41	95.05%	18.65	12,006.31	4.95%
02.05.03	ENCORRACO Y DESENCORRACO	M2	641.84	58.33	37,607.15	-	0.00%	610.08	21,859.17	95.05%	610.08	21,859.17	95.05%	31.76	1,137.96	4.95%
02.05.04	RELLENO DE JUNTAS DE DILATACION Y AISLAMIENTO DE 1" X 1" CON MORTERO ASFALTICO Y TECNICO	M	814.84	8.94	7,285.85	-	0.00%	591.03	5,194.41	94.96%	591.03	5,194.41	94.96%	30.81	279.44	3.04%
02.05.05	CURADO	M2	1,833.84	0.78	1,430.40	-	0.00%	1,743.08	1,359.60	95.05%	1,743.08	1,359.60	95.05%	90.76	70.79	4.95%
02.05.06	BRUNADO	m	2,292.30	1.88	4,288.88	-	0.00%	2,178.85	4,052.66	95.05%	2,178.85	4,052.66	95.05%	113.45	211.02	4.95%
02.06.01	MEASURAS DE MANTENIMIENTO AMBIENTAL															
02.06.01.01	ELABORACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	und	1.00	12,000.00	12,000.00	-	0.00%	1.00	12,000.00	100.00%	1.00	12,000.00	100.00%	-	-	0.00%
02.06.01.02	PROGRAMAS DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y MITIGACION DE LA CONSTRUCCION	und	1.00	5,000.00	5,000.00	-	0.00%	1.00	5,000.00	100.00%	1.00	5,000.00	100.00%	-	-	0.00%
02.06.01.03	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS EN LA CONSTRUCCION	und	1.00	5,000.00	5,000.00	-	0.00%	1.00	5,000.00	100.00%	1.00	5,000.00	100.00%	-	-	0.00%
02.06.01.04	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	und	1.00	7,000.00	7,000.00	-	0.00%	0.20	1,400.00	20.00%	0.40	2,800.00	40.00%	0.60	4,200.00	60.00%
02.06.01.05	PLAN DE MONITORIO DE SEGURIDAD AMBIENTAL Y SALUD EN LA CONSTRUCCION	und	1.00	5,000.00	5,000.00	-	0.00%	1.00	5,000.00	100.00%	1.00	5,000.00	100.00%	-	-	0.00%
02.06.01.06	PROGRAMA DE ABANDONO EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION	und	1.00	15,000.00	15,000.00	-	0.00%	1.00	15,000.00	100.00%	1.00	15,000.00	100.00%	-	-	0.00%
02.06.02.01	MEDIOS DE CONCIERTACION	und	5.00	524.37	2,621.85	-	0.00%	5.00	2,621.85	100.00%	5.00	2,621.85	100.00%	-	-	0.00%
02.06.02.02	LETREOS DE PREVENCIÓN VIAL	und	5.00	506.37	2,531.85	-	0.00%	5.00	2,531.85	100.00%	5.00	2,531.85	100.00%	-	-	0.00%
03.01.01	03 COMUNIDAD - SAN CARLOS															
03.01.01	CARTEL DE OBRA DE (3.60 X 2.40M), GIGANTOGRAFIA	und	1.00	990.38	990.38	1.00	100.00%	1.00	990.38	100.00%	1.00	990.38	100.00%	-	-	0.00%
03.01.02	ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN	mes	3.00	2,000.00	6,000.00	-	0.00%	1.00	2,000.00	33.33%	1.00	2,000.00	33.33%	2.00	4,000.00	66.67%
03.01.03	FILETE TERRESTRE	ton	283.24	20.00	5,664.80	-	0.00%	1.00	2,000.00	3.53%	1.00	2,000.00	3.53%	293.24	5,964.80	100.00%
03.01.04	FILETE FLUVIAL	ton	283.24	283.24	35,188.80	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	293.24	35,188.80	100.00%

CONSORCIO VEREDAS PUNAHUA
 MARCE PASCUAL CORREA MEDINA
 REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA
 Ing. Miguel Eugenio Delgado Godos
 JEFE DE SUPERVISION - CIP 30410

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA
 JAZHELL ALEXIS FLORES RODRIGUEZ
 Representante Com...

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA
 JORGE ESTEBAN TOCAS QUISEP
 INGENIERO CIVIL
 ROB. CIP N° 84892

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA
 JORGE ESTEBAN TOCAS QUISEP
 INGENIERO CIVIL
 ROB. CIP N° 84892

**VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 02
PERIODO DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020**

"MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH, DEL DISTRITO DE PUJINAHUA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO"

LICITACION PUBLICA N° 010-2020-CSC-GRU (PRIMERA CONVOCATORIA)

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH- PUJINAHUA - REQUENA - LORETO

CONSORCIO VEREDAS PUJINAHUA

ING. JORGE ESTEBAN TOCAS QUISEP

Supervisor

Fórmula 001

Valor Referencial (C/IGV)
Valor Referencial (S/IGV)
Monto Oferido (S/IGV)
Plazo de Ejecución

S/. 3,489,657.97
S/. 2,940,388.11
S/. 3,018,198.04
: 60 d.c.

14-20
14-20
14-20

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL			ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO			SALDO		
		Und	Métrico	Unitario	Parcial	Métrico	%	Parcial	Métrico	%	Parcial	Métrico	%	Parcial	Métrico	%
03.01.05	FIETE CARGUJO Y DESCARGUJO	ton	293.24	45.00	13,195.80	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	293.24	13,195.80	100.00%
03.01.06	TRASORTE DE MATERIALES	ton	293.24	30.00	8,797.20	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	293.24	8,797.20	100.00%
03.01.07	POZA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LADRILLO TARRAJEADO DE 1.00 X 2.00 X 1.20 m.	und	2.00	452.38	904.76	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	2.00	904.76	100.00%
03.02.01	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	GLB	1.00	10,800.00	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	0.00%	-	1.00	10,800.00	100.00%
03.02.02	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD, DURANTE EL TRABAJO.	GLB	1.00	7,000.00	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	0.00%	-	1.00	7,000.00	100.00%
03.02.03	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	GLB	1.00	2,000.00	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	0.00%	-	1.00	2,000.00	100.00%
03.03.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL (Con piso, tiempo y camilla)	M2	2,881.95	2.70	7,781.27	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	2,881.95	7,781.27	100.00%
03.03.02	TRAZO NIVELER Y REPLANTEO	M2	2,881.95	2.68	7,724.45	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	2,881.95	7,724.45	100.00%
03.03.03	DEMOLICION DE VEREDA EXISTENTE	m3	1,393.30	16.72	23,285.96	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	1,393.30	23,285.96	100.00%
03.04.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	M3	432.26	48.23	20,848.35	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	432.26	20,848.35	100.00%
03.04.02	EXCAVACION DE TERRENO MANUAL	M3	230.56	106.29	24,506.22	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	230.56	24,506.22	100.00%
03.04.03	CAMA DE ARENA s = 0.10 m - ANTICONTAMINANTE	M2	2,881.95	6.14	17,686.17	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	2,881.95	17,686.17	100.00%
03.04.04	NIVELACION RESADO Y APISADO MANUAL	M2	540.37	19.29	10,423.74	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	540.37	10,423.74	100.00%
03.05.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 10CM. DE LA OBRA	M3	144.10	29.49	4,246.51	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	144.10	4,246.51	100.00%
03.05.02	VEREDA PEATONAL L= 2.00x1.04 m	M2	490.08	643.77	315,489.80	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	490.08	315,489.80	100.00%
03.05.03	MORTERO 1:2:70 Kg/m2	M2	1,008.88	35.63	36,141.00	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	1,008.88	36,141.00	100.00%
03.05.04	RELLENO DE JUNTAS DE DILATACION Y AISLAMIENTO DE 4" X 2" CON MORTERO ASFALTICO Y TECNICO	M	980.85	6.94	6,809.21	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	980.85	6,809.21	100.00%
03.05.05	CURRICO	M2	2,247.95	0.78	1,753.13	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	2,247.95	1,753.13	100.00%
03.05.06	BRUJADO	m	6,896.32	1.86	12,753.13	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	6,896.32	12,753.13	100.00%
03.06.01	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	und	1.00	12,000.00	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	0.00%	-	1.00	12,000.00	100.00%
03.06.02	ELABORACION E IMPL. Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	und	1.00	5,000.00	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	0.00%	-	1.00	5,000.00	100.00%
03.06.03	PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y MITIGACION DE LA CONTAMINACION	und	1.00	5,000.00	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	0.00%	-	1.00	5,000.00	100.00%
03.06.04	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS EN LA CONSTRUCCION	und	1.00	7,000.00	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	0.00%	-	1.00	7,000.00	100.00%
03.06.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	und	1.00	5,000.00	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	0.00%	-	1.00	5,000.00	100.00%
03.06.06	PLAN DE MONITOREO DE SEGURIDAD AMBIENTAL Y SALUD EN LA CONSTRUCCION	und	1.00	5,000.00	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	0.00%	-	1.00	5,000.00	100.00%
03.06.07	PROGRAMA DE ABANDONO EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION	und	1.00	15,000.00	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	0.00%	-	1.00	15,000.00	100.00%
03.06.08	MEDIOS DE CONCIENTIZACION	und	5.00	524.37	2,621.85	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	5.00	2,621.85	100.00%
03.06.09	LETREROS AMBIENTALES	und	5.00	506.37	2,531.85	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	5.00	2,531.85	100.00%
04	CONTRATACION DE PREVENCIÓN VIAL	und	1.00	12,000.00	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	0.00%	-	1.00	12,000.00	100.00%
04.01	CERROS PROVISIONALES	und	1.00	800.38	800.38	1.00	100.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	1.00	800.38	100.00%
04.01.01	CARTEL DE OBRA DE (3.00 X 2.40M). SIGANTOGRAFIA	und	3.00	2,600.00	7,800.00	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	3.00	7,800.00	100.00%
04.01.02	ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN	und	1.00	2,000.00	2,000.00	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	1.00	2,000.00	100.00%
04.01.03	FIETE TERRESTRE	ton	246.58	20.00	4,931.60	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	246.58	4,931.60	100.00%
04.01.04	FIETE FLUVIAL	ton	246.58	120.00	29,589.60	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	246.58	29,589.60	100.00%
04.01.05	FIETE CARGUJO Y DESCARGUJO	ton	246.58	45.00	11,081.10	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	246.58	11,081.10	100.00%
04.01.06	TRASORTE DE MATERIALES	ton	246.58	30.00	7,397.40	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	246.58	7,397.40	100.00%
04.01.07	POZA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LADRILLO TARRAJEADO DE 1.00 X 2.00 X 1.20 m.	und	2.00	405.59	811.18	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	2.00	811.18	100.00%
04.01.08	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	GLB	1.00	10,800.00	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	0.00%	-	1.00	10,800.00	100.00%
04.02.01	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD, DURANTE EL TRABAJO.	GLB	1.00	7,000.00	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	0.00%	-	1.00	7,000.00	100.00%
04.02.02	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	GLB	1.00	2,000.00	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	0.00%	-	1.00	2,000.00	100.00%
04.03	FRANQUEAS PRELIMINARES	M2	2,011.64	2.70	5,431.43	2,011.64	100.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	2,011.64	5,431.43	100.00%
04.03.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL (con piso, tiempo y camilla)	M2	2,011.64	2.69	5,411.31	2,011.64	100.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	2,011.64	5,411.31	100.00%
04.03.02	TRAZO NIVELER Y REPLANTEO	M2	2,011.64	2.69	5,411.31	2,011.64	100.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	2,011.64	5,411.31	100.00%
04.03.03	DEMOLICION DE VEREDA EXISTENTE	m3	1,208.98	16.72	20,180.71	-	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	-	1,208.98	20,180.71	100.00%

1,208.98
20,180.71
311.00%

CONSORCIO VEREDAS PUJINAHUA

MARDE PASCUAL CORREA MEDINA
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

JAZHELL ALEXIS FLORES RODRIGUEZ
Representante Comun

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

ING. Miguel Eugenio Delgado Godos

Reg. C.I.P. N° 8452

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 02
PERIODO DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020

Obra: *MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH, DEL DISTRITO DE PUJINAHUA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO*
 Proceso: LICITACION PUBLICA N° 010-2020-CO-GRL (PRIMERA CONVOCATORIA)
 Meta: MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH DEL DISTRITO DEL PUJINAHUA
 Entidad: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 Ubicación: HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH- PUJINAHUA - REQUENA - LORETO
 Contratista: CONSORCIO VEREDAS PUJINAHUA
 Residente: ING. JORGE ESTEBAN TOCAS QUIRPE
 Supervisor: ING. MIGUEL DELGADO GODOZ
 Fórmula 001: ÚNICA

Valor Referencial (CIGV)
 Valor Referencial (SIGV)
 Monto Ofertado (SIGV)
 Plazo de Ejecución

S/. 3,466,857.97
 S/. 2,840,388.11
 S/. 3,019,196.04
 : 90 d.c.

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL			ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO			SALDO			
		Und	Metrado	Unitario	Metrado	Parcial	%	Metrado	%	Parcial	%	Metrado	%	Parcial	%	Metrado	%
04.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS																
04.04.01	EXCAVACION DE TIENRENO MANUAL	M3	301.75	48.23	14,583.40	-	0.00%	143.13	47.43%	6,903.16	47.43%	143.13	47.43%	6,903.16	47.43%	158.62	52.57%
04.04.02	CAMIA DE ARENA a = 0.10 m. - ANTICONTAMINANTE	M3	100.00	100.00	17,000.00	-	0.00%	76.33	47.43%	8,113.12	47.43%	76.33	47.43%	8,113.12	47.43%	84.60	52.57%
04.04.03	NIVELACION REGLADO Y APISONADO MANUAL	M2	2,011.04	6.14	12,351.47	-	0.00%	954.18	47.43%	5,658.67	47.43%	954.18	47.43%	5,658.67	47.43%	1,057.46	52.57%
04.04.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 100M. DE LA OBRA c/cantilla	M3	377.18	19.28	7,278.80	-	0.00%	178.91	47.43%	3,451.17	47.43%	178.91	47.43%	3,451.17	47.43%	198.27	52.57%
04.05.01	VEREDA PEATONAL x 1.07x4.8 m	M2	100.00	28.48	2,868.10	-	0.00%	47.71	47.43%	1,406.97	47.43%	47.71	47.43%	1,406.97	47.43%	52.87	52.57%
04.05.02	SOLADO, MEZCLA 1:10 = 4"2" medido con cantilla	M2	413.59	843.77	280,126.08	-	0.00%	196.08	47.43%	126,230.42	47.43%	196.08	47.43%	126,230.42	47.43%	217.31	52.57%
04.05.03	MORTERO 1:2:10 kg/cm2	M2	704.07	35.83	25,226.13	-	0.00%	333.96	47.43%	11,965.79	47.43%	333.96	47.43%	11,965.79	47.43%	370.11	52.57%
04.05.04	ENCORRADO Y DEBENCORRADO	M	870.55	8.04	5,984.72	-	0.00%	318.06	47.43%	2,843.46	47.43%	318.06	47.43%	2,843.46	47.43%	352.48	52.57%
04.05.05	RELENO DE JUNTAS DE DILATACION Y AISLAMIENTO DE 1" x 2" CON MORTERO ASFALTICO Y TECNICO	M	2,011.84	0.78	1,568.08	-	0.00%	954.18	47.43%	744.26	47.43%	954.18	47.43%	744.26	47.43%	1,057.46	52.57%
04.05.06	BRUJADO	M	2,514.55	1.86	4,877.05	-	0.00%	1,192.73	47.43%	2,318.48	47.43%	1,192.73	47.43%	2,318.48	47.43%	1,321.62	52.57%
04.06.01	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL																
04.06.01.01	ELABORACION E IMPR. Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	und	1.00	12,000.00	12,000.00	-	0.00%	1.00	100.00%	12,000.00	100.00%	1.00	100.00%	12,000.00	100.00%	-	0.00%
04.06.01.02	PROGRAMAS DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y MITIGACION DE LA CONSTRUCCION	und	1.00	5,000.00	5,000.00	-	0.00%	1.00	100.00%	5,000.00	100.00%	1.00	100.00%	5,000.00	100.00%	-	0.00%
04.06.01.03	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS EN LA CONSTRUCCION	und	1.00	5,000.00	5,000.00	-	0.00%	1.00	100.00%	5,000.00	100.00%	1.00	100.00%	5,000.00	100.00%	-	0.00%
04.06.01.04	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	und	1.00	7,000.00	7,000.00	-	20.00%	0.20	20.00%	1,400.00	20.00%	0.20	20.00%	1,400.00	20.00%	0.60	60.00%
04.06.01.05	PLAN DE MONITOREO DE SEGURIDAD AMBIENTAL Y SALUD EN LA CONSTRUCCION	und	1.00	5,000.00	5,000.00	-	0.00%	1.00	100.00%	5,000.00	100.00%	1.00	100.00%	5,000.00	100.00%	-	0.00%
04.06.01.06	PROGRAMA DE ABANDONO EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION	und	1.00	15,000.00	15,000.00	-	0.00%	1.00	100.00%	15,000.00	100.00%	1.00	100.00%	15,000.00	100.00%	-	0.00%
04.06.02	MEDIOS DE CONCIENCIACION																
04.06.02.01	LETREROS AMBIENTALES	und	5.00	524.37	2,621.85	-	0.00%	5.00	100.00%	2,621.85	100.00%	5.00	100.00%	2,621.85	100.00%	-	0.00%
04.06.02.02	LETREROS DE PREVENCIÓN VIAL	und	5.00	508.37	2,541.85	-	0.00%	5.00	100.00%	2,541.85	100.00%	5.00	100.00%	2,541.85	100.00%	-	0.00%
	TOTAL COSTO DIRECTO	CD			2,450,323.43		9.05%	47.22%		1,186,265.99	47.22%			1,186,265.99	47.22%		
	GASTOS GENERALES	GG	10.00%	CD	245,032.34				22,764.46	116,626.60				141,591.06	56.27%		
	UTILIDAD	UTI	9.99%	CD	244,787.31				22,741.69	116,707.77				141,449.46			
	PLAN COVID				79,052.96												
	SUB TOTAL				3,019,196.04				273,150.74	1,425,800.36				1,698,951.10			
	IGV				3,019,196.04				273,150.74	1,425,800.36				1,698,951.10			
	FACTORES DE RELACION = 1.0000																
	TOTAL PRESUPUESTO = SIGV.				3,019,196.04				273,150.74	1,425,800.36				1,698,951.10			

CONSORCIO VEREDAS PUJINAHUA
 MARCE PASCUAL CORREA MEDINA
 REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA
 Ing. Miguel Eugenio Delgado Godos
 JEFE DE SUPERVISION - CIP 30410

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA
 JAZHELL ALEXIS FLORES RODRIGUEZ
 Representante Común

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA
 JORGE ESTEBAN TOCAS QUIRPE
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 64562

Handwritten initials and marks at the top right corner.

PANEL FOTOGRAFICO



FOTO N° 01: SE OBSERVA CARTEL DE OBRA EN LA COMUNIDAD DE HUACRACHIRO.



FOTO N° 02: SE OBSERVA ENCOFRADO EN VEREDAS, Y EXCAVACIÓN MANUAL EN LA COMUNIDAD DE HUACRACHIRO.

Jirón Túpac Amará 339 – Iquitos – Maynas - Loreto
Celular: 965919190 Teléfono: 065-267140 E-mail: j.mardecorra@gmail.com

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA
[Signature]
JAZHELL ALEXIS FLORES RODRIGUEZ
Representante Comun

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA
[Signature]
Ing. Miguel Eugenio Delgado Godos
JEFE DE SUPERVISIÓN - CIP 30410

[Signature]
JORGE ESTEBAN TOCÁS QUISPE
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 54552

CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA
[Signature]
MARDE PASCUAL CORREA MEDINA
REPRESENTANTE COMUN



FOTO N° 03: SE OBSERVA COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA EN VEREDAS, EN LA COMUNIDAD DE HUACRACHIRO.

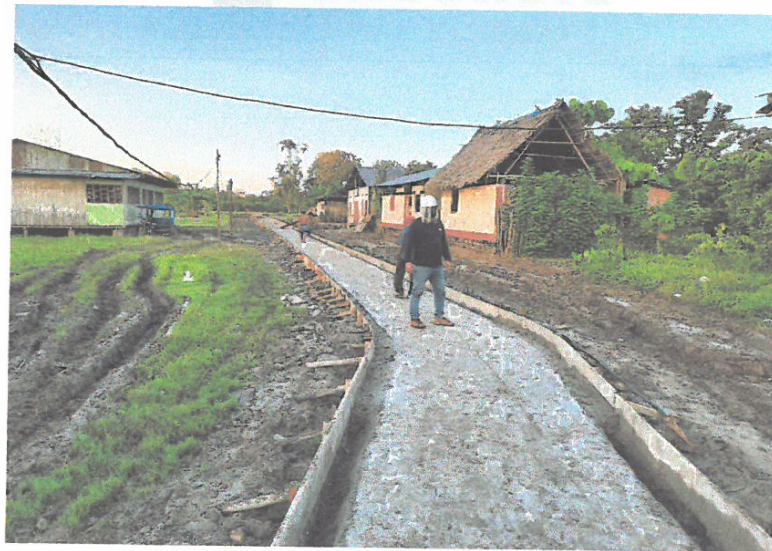



FOTO N° 04: SE OBSERVA VACEO DE SOLADO EN VEREDAS EN VEREDAS, EN LA COMUNIDAD DE HUACRACHIRO.


 **JORGE ESTEBAN TOCÁS QUISPE**
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 54552

Jirón Túpac Amará 339 – Iquitos – Maynas - Loreto
 Celular: 965919190 Teléfono: 065-267140 E-mail: j.mardecorrea@gmail.com

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

JAZHELL ALEXIS FLORES RODRIGUEZ
 Representante Común

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

Ing. Miguel Eugenio Delgado Godos
 JEFE DE SUPERVISIÓN - CIP 30410


CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA

MARDE PASCUAL CORREA MEDINA
 REPRESENTANTE COMUN



FOTO N° 05: SE OBSERVA VISITA A OBRA DEL ING. ZUMARAN DE SUPERVISIÓN DE LA GRIL, EN PRESENCIA DE LA SUPERVISIÓN EN LA COMUNIDAD DE HUACRACHIRO.




FOTO N° 06: SE OBSERVA VACEO DE MORTERO F' C=210 KG/CM2 EN VEREDAS EN LA COMUNIDAD DE HUACRACHIRO.

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

JAZHELL ALEXIS FLORES RODRIGUEZ
Representante Comun

Jirón Túpac Amará 339 – Iquitos – Maynas - Loreto
Celular: 965919190 Teléfono: 065-267140 E-mail: j.mardacorrea@gmail.com

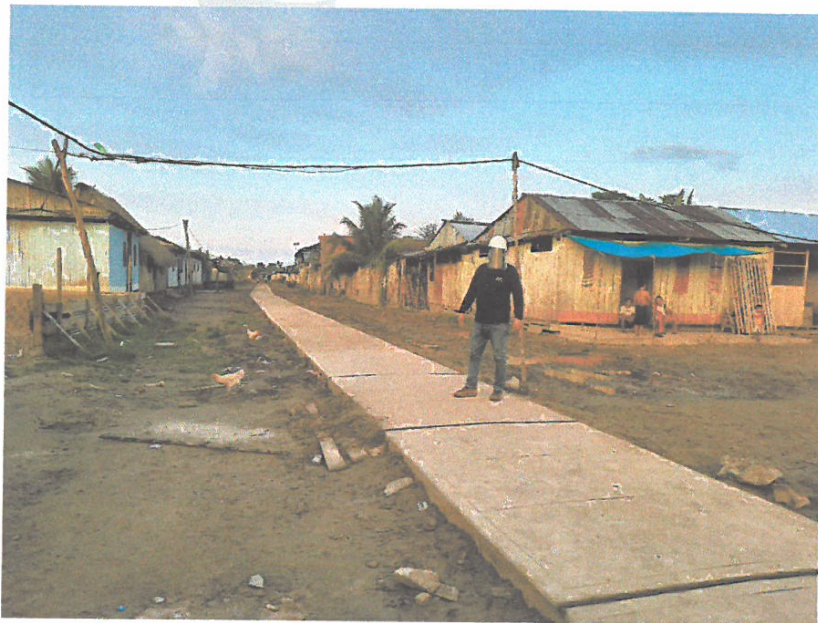CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

Ing. Miguel Eugenio Delgado Godos
JEFE DE SUPERVISION - CIP 30410



JORGE ESTEBAN TOCAS QUISPE
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 54552

CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA

MARDE PASCUAL CORREA MEDINA
REPRESENTANTE COMUN



FOTO N° 07: SE OBSERVA CURADO EN VEREDAS EN LA COMUNIDAD DE HUACRACHIRO.



FOTO N° 08: SE OBSERVA CARTEL DE OBRA EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA.



Jorge Esteban Tocas Quispe
JORGE ESTEBAN TOCAS QUISPE
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 54552

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

Jazhell Alexis Flores Rodriguez

JAZHELL ALEXIS FLORES RODRIGUEZ
Representante Comun

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

Miguel Eugenio Delgado Godos

Ing. Miguel Eugenio Delgado Godos
JEFE DE SUPERVISION - CIP 30410

CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA

Marde Pascual Correa Medina

MARDE PASCUAL CORREA MEDINA
REPRESENTANTE COMUN



FOTO N° 09: SE OBSERVA CARTEL DE OBRA EN LA COMUNIDAD DE ANCASH.



FOTO N° 10: SE OBSERVA TRABAJOS DE ENCOFRADO, EXCAVACIÓN MANUAL, COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA Y VACEO DE SOLADO EN VEREDAS EN LA COMUNIDAD DE ANCASH.

Jirón Túpac Amará 339 - Iquitos - Maynas - Loreto
Celular: 965919190 Teléfono: 065-267140 E-mail: j.mardecorrea@gmail.com

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

JAZHELL ALEXIS FLORES RODRIGUEZ
Representante Común

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

Ing. Miguel Eugenio Delgado Godos
JEFE DE SUPERVISIÓN - CIP 30410



JORGE ESTEBAN TOCAS OJISPE
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 54552

CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA

MARDE PASCUAL CORREA MEDINA
REPRESENTANTE COMUN



FOTO N° 11: SE OBSERVA TRABAJOS DE VACEO DE MORTERO F'C= 210 KG/CM2 EN VEREDAS EN LA COMUNIDAD DE ANCASH.



FOTO N° 12: SE OBSERVA TRABAJOS DE VACEO DE MORTERO F'C= 210 KG/CM2 EN VEREDAS EN LA COMUNIDAD DE ANCASH.

Jirón Túpac Amará 339 – Iquitos – Maynas - Loreto
Celular: 965919190 Teléfono: 065-267140 E-mail: j.mardecorrea@gmail.com

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA
[Signature]
JAZHELL ALEXIS FLORES RODRIGUEZ
Representante Comun

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

[Signature]
Inj. Miguel Eugenio Delgado Godos
JEFE DE SUPERVISIÓN - CIP 30410



[Signature]
JORGE ESTEBAN TOCAS QUISPE
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 54552

CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA
[Signature]
MARDE PASCUAL CORREA MEDINA
REPRESENTANTE COMUN



FOTO N° 13: SE OBSERVA TRABAJOS DE VACEO DE MORTERO F' C= 210 KG/CM2 EN VEREDAS EN LA COMUNIDAD DE ANCASH.



FOTO N° 14: SE OBSERVA CARTEL DE OBRA EN LA COMUNIDAD DE SAN CARLOS.

Jirón Túpac Amará 339 – Iquitos – Maynas - Loreto
Celular: 965919190 Teléfono: 065-267140 E-mail: j.mardecorrea@gmail.com

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

JAZHELL ALEXIS FLORES RODRIGUEZ
Representante Común

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

Ing. Miguel Eugenio Delgado Godos
JEFE DE SUPERVISIÓN - CIP 30410



JORGE ESTEBAN TOCAS QUISPE
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 54552

CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA

MARDE PASCUAL CORREA MEDINA
REPRESENTANTE COMUN



VALORIZACION

N.º 3




"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Belén, 08 de enero de 2021

CARGO

Oficio n° 0067-2021-GRL-GRI-SGSyC

Ingeniero Edi Wisberto Ruiz Zárate
Gerente Regional de Infraestructura
Presente



Asunto: Remite Valorización de Obra n° 03
diciembre 2020 periodo 01.

Obra: "Mejoramiento de Veredas Peatonales en las
Localidades de Huacrachiro, Bellavista, San Carlos y
Ancash, del Distrito de Puinahua, Provincia de
Requena, Departamento de Loreto"

Ref. : a. Informe n° 007-2021-GRL/GRI/SGSyC/JAZP
b. Carta n° 001-2021-CSHBSA
c. Carta n° 001-2021-CVP

Tengo el agrado de saludarle a usted, en
atención a la referencia a), remitirle la valorización n° 03 por ejecución de obra,
correspondiente al mes de diciembre del 2020, revisada y aprobada por el Inspector, la
misma que asciende a la suma de **(S/. 31 819.94)**, de acuerdo al reajuste y
amortización por adelanto directo, consideramos el monto neto a pagar la suma de
Treinta y un mil ochocientos diecinueve con 94/100 Soles y (Cero con 00/100), sin
incluir IGV, de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización bruta n° 03 – diciembre 2020 – periodo 01	S/. 31 819.94
Reajuste	S/. 614.41
Amortización adelanto directo	S/. - 3 181.99
Amortización adelanto materiales	S/. - 29 252.36
Neto a Pagar	S/. 0.00

Asimismo, la obra a diciembre del 2020, tiene un
avance real acumulado ejecutado de 58.87%, versus un avance programado de
88.28%, encontrándose la obra atrasada y en ejecución.

Por lo tanto, encontrándose **conforme** la
documentación que sustenta el Inspector, se solicita continuar con el trámite respectivo.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerente Regional de Infraestructura
Ing. RAUL FLORES AGUPEUCHO
Sub Gerente de Supervisión y Control



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

INFORME N° 007-2021-GRL/GRI/SGSyC/JAZP



AL : **Ing. Raúl Flores Aquepucho**
Sub Gerente de Supervisión y Control

DE : **Ing. José Armando Zumarán Pérez**
Inspector de Obra

ASUNTO : Remite Valorización N° 03 – Mes de Diciembre 2020.
Obra: **"MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH DEL DISTRITO DE PUINAHUA-PROVINCIA DE REQUENA- DEPARTAMENTO DE LORETO"**. Código Unico 2352929.

REFERENCIA : 1 CARTA N° 001/2021-CSHBSA.
2 CARTA N° 001/2021-CVP.
3 PROVEIDO N° 00297 (SGSyC).

FECHA : Iquitos, 08 de Enero de 2021.

Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo muy cordialmente e informar sobre lo indicado en el asunto.

DATOS GENERALES

Obra : "Mejoramiento de Veredas Peatonales en las Localidades de Huacrachiro, Bellavista, San Carlos y Ancash del Distrito de Puinahua-Provincia de Requena- Departamento de Loreto". Código Unico 2352929.

Entidad : Gobierno Regional de Loreto.

Proceso de Selección : Licitación Pública N° 010-2020-CSO-GRL (PRIMERA CONVOCATORIA).

Contrato : Contrato N° 037-2020-GRL-GRI.

Sistema de Contrato : Contrata a Precios Unitarios.

Otorgamiento de la Buena Pro : 07-Septiembre-2020.

Contratista : CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA.
Integrado por : CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA MC E.I.R.L.
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES MAR & MAR S.A.C.
M.L. CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

Financiamiento : Recursos Ordinarios (Cuenta de Fideicomiso).

Valor Referencial : S/. 2'940,388.11 Sin IGV.

Valor Contractual : S/. 3'019,196.04 Sin IGV.

Fecha del Valor Referencial : Julio de 2020.

Adelanto Directo : S/ 301,920.00 (Septiembre 2020).

Suscripción del Contrato : 22- Septiembre -2020.

Plazo de ejecución Contractual : 90 días calendario.

Fecha de Entrega de Terreno : 07-October-2020.

Fecha de Inicio Contractual : 19-October-2020.

Término de Plazo Contractual : 16-Enero-2021.

Fecha de Recepción de la Obra : .

Residente de Obra : Ing° Jorge Esteban Tocas Quispe.

Inspector de Obra : Ing° José Armando Zumarán Pérez.

Avance Físico Programado : 46.81%.

Avance Físico Prog. Acumul. : 88.28%.



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Avance Físico Real : 1.08%.
Avance Físico Real Acumul. : 58.87%.
Situación actual de la obra : ATRASADA.

ANTECEDENTES.-

- Con fecha 21 de Setiembre de 2020 se firmó el Contrato N° 035-2020-GRL-GRI de la obra: **"Mejoramiento de Veredas Peatonales en las Localidades de Huacrachiro, Bellavista, San Carlos y Ancash del Distrito de Puinahua-Provincia de Requena-Departamento de Loreto"**.
- Con fecha 07 de Octubre de 2020 se dio por finalizado el acto de Entrega del Terreno en las localidades de Huacrachiro, Bellavista, San Carlos y Ancash.
- De común acuerdo entre las partes, mediante Carta N° 667-2020-GRL/GRI/SGSyC y CARTA N° 005/2020-CVP, de la entidad y del Contratista, respectivamente, se fijó como fecha de inicio de obra el día **19 de Octubre de 2020**.

ANALISIS

Se ha tomado conocimiento de la Valorización N° 02, practicada por el Residente, y presentada mediante documento 2 de la referencia, la cual es presentada por el Supervisor a la Gerencia Regional de Infraestructura mediante el documento 1 de la referencia, cuyo contenido pasamos a evaluar.

De la revisión de las copias del Cuaderno de Obra, el Ing. Residente, Jorge Esteban Tocas Quispe, en su Asiento N° 051 del cuaderno de obra (páginas 52 a 54), de fecha 30 de Noviembre de 2020, presenta los metrados ejecutados, para la elaboración de la Valorización N° 02. El Supervisor, mediante Asiento N° 52 del cuaderno de obra (página 35) aprueba dichos metrados y, en forma conjunta, elaboran la Valorización N° 02 de Noviembre de 2020.

La Valorización N° 02 arroja el siguiente resultado en forma global:

Valorización Contractual	S.	31,819.94	
Reajuste Neto		614.41	
Amortización Adelanto Directo		3,181.99	
Amortización Adelanto Materiales		29,252.36	
Sub total			0.00
Retención por Garantía de Fiel Cumplimiento			<u>0.00</u>
TOTAL VALORIZADO S.			<u>0.00</u>


(*) Este pago será considerado en la liquidación de la obra.

Monto valorización : S/ 31,819.94
VALOR ACUMULADO: S/ 2,940,143.08 (sin IGV) AVANCE **1.08%**.

PERIODO	PROGRAMADO			REAL EJECUTADO			ESTADO (adelantada / atrasada)
	PARCIAL	ACUMULADO	% ACUM	PARCIAL	ACUMULADO	% ACUM	
oct-20	248,855.43	248,855.43	8.46%	273,150.74	273,150.74	9.29%	ADELANTADA
nov-20	970,279.00	1,219,134.43	41.47%	1,425,800.36	1,698,951.10	57.78%	ADELANTADA
dic-20	1,376,439.60	2,595,574.03	88.28%	31,819.94	1,730,771.04	58.87%	ATRASADA
ene-21	344,569.05	2,940,143.08	100.00%				
feb-21							
	2,940,143.08			1,730,771.04			



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

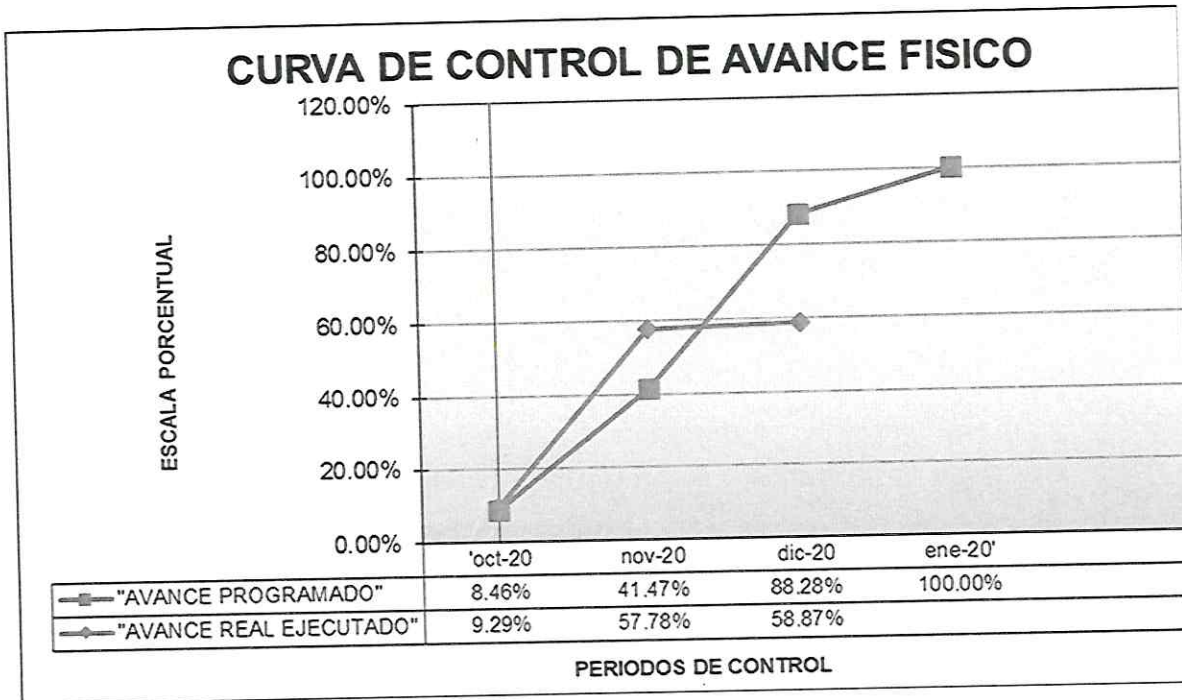

CONCLUSION

Se ha cumplido con presentar toda la documentación pertinente de la Valorización N° 03 del Contratista. De acuerdo al CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA vigente, el porcentaje de avance programado acumulado para el mes de Diciembre 2020 es de 88.28% y el avance de obra acumulado real es de 58.87%, por lo tanto la obra se encuentra **atrasada** en un 29.41%. Cabe precisar que el avance del mes de Diciembre solo es por los diez (10) primeros días, puesto que la obra se encuentra suspendida y, el porcentaje de avance programado acumulado, considerando solo los primeros 10 días del mes de Diciembre, es de 56.57% contra los 58.87% del acumulado ejecutado; por lo tanto, no requiere de reprogramación del calendario.

RECOMENDACION

Continuar con el trámite respectivo para el pago de la Valorización N° 03 por un monto de **S/ 0.00 (Cero y 00/100 Soles)**, correspondiente.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y tramite respectivo.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regional de Infraestructura
Sub. Gerencia de Supervisión y Control

[Handwritten Signature]
JOSE ARMANDO ZUMARAN PEREZ
Ingeniero Civil
CIP N° 10738

José Armando Zumarán Pérez
Ingeniero Civil
N° Reg. Prof.: 10738

00297 of 0067
SECRETARIA GENERAL
A G.E. para
V. 89



CONSORCIO SUPERVISOR HBSA



Loreto, 06 de enero del 2021

CARTA N° 001-2021-CSHBSA

Señores:
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ING. EDI WISBERTO RUIZ ZARATE
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Atención:
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL

Asunto **REMITE VALORIZACION DE OBRA N° 003 DICIEMBRE 2020**
Ref. : OBRA "MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH, DEL DISTRITO DE PUINAHUA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO"
Carta N° 001/2021-CVP (05-01-2021)

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de remitir la **Valorización de Obra N° 003** correspondiente al mes de **DICIEMBRE del 2020**, en **01 original y 03 copias**, la misma que se encuentra con un avance físico del 01.05% y un acumulado de 57.32%, cuyo neto a cobrar por el contratista (Ejecutor de Obra) asciende a **SI. 0.00 (Cero con 00/100 Soles)**, de los trabajos ejecutados en la obra: "MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH, DEL DISTRITO DE PUINAHUA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO" por la firma Contratista **CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA**, en el periodo del **01/12/2020 al 10/12/2020**.

A la vez de acuerdo a lo indicado en el asunto, se ha elaborado la solicitud de pago de Obra al mes de **DICIEMBRE 2020**, cuyo detalle es el siguiente:

1.	Valorización Bruta N° 003 – DICIEMBRE (2020)	SI.	31,819.94
2.	Reajuste Neto (+)	SI.	614.41
3.	Amortización de Adelanto Directo (-)	SI.	3,181.99
4.	Amortización de Adelanto Materiales (-)	SI.	29,252.36
	NETO A FACTURAR	SI.	0.00
5.	Garantía de Fiel Cumplimiento	SI.	0.00
	NETO A PAGAR	SI.	0.00

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

AZHELL ALEXIS FLORES RODRIGUEZ
Representante Comun



04 folios
01 CD
PROVEIDO N° 00297
A: SGS y C
Atencion

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 03
PERIODO DEL 01/12/2020 AL 10/12/2020

"MEJORAMIENTO DE VEREDAS FEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH, DEL DISTRITO DE PUHINAHUA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO"

LICITACION PUBLICA N° 010-2020-GSO-GRU (PRIMERA CONVOCATORIA)
MEJORAMIENTO DE VEREDAS FEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH DEL DISTRITO DEL PUHINAHUA

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH - PUHINAHUA - REQUENA - LORETO

CONSORCIO VEREDAS PUHINAHUA

ING. JORGE ESTEBAN TOCAS QUISPE

ING. MIGUEL DELGADO GODOZ

UNICA

Valor Referencial (C/IGV)
Valor Referencial (S/IGV)
Monto Ojetado (S/IGV)
Plazo de Ejecución

S/ 3,469,657.97
S/ 2,940,388.11
S/ 3,019,156.04
: 90 d.c

JUL-20
JUL-20
JUL-20

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL				ANTERIOR				ACTUAL				ACUMULADO				SALDO	
	Und	Medrado	Unitario	Parcial	Medrado	Parcial	%	Medrado	Parcial	Medrado	Parcial	%	Medrado	Parcial	Medrado	Parcial	%	
COMUNIDAD - HUACRACHIRO																		
1 OBRAS PROVISIONALES																		
2 CARTEL DE OBRA DE (3.60 X 2.40M), GIGANTOGRAFIA	und	1.00	990.38	990.38	1.00	990.38	100.00%	1.00	990.38	1.00	990.38	100.00%	1.00	990.38	1.00	990.38	100.00%	0.00%
3 ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN	mies	3.00	2,000.00	6,000.00	2.00	4,000.00	66.67%	2.00	4,000.00	1.00	2,000.00	33.33%	3.00	6,000.00	3.00	6,000.00	100.00%	0.00%
4 FLETE TERRESTRE	ton	413.42	20.00	8,268.40	289.39	5,787.88	70.00%	289.39	5,787.88	289.39	5,787.88	70.00%	289.39	5,787.88	124.03	2,480.60	30.00%	30.00%
5 FLETE FLUVIAL	ton	413.42	120.00	49,610.40	289.39	34,727.28	70.00%	289.39	34,727.28	289.39	13,022.73	70.00%	289.39	13,022.73	124.03	14,883.60	30.00%	30.00%
6 FLETE CARGUIO Y DESCARGUIO	ton	413.42	45.00	18,603.90	289.39	13,022.73	70.00%	289.39	13,022.73	289.39	8,681.82	70.00%	289.39	8,681.82	124.03	5,581.35	30.00%	30.00%
7 TRASTEO DE MATERIALES	ton	413.42	30.00	12,402.60	289.39	8,681.82	70.00%	289.39	8,681.82	2.00	811.16	100.00%	2.00	811.16	124.03	3,720.90	30.00%	30.00%
8 POZA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LADRILLO TARRAJEADO DE 1.00 X 2.00 X 1.20 m.	und	2.00	405.58	811.16	2.00	811.16	100.00%	2.00	811.16	2.00	811.16	100.00%	2.00	811.16	2.00	811.16	100.00%	0.00%
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA																		
9 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	GLB	1.00	10,800.00	10,800.00	0.60	6,480.00	60.00%	0.60	6,480.00	0.30	3,240.00	30.00%	0.90	9,720.00	0.10	1,080.00	10.00%	10.00%
10 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD, DURANTE EL TRABAJO	GLB	1.00	7,000.00	7,000.00	1.00	7,000.00	100.00%	1.00	7,000.00	1.00	7,000.00	100.00%	1.00	7,000.00	1.00	7,000.00	100.00%	0.00%
11 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD.	GLB	1.00	2,000.00	2,000.00	1.00	2,000.00	100.00%	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	100.00%	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	100.00%	0.00%
12 TERCEROS EXPLUMINARES																		
13 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL. (Con pico, lampa y cargatilla)	M2	3,385.30	2.70	9,140.31	3,385.30	9,140.31	100.00%	3,385.30	9,140.31	3,385.30	9,140.31	100.00%	3,385.30	9,140.31	3,385.30	9,140.31	100.00%	0.00%
14 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO	M2	3,385.30	2.69	9,106.46	3,385.30	9,106.46	100.00%	3,385.30	9,106.46	3,385.30	9,106.46	100.00%	3,385.30	9,106.46	3,385.30	9,106.46	100.00%	0.00%
15 MOVIMIENTO DE TIERRAS																		
16 EXCAVACION DE TERRENO MANUAL	M3	507.60	48.23	24,481.19	442.89	21,360.58	87.22%	442.89	21,360.58	442.89	21,360.58	87.22%	442.89	21,360.58	64.91	3,130.61	12.78%	12.78%
17 CANA DE ARENA e = 0.10 m. - ANTICONTAMINANTE	M3	338.53	106.29	35,982.35	295.26	31,383.19	87.22%	295.26	31,383.19	295.26	31,383.19	87.22%	295.26	31,383.19	43.27	4,599.17	12.78%	12.78%
18 NIVELACION REGLADO Y APISONADO MANUAL	M2	3,385.00	6.14	20,783.90	2,952.60	18,128.96	87.23%	2,952.60	18,128.96	2,952.60	18,128.96	87.23%	2,952.60	18,128.96	432.40	2,654.94	12.77%	12.77%
19 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 100M. DE LA OBRA c/carrilla	M3	634.74	19.29	12,244.13	553.61	10,679.14	87.22%	553.61	10,679.14	553.61	10,679.14	87.22%	553.61	10,679.14	81.13	1,565.00	12.78%	12.78%
20 VEREDA FEATONAL L = 2,172.51 m																		
21 SOLADO MEZCLA 1:10 e=2", vaciado con carrilla	M2	135.41	29.49	3,993.24	118.10	3,482.77	87.22%	118.10	3,482.77	118.10	3,482.77	87.22%	118.10	3,482.77	17.31	510.47	12.78%	12.78%
22 MORTERO 1:2:10 Kg/cm2	M3	655.68	643.77	421,857.91	606.76	390,613.89	87.22%	606.76	390,613.89	606.76	390,613.89	87.22%	606.76	390,613.89	86.92	57,244.03	12.78%	12.78%
23 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	1,184.66	35.63	42,453.53	1,033.41	37,027.08	87.22%	1,033.41	37,027.08	1,033.41	37,027.08	87.22%	1,033.41	37,027.08	151.45	5,426.45	12.78%	12.78%
24 RELLENO DE JUNTAS DE DILATACION Y AISLAMIENTO DE 1" X 2" CON MORTERO ASFALTICO Y TECNOPUR	M	1,128.43	8.94	10,083.16	984.20	8,798.75	87.22%	984.20	8,798.75	984.20	8,798.75	87.22%	984.20	8,798.75	144.23	1,289.42	12.78%	12.78%
25 CURADO	M2	3,385.30	0.78	2,640.53	2,952.60	2,303.03	87.22%	2,952.60	2,303.03	2,952.60	2,303.03	87.22%	2,952.60	2,303.03	432.70	337.51	12.78%	12.78%
26 BRUNADO	m	4,231.63	1.86	7,870.83	3,690.75	6,864.80	87.22%	3,690.75	6,864.80	3,690.75	6,864.80	87.22%	3,690.75	6,864.80	540.88	1,006.04	12.78%	12.78%
27 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL																		
28 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL																		
29 ELABORACION E IMPL. Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	und	1.00	12,000.00	12,000.00	1.00	12,000.00	100.00%	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	100.00%	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	100.00%	0.00%
30 PROGRAMAS DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y MITIGACION DE LA CONSTRUCCION	und	1.00	5,000.00	5,000.00	1.00	5,000.00	100.00%	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	100.00%	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	100.00%	0.00%
31 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS EN LA CONSTRUCCION	und	1.00	5,000.00	5,000.00	1.00	5,000.00	100.00%	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	100.00%	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	100.00%	0.00%
32 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	und	1.00	7,000.00	7,000.00	0.40	2,800.00	40.00%	0.40	2,800.00	0.40	2,800.00	40.00%	0.40	2,800.00	0.20	1,400.00	20.00%	20.00%
33 PLAN DE MONITOREO DE SEGURIDAD AMBIENTAL Y SALUD EN LA CONSTRUCCION	und	1.00	5,000.00	5,000.00	1.00	5,000.00	100.00%	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	100.00%	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	100.00%	0.00%

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA
JAZHELL ALEXIS FLORES RODRIGUEZ
Representante Común

CONSORCIO VEREDAS PUHINAHUA
INGENIERO CIVIL
R.G. CIP N° 55578
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA
Ing. Miguel Eugenio Delgado Godos
JEFE DE SUPERVISION - CIP 30410

118

"MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH, PROVINCIA DE PUNAHUA, DEPARTAMENTO LORETO"
 LICITACION PUBLICA N° 010-2020-CSO-GRU (PRIMERA CONVOCATORIA)
 MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH DEL DISTRITO DEL DISTRITO DEL PUNAHUA
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH- PUNAHUA - REQUENA - LORETO
 CONSORCIO VEREDAS PUNAHUA
 ING. JORGE ESTEBAN TOCAS QUISEP
 ING. MIGUEL DELGADO GODOS
 UNICA

Valor Referencial (CIIG)
 Valor Referencial (SIIGV)
 Monto Otorgado (SIIGV)
 Plazo de Ejecución

S/ 3,469,657.97
 S/ 2,940,388.11
 S/ 3,019,198.04
 : 50 d.c

DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL			ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO			SALDO		
	Und	Mezrado	Unitario	Parcial	Mezrado	Parcial	Mezrado	Parcial	Mezrado	Parcial	Mezrado	Parcial	Mezrado	Parcial	%
				%											
PROGRAMA DE ABANDONO EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION	und	1.00	15,000.00	15,000.00	1.00	15,000.00	100.00%	-	-	0.00%	15,000.00	-	-	-	0.00%
MEDIOS DE CONCIERTIZACION	und	5.00	524.37	2,621.85	5.00	2,621.85	100.00%	-	-	0.00%	2,621.85	-	-	-	0.00%
LETREROS DE PREVENCIÓN VIAL	und	5.00	506.37	2,531.85	5.00	2,531.85	100.00%	-	-	0.00%	2,531.85	-	-	-	0.00%
COMUNIDAD - BELLAVISTA	und	1.00	990.38	990.38	1.00	990.38	100.00%	-	-	0.00%	990.38	-	-	-	0.00%
GERAS PROVISIONALES	mes	3.00	2,000.00	6,000.00	1.50	3,000.00	50.00%	-	-	33.33%	5,000.00	0.50	1,000.00	1,000.00	16.67%
CARTEL DE OBRA DE (3.60 X 2.40M), GIGANTOGRAFIA	lon	235.05	20.00	4,701.00	157.54	3,150.70	70.00%	-	-	0.00%	3,150.70	67.51	16,067.38	16,067.38	30.00%
ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN	lon	235.05	238.00	55,861.90	157.54	37,493.33	70.00%	-	-	0.00%	37,493.33	67.51	1,350.20	1,350.20	30.00%
FLETE TERRESTRE	lon	225.05	45.00	10,125.25	157.54	7,089.08	70.00%	-	-	0.00%	7,089.08	67.51	3,037.95	3,037.95	30.00%
FLETE FLUVIAL	lon	225.05	25.00	5,626.25	157.54	24,726.05	70.00%	-	-	0.00%	24,726.05	67.51	2,025.30	2,025.30	30.00%
FLETE CARGUIJO Y DESCARGUIJO	lon	225.05	45.00	10,125.25	157.54	7,089.08	70.00%	-	-	0.00%	7,089.08	67.51	3,037.95	3,037.95	30.00%
TRASORTE DE MATERIALES	lon	225.05	25.00	5,626.25	157.54	24,726.05	70.00%	-	-	0.00%	24,726.05	67.51	2,025.30	2,025.30	30.00%
POZA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LADRILLO TARRAJERADO DE 1.00 X 2.00 X 1.20 m.	und	2.00	405.38	811.16	2.00	811.16	100.00%	-	-	0.00%	811.16	-	-	-	0.00%
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	GLB	1.00	10,800.00	10,800.00	0.60	6,480.00	60.00%	-	-	30.00%	9,720.00	0.10	1,080.00	1,080.00	10.00%
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	GLB	1.00	7,000.00	7,000.00	1.00	7,000.00	100.00%	-	-	0.00%	7,000.00	-	-	-	0.00%
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD, DURANTE EL TRABAJO	GLB	1.00	2,000.00	2,000.00	1.00	2,000.00	100.00%	-	-	0.00%	2,000.00	-	-	-	0.00%
SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	GLB	1.00	2,000.00	2,000.00	1.00	2,000.00	100.00%	-	-	0.00%	2,000.00	-	-	-	0.00%
TRABAJOS PRELIMINARES	M2	1,833.84	2.70	4,951.37	1,833.84	4,951.37	100.00%	-	-	0.00%	4,951.37	-	-	-	0.00%
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL (Con pico, lampa y carretilla)	M2	1,833.84	2.69	4,933.03	1,833.84	4,933.03	100.00%	-	-	0.00%	4,933.03	-	-	-	0.00%
TRAZO NIVELES Y REPLANTEO	M3	275.08	48.23	13,267.11	261.46	12,610.22	95.05%	0.34	16.40	0.12%	12,626.62	13.28	640.49	640.49	4.83%
MOVIMIENTO DE TIERRAS	M3	145.71	109.29	15,908.81	139.45	14,822.14	95.05%	0.18	19.13	0.12%	14,841.27	7.08	752.53	752.53	4.83%
EXCAVACION DE TERRENO MANUAL	M2	1,833.84	6.14	11,297.78	1,743.08	10,702.51	95.05%	2.25	13.82	0.12%	10,716.33	88.51	543.45	543.45	4.83%
CAMA DE ARENA e = 0.10 m. - ANTICONTAMINANTE	M3	343.85	19.29	6,632.87	326.83	6,304.55	95.05%	0.42	8.10	0.12%	6,312.65	16.60	320.21	320.21	4.83%
NIVELACION REGLADO Y APISONADO MANUAL	M2	91.69	29.49	2,703.94	87.15	2,570.05	95.05%	0.11	3.24	0.12%	2,573.29	4.43	130.64	130.64	4.83%
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 100M. DE LA OBRA	M3	376.63	64.77	24,204.72	358.20	23,058.41	95.05%	0.46	296.13	0.12%	23,089.154	18.19	1,109.66	1,109.66	4.83%
VEREDA PEATONAL L = 916.92 M	M2	641.84	35.83	22,997.13	610.08	21,659.17	95.05%	0.79	28.31	0.12%	21,687.48	30.97	1,096.66	1,096.66	4.83%
SOLADO MEZCLA 1:1:0 e=2" vacado con carretilla	M2	8.94	8.94	5,695.85	581.03	5,194.41	94.96%	0.75	6.71	0.12%	5,201.12	30.06	268.74	268.74	4.91%
MORTERO 1c=210 Kg/cm2	M2	1,833.84	0.78	1,430.40	1,743.08	1,359.60	95.05%	2.25	1.76	0.12%	1,745.33	69.04	69.04	69.04	4.83%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M	2,292.30	1.86	4,263.68	2,178.85	4,052.66	95.05%	2.81	5.23	0.12%	4,057.89	110.64	205.79	205.79	4.83%
RELLENO DE JUNTAS DE DILATACION Y AISLAMIENTO DE 1" X 2" CON MORTERO ASFALTICO Y TECNOP	m	1.00	12,000.00	12,000.00	1.00	12,000.00	100.00%	-	-	0.00%	12,000.00	-	-	-	0.00%
CURADO	und	1.00	5,000.00	5,000.00	1.00	5,000.00	100.00%	-	-	0.00%	5,000.00	-	-	-	0.00%
BRUNDO	und	1.00	7,000.00	7,000.00	1.00	7,000.00	100.00%	-	-	0.00%	7,000.00	-	-	-	0.00%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	und	1.00	5,000.00	5,000.00	1.00	5,000.00	100.00%	-	-	0.00%	5,000.00	-	-	-	0.00%
MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL	und	1.00	5,000.00	5,000.00	1.00	5,000.00	100.00%	-	-	0.00%	5,000.00	-	-	-	0.00%
ELABORACION E IMPL. Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	und	1.00	5,000.00	5,000.00	1.00	5,000.00	100.00%	-	-	0.00%	5,000.00	-	-	-	0.00%
PROGRAMAS DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y MITIGACION DE LA CONSTRUCCION	und	1.00	5,000.00	5,000.00	1.00	5,000.00	100.00%	-	-	0.00%	5,000.00	-	-	-	0.00%
PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS EN LA CONSTRUCCION	und	1.00	7,000.00	7,000.00	1.00	7,000.00	100.00%	-	-	0.00%	7,000.00	-	-	-	0.00%
CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	und	1.00	5,000.00	5,000.00	1.00	5,000.00	100.00%	-	-	0.00%	5,000.00	-	-	-	0.00%
PLAN DE MONITOREO DE SEGURIDAD AMBIENTAL Y SALUD EN LA CONSTRUCCION	und	1.00	5,000.00	5,000.00	1.00	5,000.00	100.00%	-	-	0.00%	5,000.00	-	-	-	0.00%
PROGRAMA DE ABANDONO EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION	und	1.00	15,000.00	15,000.00	1.00	15,000.00	100.00%	-	-	0.00%	15,000.00	-	-	-	0.00%
MEDIOS DE CONCIERTIZACION	und	5.00	524.37	2,621.85	5.00	2,621.85	100.00%	-	-	0.00%	2,621.85	-	-	-	0.00%
LETREROS AMBIENTALES	und	5.00	506.37	2,531.85	5.00	2,531.85	100.00%	-	-	0.00%	2,531.85	-	-	-	0.00%
COMUNIDAD - SAN CARLOS	und	1.00	990.38	990.38	1.00	990.38	100.00%	-	-	0.00%	990.38	-	-	-	0.00%
GERAS PROVISIONALES	mes	3.00	2,000.00	6,000.00	1.00	3,000.00	50.00%	-	-	33.33%	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	16.67%
CARTEL DE OBRA DE (3.60 X 2.40M), GIGANTOGRAFIA	lon	235.05	20.00	4,701.00	157.54	3,150.70	70.00%	-	-	0.00%	3,150.70	67.51	16,067.38	16,067.38	30.00%
ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN	lon	235.05	238.00	55,861.90	157.54	37,493.33	70.00%	-	-	0.00%	37,493.33	67.51	1,350.20	1,350.20	30.00%
FLETE TERRESTRE	lon	225.05	45.00	10,125.25	157.54	7,089.08	70.00%	-	-	0.00%	7,089.08	67.51	3,037.95	3,037.95	30.00%
FLETE FLUVIAL	lon	225.05	25.00	5,626.25	157.54	24,726.05	70.00%	-	-	0.00%	24,726.05	67.51	2,025.30	2,025.30	30.00%
FLETE CARGUIJO Y DESCARGUIJO	lon	225.05	45.00	10,125.25	157.54	7,089.08	70.00%	-	-	0.00%	7,089.08	67.51	3,037.95	3,037.95	30.00%
TRASORTE DE MATERIALES	lon	225.05	25.00	5,626.25	157.54	24,726.05	70.00%	-	-	0.00%	24,726.05	67.51	2,025.30	2,025.30	30.00%
POZA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LADRILLO TARRAJERADO DE 1.00 X 2.00 X 1.20 m.	und	2.00	405.38	811.16	2.00	811.16	100.00%	-	-	0.00%	811.16	-	-	-	0.00%
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	GLB	1.00	10,800.00	10,800.00	0.60	6,480.00	60.00%	0.30	3,240.00	30.00%	9,720.00	0.10	1,080.00	1,080.00	10.00%
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	GLB	1.00	7,000.00	7,000.00	1.00	7,000.00	100.00%	-	-	0.00%	7,000.00	-	-	-	0.00%
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD, DURANTE EL TRABAJO	GLB	1.00	2,000.00	2,000.00	1.00	2,000.00	100.00%	-	-	0.00%	2,000.00	-	-	-	0.00%
SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	GLB	1.00	2,000.00	2,000.00	1.00	2,000.00	100.00%	-	-	0.00%	2,000.00	-	-	-	0.00%
TRABAJOS PRELIMINARES	M2	1,833.84	2.70	4,951.37	1,833.84	4,951.37	100.00%	-	-	0.00%	4,951.37	-	-	-	0.00%
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL (Con pico, lampa y carretilla)	M2	1,833.84	2.69	4,933.03	1,833.84	4,933.03	100.00%	-	-	0.00%	4,933.03	-	-	-	0.00%
TRAZO NIVELES Y REPLANTEO	M3	275.08	48.23	13,267.11	261.46	12,610.22	95.05%	0.34	16.40	0.12%	12,626.62	13.28	640.49	640.49	4.83%
MOVIMIENTO DE TIERRAS	M3	145.71	109.29	15,908.81	139.45	14,822.14	95.05%	0.18	19.13	0.12%	14,841.27	7.08	752.53	752.53	4.83%
EXCAVACION DE TERRENO MANUAL	M2	1,833.84	6.14	11,297.78	1,743.08	10,702.51	95.05%	2.25	13.82	0.12%	10,716.33	88.51	543.45	543.45	4.83%
NIVELACION REGLADO Y APISONADO MANUAL	M3	343.85	19.29	6,632.87	326.83	6,304.55	95.05%	0.42	8.10	0.12%	6,312.65	16.60	320.21	320.21	4.83%
VEREDA PEATONAL L = 916.92 M	M2	91.69	29.49	2,703.94	87.15	2,570.05	95.05%	0.11	3.24	0.12%	2,573.29	4.43	130.64	130.64	4.83%
SOLADO MEZCLA 1:1:0 e=2" vacado con carretilla	M3	376.63	64.77	24,204.72	358.20	23,058.41	95.05%	0.46	296.13	0.12%	23,089.154	18.1			

JAZHELL ALEXIS FLORES RODRIGUEZ
Representante Comun

Ing. Miguel Eugenio Delgado Godos
JEFE DE SUPERVISIÓN - CIP 30410

"MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVIDA, SAN CARLOS Y ANCASH, DEL DISTRITO DE PUJINAHUA, PROVINCIA DE REQENA, DEPARTAMENTO LORETO"

PERIODO DEL 01/12/2020 AL 10/12/2020

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 03

Valor Referencial (CIGV) S/ 3,489,657.97
Valor Referencial (SIGV) S/ 2,940,388.11
Monto Ofertado (SIGV) S/ 3,019,193.04
Plazo de Ejecución : 50 d.c

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
CONSORCIO VEREDAS PUJINAHUA
ING. JORGE ESTEBAN TOCAS QUISPE
ING. MIGUEL DELGADO GODOS
UNICA

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL			ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO			SALDO		
	Und	Medrado	Unitario	Medrado	Parcial	%	Medrado	Parcial	%	Medrado	Parcial	%	Medrado	Parcial	%
	FLETE CARGUO Y DESCARGUO	ton	293.24	45.00	13,195.80	-	0.00%	-	-	0.00%	293.24	13,195.80	100.00%	-	-
TRASISTE DE MATERIALES	ton	30.00	30.00	8,797.20	-	0.00%	-	-	0.00%	293.24	8,797.20	100.00%	-	-	0.00%
POZA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LADRILLO TARRAJEADO DE 1.00 X 2.00 X 1.20 m.	und	2.00	495.58	811.16	-	0.00%	-	-	0.00%	2.00	811.16	100.00%	-	-	0.00%
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	GLB	1.00	10,800.00	10,800.00	-	0.00%	-	-	0.00%	1.00	10,800.00	100.00%	-	-	0.00%
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	GLB	1.00	7,000.00	7,000.00	-	0.00%	-	-	0.00%	1.00	7,000.00	100.00%	-	-	0.00%
RECURSOS PARA PREGUNTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD, DURANTE EL TRABAJO	GLB	1.00	2,000.00	2,000.00	-	0.00%	-	-	0.00%	1.00	2,000.00	100.00%	-	-	0.00%
SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	GLB	1.00	2,000.00	2,000.00	-	0.00%	-	-	0.00%	1.00	2,000.00	100.00%	-	-	0.00%
TRABAJOS PRELIMINARES	M2	2,881.95	2.70	7,781.27	-	0.00%	-	-	0.00%	2,881.95	7,781.27	100.00%	-	-	0.00%
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL. (Con pico, lampa y carretilla)	M2	2,881.95	2.69	7,752.45	-	0.00%	-	-	0.00%	2,881.95	7,752.45	100.00%	-	-	0.00%
TRAZO NIVELES Y REPLANTEO	M3	1,393.30	16.72	23,295.98	-	0.00%	-	-	0.00%	1,393.30	23,295.98	100.00%	-	-	0.00%
DEMOLICION DE VEREDA EXISTENTE	M3	432.29	48.23	20,849.35	-	0.00%	-	-	0.00%	432.29	20,849.35	100.00%	-	-	0.00%
MOVIMIENTO DE TIERRAS	M3	230.56	108.29	24,950.22	-	0.00%	-	-	0.00%	230.56	24,950.22	100.00%	-	-	0.00%
EXCAVACION DE TERRENO MANUAL	M2	2,881.95	6.14	17,695.17	-	0.00%	-	-	0.00%	2,881.95	17,695.17	100.00%	-	-	0.00%
CAMA DE ARENA e=0.10 m. - ANTICONTAMINANTE	M3	540.37	19.29	10,423.74	-	0.00%	-	-	0.00%	540.37	10,423.74	100.00%	-	-	0.00%
NIVELACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 100M. DE LA OBRA c/carretilla	M2	144.10	28.49	4,249.51	-	0.00%	-	-	0.00%	144.10	4,249.51	100.00%	-	-	0.00%
ELIMINACION DE JUNTAS DE DILATACION Y AISLAMIENTO DE 1" X 2" CON MORTERO ASFALTICO Y TECNORO	M3	490.08	63.77	31,545.80	-	0.00%	-	-	0.00%	490.08	31,545.80	100.00%	-	-	0.00%
SOLADO MEZCLA 1:10 e=2" vacado con carretilla	M2	1,008.68	35.83	36,141.00	-	0.00%	-	-	0.00%	1,008.68	36,141.00	100.00%	-	-	0.00%
MORTERO f=210 Kg/cm2	M	960.65	8.84	8,588.21	-	0.00%	-	-	0.00%	960.65	8,588.21	100.00%	-	-	0.00%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	2,881.95	0.78	2,247.92	-	0.00%	-	-	0.00%	2,881.95	2,247.92	100.00%	-	-	0.00%
RELLENO DE JUNTAS DE DILATACION Y AISLAMIENTO DE 1" X 2" CON MORTERO ASFALTICO Y TECNORO	m	6,856.52	1.86	12,753.13	-	0.00%	-	-	0.00%	6,856.52	12,753.13	100.00%	-	-	0.00%
CURADO	und	5.00	524.37	2,621.85	-	0.00%	-	-	0.00%	5.00	2,621.85	100.00%	-	-	0.00%
BRUNADO	und	5.00	506.37	2,531.85	-	0.00%	-	-	0.00%	5.00	2,531.85	100.00%	-	-	0.00%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	und	1.00	12,000.00	12,000.00	-	0.00%	-	-	0.00%	1.00	12,000.00	100.00%	-	-	0.00%
MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL	und	1.00	5,000.00	5,000.00	-	0.00%	-	-	0.00%	1.00	5,000.00	100.00%	-	-	0.00%
ELABORACION E IMPL. Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	und	1.00	5,000.00	5,000.00	-	0.00%	-	-	0.00%	1.00	5,000.00	100.00%	-	-	0.00%
PROGRAMAS DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y MITIGACION DE LA CONSTRUCCION	und	1.00	5,000.00	5,000.00	-	0.00%	-	-	0.00%	1.00	5,000.00	100.00%	-	-	0.00%
PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS EN LA CONSTRUCCION	und	1.00	7,000.00	7,000.00	-	0.00%	-	-	0.00%	1.00	7,000.00	100.00%	-	-	0.00%
CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	und	1.00	5,000.00	5,000.00	-	0.00%	-	-	0.00%	1.00	5,000.00	100.00%	-	-	0.00%
PLAN DE MONITOREO DE SEGURIDAD AMBIENTAL Y SALUD EN LA CONSTRUCCION	und	1.00	5,000.00	5,000.00	-	0.00%	-	-	0.00%	1.00	5,000.00	100.00%	-	-	0.00%
PROGRAMA DE ABANDONO EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION	und	1.00	15,000.00	15,000.00	-	0.00%	-	-	0.00%	1.00	15,000.00	100.00%	-	-	0.00%
MEDIOS DE CONCIENTIZACION	und	5.00	524.37	2,621.85	-	0.00%	-	-	0.00%	5.00	2,621.85	100.00%	-	-	0.00%
LETREEROS AMBIENTALES	und	5.00	506.37	2,531.85	-	0.00%	-	-	0.00%	5.00	2,531.85	100.00%	-	-	0.00%
LETREEROS DE PREVENCIÓN VIAL	und	5.00	506.37	2,531.85	-	0.00%	-	-	0.00%	5.00	2,531.85	100.00%	-	-	0.00%
COMUNIDAD - ANCASH	und	1.00	990.38	990.38	-	0.00%	-	-	0.00%	1.00	990.38	100.00%	-	-	0.00%
OBRAS PROVISIONALES	und	3.00	2,000.00	6,000.00	-	0.00%	-	-	0.00%	3.00	6,000.00	100.00%	-	-	0.00%
CARTEL DE OBRA DE (3.60 X 2.40M). GIGANTOGRAFIA	m2	248.58	20.00	4,971.60	-	0.00%	-	-	0.00%	248.58	4,971.60	100.00%	-	-	0.00%
ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN	ton	248.58	120.00	29,829.60	-	0.00%	-	-	0.00%	248.58	29,829.60	100.00%	-	-	0.00%
FLETE TERRESTRE	ton	248.58	120.00	29,829.60	-	0.00%	-	-	0.00%	248.58	29,829.60	100.00%	-	-	0.00%
FLETE FLUVIAL	ton	248.58	45.00	11,185.50	-	0.00%	-	-	0.00%	248.58	11,185.50	100.00%	-	-	0.00%
FLETE CARGUO Y DESCARGUO	ton	248.58	30.00	7,457.40	-	0.00%	-	-	0.00%	248.58	7,457.40	100.00%	-	-	0.00%
TRASISTE DE MATERIALES	ton	248.58	30.00	7,457.40	-	0.00%	-	-	0.00%	248.58	7,457.40	100.00%	-	-	0.00%
POZA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LADRILLO TARRAJEADO DE 1.00 X 2.00 X 1.20 m.	und	2.00	495.58	811.16	-	0.00%	-	-	0.00%	2.00	811.16	100.00%	-	-	0.00%
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	GLB	1.00	10,800.00	10,800.00	-	0.00%	-	-	0.00%	1.00	10,800.00	100.00%	-	-	0.00%
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	GLB	1.00	7,000.00	7,000.00	-	0.00%	-	-	0.00%	1.00	7,000.00	100.00%	-	-	0.00%
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD, DURANTE EL TRABAJO	GLB	1.00	2,000.00	2,000.00	-	0.00%	-	-	0.00%	1.00	2,000.00	100.00%	-	-	0.00%
SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	GLB	1.00	2,000.00	2,000.00	-	0.00%	-	-	0.00%	1.00	2,000.00	100.00%	-	-	0.00%
TRABAJOS PRELIMINARES	M2	2,011.64	2.70	5,431.43	-	0.00%	-	-	0.00%	2,011.64	5,431.43	100.00%	-	-	0.00%
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL (Con pico, lampa y carretilla)	M2	2,011.64	2.69	5,411.31	-	0.00%	-	-	0.00%	2,011.64	5,411.31	100.00%	-	-	0.00%
TRAZO NIVELES Y REPLANTEO	M3	1,206.59	16.72	20,180.71	-	0.00%	-	-	0.00%	1,206.59	20,180.71	100.00%	-	-	0.00%
DEMOLICION DE VEREDA EXISTENTE	M3	301.75	48.23	14,553.40	-	0.00%	-	-	0.00%	301.75	14,553.40	100.00%	-	-	0.00%
MOVIMIENTO DE TIERRAS	M3	301.75	48.23	14,553.40	-	0.00%	-	-	0.00%	301.75	14,553.40	100.00%	-	-	0.00%
EXCAVACION DE TERRENO MANUAL	M2	301.75	48.23	14,553.40	-	0.00%	-	-	0.00%	301.75	14,553.40	100.00%	-	-	0.00%

INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 5452

CONSORCIO VEREDAS PUJINAHUA
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 5452

116

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 03
PERIODO DEL 01/12/2020 AL 10/12/2020

"MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH, DEL DISTRITO DE PUJINAHUA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO"

MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH DEL DISTRITO DEL PUJINAHUA

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH - PUJINAHUA - REQUENA - LORETO

CONSORCIO VEREDAS PUJINAHUA
ING. JORGE ESTEBAN TOCAS QUISPE

ING. MIGUEL DELGADO GODOS
UNICA

Valor Referencial (C/IGV)
Valor Referencial (S/IGV)
Monto Obrero (S/IGV)
Plazo de Ejecución

S/ 3,469,657.97
S/ 2,940,388.11
S/ 3,019,196.04
: 90 d.c

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL			ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO			SALDO		
	Unid	Medrado	Unitario	Parcial	Medrado	%	Parcial	Medrado	%	Parcial	Medrado	%	Parcial	Medrado	%
CAMIA DE ARENA e = 0.10 m. - ANTICONTAMINANTE	M3	160.93	106.29	17,105.25	76.33	47.43%	8,113.12	76.33	0.00%	8,113.12	76.33	0.00%	8,992.13	84.60	52.57%
NIVELACION REGLADO Y APISONADO MANUAL	M2	2,011.64	6.14	12,351.47	954.18	47.43%	5,858.67	954.18	0.00%	5,858.67	954.18	0.00%	6,492.80	1,057.46	52.57%
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 100M. DE LA OBRA c/carretila	M3	377.18	19.29	7,275.80	178.91	47.43%	3,451.17	178.91	0.00%	3,451.17	178.91	0.00%	3,824.63	198.27	52.57%
VEREDA PEATONAL L= 1.07m, 0.4 m															
SOLADO MEZCLA 1:10 e=2" vaciado con carretila	M2	100.53	29.49	2,963.10	47.71	47.43%	1,406.97	47.71	0.00%	1,406.97	47.71	0.00%	1,559.14	52.87	52.57%
MORTERO f c=210 Kg/cm2	M3	413.39	60.77	263,128.09	196.08	47.43%	126,230.42	196.08	0.00%	126,230.42	196.08	0.00%	139,897.66	370.11	52.57%
MORTERO f c=210 Kg/cm2	M2	704.07	35.83	25,228.83	333.96	47.43%	11,965.79	333.96	0.00%	11,965.79	333.96	0.00%	13,261.04	370.11	52.57%
ENCORADO Y DESENCOFRADO	M	870.55	8.94	5,894.72	318.06	47.43%	2,843.46	318.06	0.00%	2,843.46	318.06	0.00%	3,151.26	352.49	52.57%
RELLENO DE JUNTAS DE DILATACION Y AISLAMIENTO DE 1" X 2" CON MORTERO ASFALTICO Y TECKNOP	M	2,011.64	0.78	1,568.08	954.18	47.43%	744.26	954.18	0.00%	744.26	954.18	0.00%	824.82	1,057.46	52.57%
CURADO	m	2,514.55	1.86	4,677.09	1,192.73	47.43%	2,218.48	1,192.73	0.00%	2,218.48	1,192.73	0.00%	2,458.59	1,321.82	52.57%
BRUNADO															
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL															
MEASURAS DE MITIGACION AMBIENTAL	und	1.00	12,000.00	12,000.00	1.00	100.00%	12,000.00	1.00	0.00%	12,000.00	1.00	0.00%	-	-	0.00%
ELABORACION E IMPL. Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	und	1.00	5,000.00	5,000.00	1.00	100.00%	5,000.00	1.00	0.00%	5,000.00	1.00	0.00%	-	-	0.00%
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y MITIGACION DE LA CONSTRUCCION	und	1.00	5,000.00	5,000.00	1.00	100.00%	5,000.00	1.00	0.00%	5,000.00	1.00	0.00%	-	-	0.00%
PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS EN LA CONSTRUCCION	und	1.00	7,000.00	7,000.00	0.40	40.00%	2,800.00	0.40	40.00%	2,800.00	0.80	80.00%	1,400.00	0.20	20.00%
CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	und	1.00	5,000.00	5,000.00	1.00	100.00%	5,000.00	1.00	0.00%	5,000.00	1.00	0.00%	-	-	0.00%
PLAN DE MONITOREO DE SEGURIDAD AMBIENTAL Y SALUD EN LA CONSTRUCCION	und	1.00	15,000.00	15,000.00	1.00	100.00%	15,000.00	1.00	0.00%	15,000.00	1.00	0.00%	-	-	0.00%
PROGRAMA DE ABANDONO EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION	und	1.00	5,000.00	5,000.00	1.00	100.00%	5,000.00	1.00	0.00%	5,000.00	1.00	0.00%	-	-	0.00%
MEDIOS DE CONCIENTIZACION	und	5.00	524.37	2,621.85	5.00	100.00%	2,621.85	5.00	0.00%	2,621.85	5.00	0.00%	-	-	0.00%
LETREROS AMBIENTALES	und	5.00	506.37	2,531.85	5.00	100.00%	2,531.85	5.00	0.00%	2,531.85	5.00	0.00%	-	-	0.00%
LETREROS DE PREVENCCION VIAL	und	5.00	506.37	2,531.85	5.00	100.00%	2,531.85	5.00	0.00%	2,531.85	5.00	0.00%	-	-	0.00%
TOTAL COSTO DIRECTO	CD			2,450,323.43		56.27%	1,415,910.58		1.05%	26,518.83		57.32%	1,442,429.41		42.68%
GASTOS GENERALES	Gg	10.00%	CD	245,032.34			141,591.06			2,651.88			144,242.94		
UTILIDAD	UTI	9.99%	CD	244,787.31			141,449.46			2,649.23			144,098.69		
PLAN COVID				79,052.96											
SUB TOTAL	ST = CD + GG + UTI + COVID			3,019,196.04			1,698,951.10			31,819.94			1,730,771.04		
FACTOR DE RELACION = 1.00000				3,019,196.04			1,698,951.10			31,819.94			1,730,771.04		
IGV		0.00%													
TOTAL PRESUPUESTO = S/IGV.				3,019,196.04			1,698,951.10			31,819.94			1,730,771.04		

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA
JAZNELL ALENA FLORES RODRIGUEZ
Representante Común

CONSORCIO VEREDAS PUJINAHUA
ING. JORGE ESTEBAN TOCAS QUISPE
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 64562
REPRESENTANTE COMUN
ING. MIGUEL DELGADO GODOS
JEFE DE SUPERVISION - CIP 30410

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

115

PANEL FOTOGRAFICO



FOTO N° 01: SE OBSERVA CARTEL DE OBRA EN LA COMUNIDAD DE HUACRACHIRO.

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

[Signature]
Ing. Miguel Eugenio Delgado Godos
JEFE DE SUPERVISION - CIP 30410



FOTO N° 02: SE OBSERVA ENCOFRADO EN VEREDAS, Y EXCAVACIÓN MANUAL EN LA COMUNIDAD DE HUACRACHIRO.

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

[Signature]
JAZHELL ALEXIS FLORES RODRIGUEZ
Representante Comun

CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA

[Signature]
MARCE PASCUAL CORREA MEDINA
REPRESENTANTE COMUN

[Signature]
Jorge Esteban Tocas Quispe
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 84572



FOTO N° 03: SE OBSERVA COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA EN VEREDAS, EN LA COMUNIDAD DE HUACRACHIRO.

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

Ing. Miguel Eugenio Delgado Godos
JEFE DE SUPERVISIÓN - CIP 30410

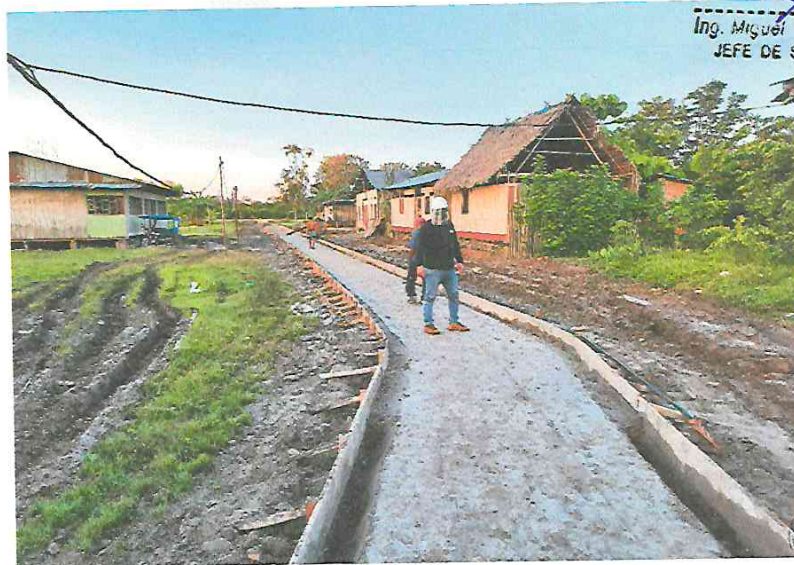


FOTO N° 04: SE OBSERVA VACEO DE SOLADO EN VEREDAS EN VEREDAS, EN LA COMUNIDAD DE HUACRACHIRO.

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

JAZHELL ALEKIS FLORES RODRIGUEZ
Representante Comun

CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA

MARDE PASCUAL CORREA MEDINA
REPRESENTANTE COMUN



ESTEBAN TODAS QUISPE
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 54002

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

Jazhell Flores

JAZHELL ALEXIS FLORES RODRIGUEZ
Representante Común



FOTO N° 05: SE OBSERVA VISITA A OBRA DEL ING. ZUMARAN DE SUPERVISIÓN DE LA GRIL, EN PRESENCIA DE LA SUPERVISIÓN EN LA COMUNIDAD DE HUACRACHIRO.

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

Miguel Delgado

Ing. Miguel Eugenio Delgado Godos
JEFE DE SUPERVISION - CIP 30410

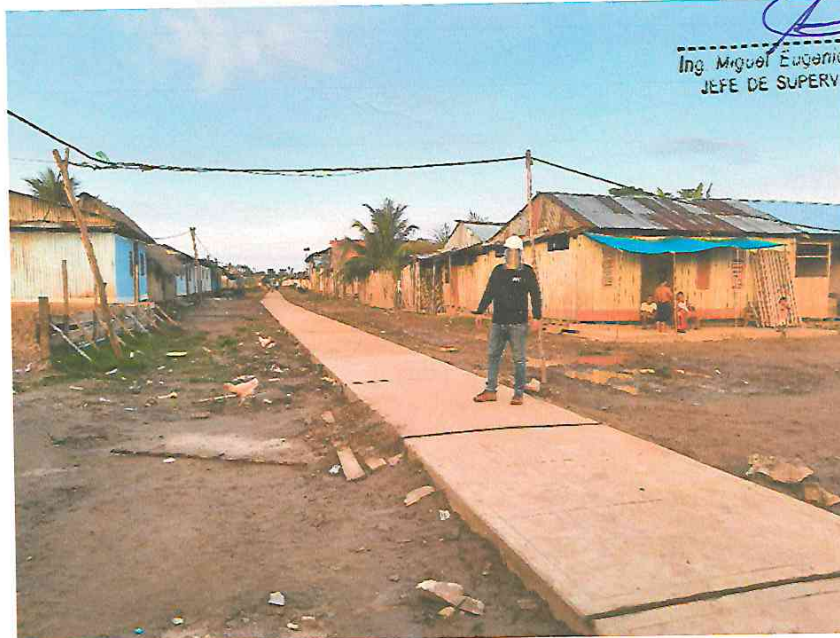


FOTO N° 06: SE OBSERVA VACEO DE MORTERO F' C=210 KG/CM2 EN VEREDAS EN LA COMUNIDAD DE HUACRACHIRO.

Marde Correa
CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA

MARDE PASCUAL CORREA MEDINA
REPRESENTANTE COMÚN

Esteban Tocas

INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 54572



CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

[Signature]
Ing. Miguel Eugenio Delgado Godos
JEFE DE SUPERVISIÓN - CIP 30410

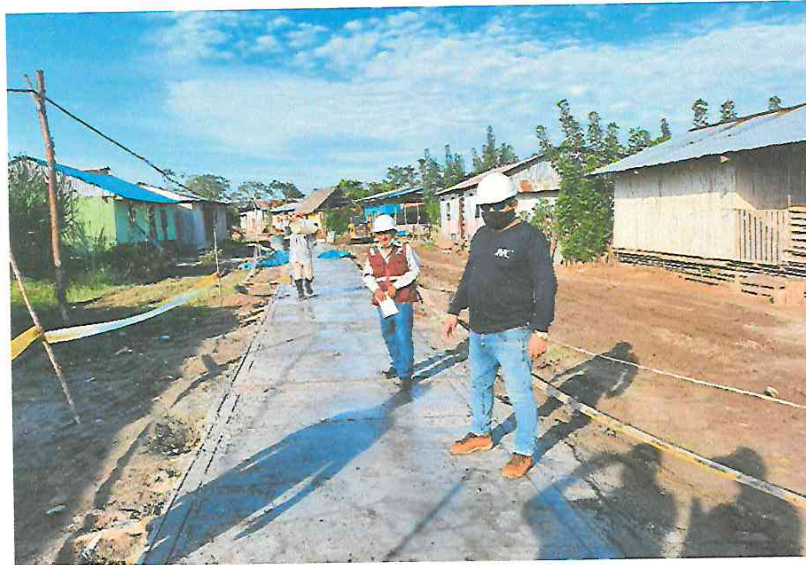


FOTO N° 07: SE OBSERVA CURADO EN VEREDAS EN LA COMUNIDAD DE HUACRACHIRO.



FOTO N° 08: SE OBSERVA CARTEL DE OBRA EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA.

[Signature]
JAZHELL ALEXIS FLORES RODRIGUEZ
Representante Comun

[Signature]
CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA
MARDE PASCUAL CORREA MEDINA
REPRESENTANTE COMUN

[Signature]
INGENIERO ESTEBAN TOCÁS QUISPE
INGENIERO CIVIL
R.O.G. CIP N° 54502

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

Jazhell Alexis Flores Rodriguez

JAZHELL ALEXIS FLORES RODRIGUEZ
Representante Comun

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

Ing. Miguel Eugenio Delgado Godos

Ing. Miguel Eugenio Delgado Godos
JEFE DE SUPERVISIÓN - CIP 30410



FOTO N° 09: SE OBSERVA CARTEL DE OBRA EN LA COMUNIDAD DE ANCASH.



FOTO N° 10: SE OBSERVA TRABAJOS DE ENCOFRADO, EXCAVACIÓN MANUAL, COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA Y VACEO DE SOLADO EN VEREDAS EN LA COMUNIDAD DE ANCASH.

Marde Pascual Correa Medina

MARDE PASCUAL CORREA MEDINA
REPRESENTANTE COMUN



Jorge Esteban Tocas Quipe

JORGE ESTEBAN TOCAS QUIPE
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 54572



CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

[Signature]
 JAZHELL ALEXIS FLORES RODRIGUEZ
 Representante Comun

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

[Signature]
 Ing. Miguel Eugenio Delgado Godos
 JEFE DE SUPERVISIÓN - CIP 30410



FOTO N° 11: SE OBSERVA TRABAJOS DE VACEO DE MORTERO F'C= 210 KG/CM2 EN VEREDAS EN LA COMUNIDAD DE ANCASH.



FOTO N° 12: SE OBSERVA TRABAJOS DE VACEO DE MORTERO F'C= 210 KG/CM2 EN VEREDAS EN LA COMUNIDAD DE ANCASH.

[Signature]
 CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA
 MARDE PASCUAL CORREA MEDINA
 REPRESENTANTE COMUN



[Signature]
 JORGE ESTEBAN TOCAS QUISPE
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 84562



CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

[Signature]
 JAZHELL ALEXIS FLORES RODRIGUEZ
 Representante Comun

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

[Signature]
 Ing. Miguel Eugenio Delgado Godos
 JEFE DE SUPERVISION - CIP 30410



FOTO N° 13: SE OBSERVA TRABAJOS DE VACEO DE MORTERO F'c= 210 KG/CM2 EN VEREDAS EN LA COMUNIDAD DE ANCASH.



FOTO N° 14: SE OBSERVA CARTEL DE OBRA EN LA COMUNIDAD DE SAN CARLOS.

CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA

[Signature]
 MARDE PASCUAL CORREA MEDINA
 REPRESENTANTE COMUN



[Signature]
 ING. ESTEBAN TOCAS QUIRPE
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 54572



VALORIZACION

N.º 4



“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Belén, 10 de febrero de 2021



Oficio n° 0376-2021-GRL-GRI-SGSyC

Ingeniero Edi Wisberto Ruiz Zárate
Gerente Regional de Infraestructura
Presente



Asunto: Remite Valorización de Obra n° 04
Enero 2021.

Obra: “Mejoramiento de Veredas Peatonales en las Localidades de Huacrachiro, Bellavista, San Carlos y Ancash, del Distrito de Puinahua, Provincia de Requena, Departamento de Loreto”

Ref. : a. Informe n° 056-2021-GRL/GRI/SGSyC/JAZP
b. Carta n° 007-2021-CSHBSA
c. Carta n° 001-2021-JVAV/JS/CSHBSA
d. Carta n° 009-2021-CVP

Tengo el agrado de saludarle cordialmente, en atención a la referencia a), remitirle la valorización n° 04 por ejecución de obra, correspondiente a enero de 2021, revisada y aprobada por el Inspector, la misma que asciende a la suma de (**S/. 653 034.46**); asimismo se indica que los reajustes serán pagados en la liquidación de obra, y de acuerdo a la amortización por adelanto directo y materiales, consideramos el monto neto a pagar la suma de **Ciento veintisiete mil seiscientos veintidós-con 26/100 Soles y (127 622.26)**, sin incluir IGV, de acuerdo al siguiente detalle:

reajuste y

Valorización bruta n° 04 – enero 2021	S/. 635 034.46
Reajuste	S/. 0.00
Amortización adelanto directo	S/. - 63 503.45
Amortización adelanto materiales	S/. - 443 908.75
Retención Garantía de Fiel Cumplimiento	S/. 0.00
Neto a Pagar	S/. 127 622.26

Asimismo, la obra a enero de 2021, tiene un avance real acumulado ejecutado de 80.47%, versus un avance programado de 69.67%, encontrándose la obra adelantada y en ejecución.

Por lo tanto, encontrándose **conforme** la documentación que sustenta el Inspector, se solicita continuar con el trámite respectivo a favor de Consorcio Veredas Puinahua, siendo a facturar a nombre de **Constructora y Consultoría M.C. Empresa Individual de Responsabilidad Limitada**, se adjunta **factura electrónica E001-120**.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regional de Infraestructura

Ing. RAÚL FLORES AQUEPUCHO
Sub Gerente de Supervisión y Control

Copia: SGSyC – File Personal (01)
SGSyC – File de obra (01)
SGSyC – File correlativo (01)

TRAMITE: 03185
RFA – S.G.
2021 - 02 - 10



INFORME N° 056-2021-GRL/GRI/SGSyC/JAZP


AL : **Ing. Raúl Flores Aquepucho**
Sub Gerente de Supervisión y Control

DE : **Ing. José Armando Zumarán Pérez**
Inspector de Obra

ASUNTO : Remite Valorización N° 04 – Mes de Enero 2021.
Obra: **"MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH DEL DISTRITO DE PUINAHUA-PROVINCIA DE REQUENA- DEPARTAMENTO DE LORETO"**. Código Unico 2352929.

REFERENCIA : 1 CARTA N° 007-2021-CSHBSA (05/02/2021).
2 CARTA N° 001-2021-JVAV/JS/CSHBSA (03/02/2021).
3 CARTA N° 009/2021-CVP.
4 PROVEIDO N° 03185 (SGSyC).

FECHA : Iquitos, 08 de Febrero de 2021.



Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo muy cordialmente e informar sobre lo indicado en el asunto.

DATOS GENERALES

Obra : "Mejoramiento de Veredas Peatonales en las Localidades de Huacrachiro, Bellavista, San Carlos y Ancash del Distrito de Puinahua-Provincia de Requena- Departamento de Loreto". Código Unico 2352929.

Entidad : Gobierno Regional de Loreto.

Proceso de Selección : Licitación Pública N° 010-2020-CSO-GRL (PRIMERA CONVOCATORIA).

Contrato : Contrato N° 037-2020-GRL-GRI.

Sistema de Contrato : Contrata a Precios Unitarios.

Otorgamiento de la Buena Pro : 07-Septiembre-2020.

Contratista : CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA.
Integrado por : CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA MC E.I.R.L.
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES MAR & MAR S.A.C.
M.L. CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

Financiamiento : Recursos Ordinarios (Cuenta de Fideicomiso).

Valor Referencial : S/. 2'940,388.11 Sin IG.V.

Valor Contractual : S/. 3'019,196.04 Sin IG.V.

Fecha del Valor Referencial : Julio de 2020.

Adelanto Directo : S/ 301,920.00 (Septiembre 2020).

Suscripción del Contrato : 22- Septiembre -2020.

Plazo de ejecución Contractual : 90 días calendario.

Fecha de Entrega de Terreno : 07-October-2020.

Fecha de Inicio Contractual : 19-October-2020.

Término de Plazo Contractual : 16-Enero-2021.

Fecha de Recepción de la Obra : .

Residente de Obra : Ing° Jorge Esteban Tocas Quispe.



Inspector de Obra : Ing° José Armando Zumarán Pérez.
Avance Físico Programado : 46.81%.
Avance Físico Prog. Acumul. : 88.28%.
Avance Físico Real : 1.08%.
Avance Físico Real Acumul. : 58.87%.
Situación actual de la obra : ATRASADA.

ANTECEDENTES.-

- Con fecha 21 de Setiembre de 2020 se firmó el Contrato N° 035-2020-GRL-GRI de la obra: **"Mejoramiento de Veredas Peatonales en las Localidades de Huacrachiro, Bellavista, San Carlos y Ancash del Distrito de Puinahua-Provincia de Requena-Departamento de Loreto"**.
- Con fecha 07 de Octubre de 2020 se dio por finalizado el acto de Entrega del Terreno en las localidades de Huacrachiro, Bellavista, San Carlos y Ancash.
- De común acuerdo entre las partes, mediante Carta N° 667-2020-GRL/GRI/SGSyC y CARTA N° 005/2020-CVP, de la entidad y del Contratista, respectivamente, se fijó como fecha de inicio de obra el día **19 de Octubre de 2020**.

ANALISIS

Se ha tomado conocimiento de la Valorización N° 04, practicada por el Residente, y presentada por el Supervisor, mediante documento 2 de la referencia, a la Gerencia Regional de Infraestructura, cuyo contenido pasamos a evaluar.


De la revisión de las copias del Cuaderno de Obra, el Ing. Residente, Jorge Esteban Tocas Quispe, en su Asiento N° 094 del cuaderno de obra (páginas 53 a 56), de fecha 31 de Enero de 2021, presenta los metrados ejecutados, para la elaboración de la Valorización N° 04. El Supervisor, mediante Asiento N° 95 del cuaderno de obra (página 56) aprueba dichos metrados y, en forma conjunta, elaboran la Valorización N° 04 de Enero de 2021.

La Valorización N° 04 arroja el siguiente resultado en forma global:

Valorización Contractual	S.	635,034.46	
Reajuste Neto		12,856.19	
Amortización Adelanto Directo	(-)	63,503.45	
Amortización Adelanto Materiales	(-)	443,908.75	
Sub total			140,478.45
Retención por Garantía de Fiel Cumplimiento			0.00
TOTAL VALORIZADO S.			140,478.45

Monto valorización : S/ 635,034.46
VALOR ACUMULADO: S/ 2,940,143.08 (sin IGV) AVANCE 21.60%.

PERIODO	PROGRAMADO			REAL EJECUTADO			ESTADO (adelantada / atrasada)
	PARCIAL	ACUMULADO	% ACUM	PARCIAL	ACUMULADO	% ACUM	
oct-20	273,150.74	273,150.74	9.29%	273,150.74	273,150.74	9.29%	ADELANTADA
nov-20	1,425,800.36	1,698,951.10	57.78%	1,425,800.36	1,698,951.10	57.78%	ADELANTADA
dic-20	31,819.94	1,730,771.04	58.87%	31,819.94	1,730,771.04	58.87%	ATRASADA
ene-21	317,763.76	2,048,534.80	69.67%	635,034.46	2,365,805.50	80.47%	ADELANTADA
feb-21	891,608.28	2,940,143.08	100.00%				
	2,940,143.08			2,365,805.50			

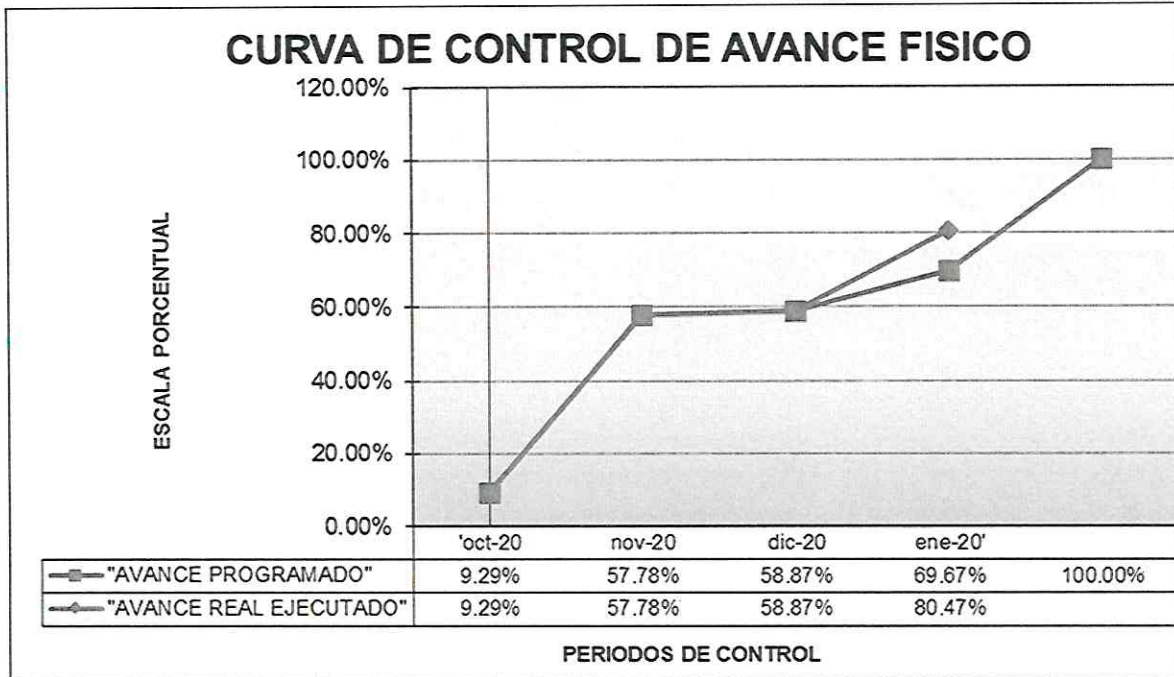

CONCLUSION

Se ha cumplido con presentar toda la documentación pertinente de la Valorización N° 04 del Contratista. De acuerdo al CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA vigente, el porcentaje de avance programado acumulado para el mes de Enero 2021 es de 69.67% y el avance de obra acumulado real es de 80.47%, por lo tanto la obra se encuentra **adelantada** en un 10.80%.

RECOMENDACION

Continuar con el trámite respectivo para el pago de la Valorización N° 04 por un monto de **S/ 140,478.45 (Ciento Cuarenta Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho con 45/100 Soles)**, correspondiente.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y tramite respectivo.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regional de Infraestructura
Sub. Gerencia de Supervisión y Control

JOSE ARMANDO ZUMARAN PEREZ
Ingeniero Civil
C.I.P. N°10738

José Armando Zumarán Pérez
Ingeniero Civil
N° Reg. Prof.: 10738

PROVEIDO N° **03185** of. **0576**
A **Secretaría de Infraestructura**
PARA: **2. G.R.I. - para**
Trámite de pago

Gobierno Regional de Loreto
 Gerencia Regional de Infraestructura
 Sub Gerencia de Supervisión y Control
 05 FEB 2021
 Fecha: 03185 Hora: 2:47 PM
 N° Reg:



CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

Iquitos, 04 de febrero del 2021

CARTA N° 007-2021-CSHBSA

Señores:
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ING. EDI WISBERTO RUIZ ZARATE
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 Atención:
 SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL

Gobierno Regional de Loreto
 Oficina de Supervisión y Control
 3185
 05 FEB 2021

Gobierno Regional de Loreto
 Gerencia Regional de Infraestructura
 05 FEB 2021
 Hora: 11:59 AM
 Reg. N°

Asunto **REMITE VALORIZACION DE OBRA N° 004**
ENERO 2021
 Ref. : OBRA "MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH, DEL DISTRITO DE PUINAHUA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO"
Carta N° 009/2021-CVP (02-02-2021)

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de remitir la **Valorización de Obra N° 004** correspondiente al mes de **ENERO del 2021**, en **01 original y 03 copias**, la misma que se encuentra con un avance físico del 21.03% y un acumulado de 78.35%, cuyo neto a cobrar por el contratista (Ejecutor de Obra) asciende a **S/. 140,478.45 (CIENTO CUARENTA MIL CUATROSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 45/100 Soles)**, de los trabajos ejecutados en la obra: "MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH, DEL DISTRITO DE PUINAHUA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO" por la firma Contratista **CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA**, en el periodo del **21/01/2021 al 31/01/2021**.

A la vez de acuerdo a lo indicado en el asunto, se ha elaborado la solicitud de pago de Obra al mes de **ENERO 2021**, cuyo detalle es el siguiente:

1.	Valorización Bruta N° 004 – ENERO 2021	S/.	635,034.46
2.	Reajuste Neto (+)	S/.	12,856.19
3.	Amortización de Adelanto Directo (-)	S/.	63,503.45
4.	Amortización de Adelanto Materiales (-)	S/.	443,908.75
	NETO A FACTURAR	S/.	140,478.45
5.	Garantía de Fiel Cumplimiento	S/.	0.00
	NETO A PAGAR	S/.	140,478.45

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

JAZHELL ALEXIS FLORES RODRIGUEZ
 Representante Comun

PROVEIDO N° 03185

PROVEIDO N° 3185

04 FILAS: SCSYC-GR
 PARA: Alex...
 FEI - 000260507



185

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

CARTA N° 001-2021-JVAV/JS/CSHBSA

Iquitos, 03 de Febrero del 2021

**ING. JAZHELL ALEXIS FLORES RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
CONSORCIO SUPERVISOR HBSA**

Presente:

**Asunto: REMITE SOLICITUD DE PAGO - VALORIZACIÓN DE OBRA N° 04 -
CONTRATO PRINCIPAL - MES ENERO 2021 DEL CONTRATISTA
CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA.**

**Referencia: "MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE
HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH, DEL DISTRITO DE PUINAHUA,
PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO".**

De mi especial consideración:

Me dirijo a usted, con un cordial saludo y a la vez remitir la documentación revisada en el cual se da la **CONFORMIDAD** de la **VALORIZACIÓN DE OBRA N° 04 – CONTRATO PRINCIPAL** correspondiente al mes de **ENERO del 2021** del contratista **CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA**, de la obra de referencia, en concordancia con el art 194° del R.L.C.E., para ello adjunto la valorización de Obra en 01 original y 04 copias., adjuntando el procesamiento correspondiente por el avance de obra indicada en la referencia.

El resumen de la presente valorización es como sigue:

Valorización N° 04 – Contrato Principal	
Mes Enero 2021	S/. 635,034.46
Reajuste Valorización N° 04	12,856.19
Amortización Adelanto Directo	-63,503.45
Amortización Adelanto Materiales	-443,908.75
Sub Total	140,478.45
I.G.V. 18.00 %	0.00
NETO A PAGAR	140,478.45

A la fecha, la obra cuenta con un avance físico acumulado de **78.36%**, siendo **MAYOR** al avance físico programado de **67.85%**, por lo que la obra se encuentra **ADELANTADA**. Además, para la cancelación de dicha valorización, el contratista deberá acreditar el pago a **SENCICO** por la cantidad de **S/. 1,270.07**

Esperando la atención debida a la presente, quede de usted, no sin antes expresarles las muestras de mi especial estima.

Muy atentamente,

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

Ing. JUAN VICTOR ACEVEDO VASQUEZ
Jefe de Supervisión - CIP 123510

ING. JUAN VICTOR ACEVEDO VASQUEZ
Jefe de Supervisión
Consorcio Supervisor HBSA

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

JAZHELL ALEXIS FLORES RODRIGUEZ
Representante Común

Recibido 03/02/2021
8:00am

Se adjunta:

- CARTA N° 033-2020-CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA.



Iquitos, 02 de febrero de 2021

CARTA N° 009/2021-CVP

Señores:

Consorcio Supervisor HBSA

Sra. Jazhell Alexis Flores Rodríguez – Representante Común

Presente.-

Referencia: CONTRATO N° 037-2020-CSO-GRL-GRI, Obra “MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH, DEL DISTRITO DE PUINAHUA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO”

Asunto: Valorización N° 04 - Mes enero 2021

De nuestra consideración:

Mediante la presente los saludamos muy cordialmente y, al mismo tiempo, les hacemos llegar adjunto a la presente la VALORIZACION DE OBRA N° 04, por la ejecución de la obra de la referencia, correspondiente al mes de ENERO 2021, para su revisión, aprobación y trámite correspondiente para su cancelación.

Sin otro particular, quedamos a sus órdenes.

Atentamente,

CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA


MARDE PASCUAL CORREA MEDINA
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA
JAZHELL ALEXIS FLORES RODRIGUEZ
Representante Común
Recibido 02/02/2021
8:00 a.m.

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 04
PERIODO DEL 21/01/2021 AL 31/01/2021

MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH, DEL DISTRITO DE PUNAHUA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO*
LICITACION PUBLICA N° 010-2020-00-GO-CL (PRIMERA CONVOCATORIA)
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH- PUNAHUA - REQUENA - LORETO

CONSORCIO VEREDAS PUNAHUA
ING. JOSE ESTEBAN TUCAS QUISPE
ING. JUAN VICTOR ACEVEDO VASQUEZ
UNICA

Valor Referencial (CIVIV)
Valor Referencial (SIVIV)
Monte Ofertado (SIVIV)
Plazo de Ejecución

S/ 3,468,627.87
S/ 2,640,388.11
S/ 3,010,188.04
: 90.8 d

EM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL		ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		SALDO	
		Und	Método	Unidad	Método	Parcela	%	Método	%	Parcela	%
01	COMANDANCIA - HUACRACHIRO										
01.01	OBRAS PROVISIONALES										
01.01.01	CARTEL DE OBRA DE (3.60 X 2.40M), GIGANTOGRAFIA	und	1.00	590.38	1.00	590.38	100.00%	590.38	100.00%	1.00	0.00%
01.01.02	ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN	mes	3.00	6,000.00	3.00	6,000.00	100.00%	6,000.00	100.00%	3.00	0.00%
01.01.03	FLETE TERRESTRE	ton	413.42	8,268.40	269.39	5,787.68	70.00%	124.03	30.00%	413.42	0.00%
01.01.04	FLETE FLUVIAL	ton	413.42	49,810.40	269.39	34,727.28	70.00%	124.03	30.00%	413.42	0.00%
01.01.05	FLETE CARGUO Y DESCARGUO	ton	413.42	120.00	269.39	13,022.23	70.00%	124.03	30.00%	413.42	0.00%
01.01.06	TRASLADO DE MATERIALES	ton	413.42	18,603.60	269.39	13,022.23	70.00%	124.03	30.00%	413.42	0.00%
01.01.07	POZA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LADRILLO TAPAJEADO DE 1.00 X 2.00 X 1.20 m.	und	2.00	405.56	2.00	8,111.16	100.00%	8,111.16	100.00%	2.00	0.00%
01.02	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA										
01.02.01	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	GLB	1.00	10,600.00	0.50	9,720.00	90.00%	0.10	10.00%	1.00	0.00%
01.02.02	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD, DURANTE EL TRABAJO.	GLB	1.00	7,000.00	1.00	7,000.00	100.00%	1.00	100.00%	1.00	0.00%
01.02.03	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD.	GLB	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00	100.00%	1.00	100.00%	1.00	0.00%
01.03	TRABAJOS DE LIMPIEZA										
01.03.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL (Con picos, lmpa y carretilla)	M2	3,385.30	9,140.31	3,385.30	9,140.31	100.00%	3,385.30	100.00%	3,385.30	0.00%
01.03.02	TRABAJOS DE TIERRAS	M2	3,385.30	9,140.31	3,385.30	9,140.31	100.00%	3,385.30	100.00%	3,385.30	0.00%
01.04	EXCAVACION DE TIERRAS										
01.04.01	EXCAVACION DE TIERRAS MANUALES	M3	507.60	24,481.19	442.09	21,350.58	87.22%	64.91	12.78%	507.60	0.00%
01.04.02	CAMA DE ARENA e = 0.10 m. - ANTICONTAMINANTE	M3	338.53	33,853.00	295.25	31,383.19	87.22%	43.27	12.78%	338.53	0.00%
01.04.03	NIVELACION REGLADO Y AFISADO MANUALES	M2	3,885.00	6.14	2,952.60	18,128.95	12.77%	432.40	12.77%	3,885.00	0.00%
01.04.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 100% DE LA OBRA c/carretilla	M3	634.74	19.93	553.61	16,679.14	87.22%	81.13	12.78%	634.74	0.00%
01.05	VEREDA PEATONAL Lx 2.172.93 m										
01.05.01	SOLADO MEZCLA 1:10 e=2" vaciado con carretilla	M2	135.41	20.49	118.10	3,482.77	87.22%	17.31	12.78%	135.41	0.00%
01.05.02	MORTERO F=2:10 kg/cm2	M3	655.88	640.77	606.76	390,613.69	87.22%	88.92	12.78%	655.88	0.00%
01.05.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	1,184.84	38.83	1,033.41	37,027.31	87.22%	151.45	12.78%	1,184.84	0.00%
01.05.04	RELLENO DE JUNTAS DE DILATACION Y AISLAMIENTO DE 1" X 2" CON MORTERO ASFALTICO Y TECNICO	M	1,123.43	8.84	994.20	8,738.75	87.22%	337.51	12.78%	1,123.43	0.00%
01.05.05	CURADO	M2	3,385.30	0.78	2,952.60	2,952.60	87.22%	432.70	12.78%	3,385.30	0.00%
01.05.06	BRUNDO	m	4,231.63	1.86	3,694.75	6,664.80	87.22%	540.89	12.78%	4,231.63	0.00%
01.06	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL										
01.06.01	MEASURAS DE MITIGACION AMBIENTAL										
01.06.01.01	ELABORACION E IMPL. Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ud	1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	100.00%	1.00	100.00%	1.00	0.00%
01.06.01.02	PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y MITIGACION DE LA CONSTRUCCION	ud	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	100.00%	1.00	100.00%	1.00	0.00%
01.06.01.03	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS EN LA CONSTRUCCION	ud	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	100.00%	1.00	100.00%	1.00	0.00%
01.06.01.04	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	ud	1.00	7,000.00	1.00	7,000.00	100.00%	1.00	100.00%	1.00	0.00%
01.06.01.05	PLAN DE MONITOREO DE SEGURIDAD AMBIENTAL Y SALUD EN LA CONSTRUCCION	ud	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	100.00%	1.00	100.00%	1.00	0.00%
01.06.01.06	PROGRAMA DE AVANZO EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION	ud	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	100.00%	1.00	100.00%	1.00	0.00%
01.07	MEDIDAS DE COORDINACION										
01.07.01	LETREROS AMBIENTALES	ud	5.00	504.37	5.00	2,621.85	100.00%	5.00	100.00%	5.00	0.00%
01.07.02	LETREROS DE PREVENCIÓN WAL	ud	5.00	506.37	5.00	2,531.85	100.00%	5.00	100.00%	5.00	0.00%

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

ZHELL ALEXIS FLORES RODRIGUEZ
Representante Común

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

Ing. JUAN VICTOR ACEVEDO VASQUEZ
Jefe de Supervisión - CIP 123510

CONSORCIO VEREDAS PUNAHUA
MARCE PASQUAL CORREA MEDINA
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO VEREDAS PUNAHUA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 64503

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 04
PERIODO DEL 21/01/2021 AL 31/01/2021

HEORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH, DEL DISTRITO DE PUINAHUA, PROVINCIA DE REQUEVA, DEPARTAMENTO LORETO

LICITACION PUBLICA N° 016202-C500R- (PRIMERA CONVOCATORIA)

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH- PUINAHUA - REQUEVA - LORETO

CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA

ING. JORGE ESTEBAN TOSAS QUISPE

ING. JUAN VICTOR ACEVEDO VASQUEZ

UNICA

Valor Referencial (C/00V)
Valor Referencial (S/00V)
Monto Ofertado (S/00V)
Plazo de Ejecución

S/ 3.488.657,97
S/ 2.840.388,11
S/ 3.818.183,44
: 30 d.c.

M	DESCRIPCIÓN	PREPUESTO INICIAL		ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		SALDO	
		Und.	Medida	Unidad	Medida	Parcial	%	Medida	%	Parcial	%
02	COMANDO - BELLAVISTA										
02.01	OBRAS PROMOSIONALES										
01.01	CARTEL DE OBRA DE (3.60 X 2.40M), GIGANTOGRAFIA	urd	1,00	690,35	1,00	990,38	100,00%	-	0,00%	1,00	100,00%
01.02	ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN	m2	3,00	6.000,00	2,50	5.000,00	83,33%	1.000,00	16,67%	-	0,00%
01.03	FLETE TERRESTRE	ton	225,05	4.501,00	157,54	3.150,70	70,00%	1.350,20	30,00%	-	0,00%
01.04	FLETE FLUMINAL	ton	225,05	53.511,90	37.493,33	16.067,38	30,00%	16.067,38	30,00%	-	0,00%
01.05	FLETE CARGUO Y DESCARGUO	ton	225,05	10.127,25	157,54	7.089,08	70,00%	3.037,95	30,00%	-	0,00%
01.06	TRASLADO DE MATERIALES	ton	225,05	6.751,50	157,54	4.726,05	70,00%	2.025,30	30,00%	-	0,00%
01.07	POZA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LADRILLO TARRAJUEADO DE 1.00 X 2.00 X 1.20 m.	urd	2,00	405,89	2,00	811,16	100,00%	-	0,00%	2,00	100,00%
02.02	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA										
02.01	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	GLB	1,00	10.800,00	0,50	9720,00	90,00%	1.000,00	10,00%	1,00	100,00%
02.02	RECURSOS PARA RESERVIAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD, DURANTE EL TRABAJO	GLB	1,00	7.000,00	1,00	7.000,00	100,00%	-	0,00%	1,00	100,00%
02.03	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	GLB	1,00	2.000,00	1,00	2.000,00	100,00%	-	0,00%	1,00	100,00%
02.04	TRABAJOS PREVENTIVOS										
03.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL (Con piso, lampa y carretilla)	M2	1.833,84	2,70	4.851,37	1.833,84	100,00%	-	0,00%	1.833,84	100,00%
03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	M2	1.833,84	2,70	4.851,37	1.833,84	100,00%	-	0,00%	1.833,84	100,00%
04.01	EXCAVACION DE TERRENO MANUAL	M3	275,08	48,23	13.207,11	261,80	12,63%	640,49	4,83%	275,08	100,00%
04.02	CAMA DE ARENA e=0.10 m. -ANTICONTAMINANTE	M2	148,71	103,29	15.933,81	139,63	95,17%	753,53	4,83%	148,71	100,00%
04.03	INVELACION REGLADO Y AFISCONADO MANUAL	M2	1.833,84	6,14	11.257,78	1.074,33	58,57%	548,45	4,83%	1.833,84	100,00%
04.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 100M. DE LA OBRA	M3	343,85	19,29	8.832,87	337,25	95,17%	200,21	4,83%	343,85	100,00%
02.05	VEREDA PEATONAL L = 016.92 M										
03.01	SOLADO MEZCLA 1:10 e=2" vecesdo con carretilla	M2	91,69	29,49	2.703,84	87,26	95,17%	130,64	4,83%	91,69	100,00%
03.02	MORTERO 1:3:10 Kg/cm2	M3	379,85	643,77	242.604,72	359,66	95,17%	11.710,18	4,83%	379,85	100,00%
03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	641,84	35,83	22.897,13	610,87	95,17%	1.109,68	4,83%	641,84	100,00%
03.04	RELLENO DE JUNTAS DE DILATACION Y AISLAMIENTO DE 1" X 2" CON MORTERO ASFALTICO Y TECNICOPO	M	611,84	8,94	6.469,85	594,78	97,09%	-	0,00%	611,84	100,00%
03.05	CURADO	M2	1.833,84	0,78	1.430,40	1.745,33	95,17%	69,04	4,83%	1.833,84	100,00%
03.06	BRUNADO	m	2.282,30	1,86	4.283,68	2.181,66	95,17%	205,79	4,83%	2.282,30	100,00%
02.06	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL										
03.01	ELABORACION E IMPL. Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	urd	1,00	12.000,00	1,00	12.000,00	100,00%	-	0,00%	1,00	100,00%
01.02	PROGRAMAS DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y MITIGACION DE LA CONSTRUCCION	urd	1,00	5.000,00	1,00	5.000,00	100,00%	-	0,00%	1,00	100,00%
01.03	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS EN LA CONSTRUCCION	urd	1,00	5.000,00	1,00	5.000,00	100,00%	-	0,00%	1,00	100,00%
01.04	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	urd	1,00	7.000,00	0,80	5.600,00	80,00%	1.400,00	20,00%	-	0,00%
01.05	PLAN DE MONITOREO DE SEGURIDAD AMBIENTAL Y SALUD EN LA CONSTRUCCION	urd	1,00	5.000,00	1,00	5.000,00	100,00%	-	0,00%	1,00	100,00%
01.06	PROGRAMA DE ABANDONO EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION	urd	1,00	15.000,00	1,00	15.000,00	100,00%	-	0,00%	1,00	100,00%
03.02	MEDIOS DE CONCIENCIACION										
32.01	LETREROS AMBIENTALES	urd	500	524,37	5,00	2.621,85	100,00%	-	0,00%	5,00	100,00%
32.02	LETREROS DE PREVENION WL	urd	500	598,37	5,00	2.531,85	100,00%	-	0,00%	5,00	100,00%

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

ING. JUAN VICTOR ACEVEDO VASQUEZ
Jefe de Supervisión - CIP 123810

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

JAZHELL ALEXIS FLORES RODRIGUEZ
Representante Común



CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA
MARCE PASCUAL CORTES MEDINA
REPRESENTANTE COMUN

**VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 04
PERIODO DEL 21/01/2021 AL 31/01/2021**

"ELABORACION DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH, DEL DISTRITO DE PUINHANUA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO"
LICITACION PUBLICA N° 110-2020-CO-OIGL (PRIMERA CONVOCATORIA)

MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH DEL DISTRITO DE PUINHANUA

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH - PUINHANUA - REQUENA - LORETO
CONSORCIO VEREDAS PUINHANUA
ING. JOSE ESTEBAN TOCARI QUESPE
ING. JOAN VICTOR ACEVEDO VASQUEZ

Valor Referencial (CRGV)
Valor Referencial (SRGV)
Monto Ofertado (SRGV)
Plazo de Ejecución

S/ 2,469,657.97
S/ 2,940,388.11
S/ 3,019,188.04
: 80 d.e.

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL		ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		SALDO	
		Und	Métro	Unidad	Métro	Métro	%	Métro	%	Métro	%
01	COMUNIDAD - SAN CARLOS										
01.01	OBRAS PROVISIONALES										
01.01.01	CARTEL DE OBRA DE (3.60 X 2.40M), GIGANTOGRAFIA	und	1.00	590.38	1.00	590.38	100.00%	1.00	0.00%	990.38	100.00%
01.01.02	ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN	m ²	3.00	2,000.00	4,000.00	66.67%	0.00%	3.00	33.33%	6,000.00	100.00%
01.01.03	FLETE TERRESTRE	ton	293.24	20.00	8,654.80	0.00%	0.00%	293.24	100.00%	5,864.80	100.00%
01.01.04	FLETE FLUMINAL	ton	293.24	120.00	35,183.60	0.00%	0.00%	293.24	100.00%	35,183.60	100.00%
01.01.05	FLETE CARGUO Y DESCARGUO	ton	293.24	45.00	13,195.60	0.00%	0.00%	293.24	100.00%	13,195.60	100.00%
01.01.06	TRASORTE DE MATERIALES	ton	293.24	30.00	6,797.20	0.00%	0.00%	293.24	100.00%	6,797.20	100.00%
01.01.07	POZA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LADRILLO TARRAJEADO DE 1.00 X 2.00 X 1.20 m.	und	2.00	405.55	811.16	0.00%	0.00%	2.00	100.00%	811.16	100.00%
03.02	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA										
03.02.01	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	GLB	1.00	10,600.00	10,600.00	100.00%	100.00%	1.00	100.00%	10,600.00	100.00%
03.02.02	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD, DURANTE EL TRABAJO	GLB	1.00	7,000.00	7,000.00	100.00%	100.00%	1.00	100.00%	7,000.00	100.00%
03.02.03	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	GLB	1.00	2,000.00	2,000.00	100.00%	100.00%	1.00	100.00%	2,000.00	100.00%
03.03	TRABAJOS PRELIMINARES										
03.03.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL (con piso, limpia y carretilla)	M2	2,881.95	7,781.27	2,881.95	100.00%	100.00%	2,881.95	100.00%	7,781.27	100.00%
03.03.02	TRAZO VUELOS Y REPAINTADO	M2	2,881.95	7,752.45	2,881.95	100.00%	100.00%	2,881.95	100.00%	7,752.45	100.00%
03.03.03	DEMOLICION DE VEREDA-EXISTENTE	m ³	1,333.30	23,285.68	0.00%	0.00%	0.00%	1,333.30	0.00%	23,285.68	100.00%
04.01	EXCAVACION DE TERRENO MANUAL	M3	432.29	20,849.35	0.00%	0.00%	0.00%	432.29	34.70%	20,849.35	65.30%
04.02	CAMA DE AREJA e=0.10 m. -ANTICONTAMINANTE	M3	230.56	109.20	24,509.22	0.00%	0.00%	230.56	20.82%	109.20	79.18%
04.03	RELINCEO RECALZO Y APISONADO MANUAL	M2	2,881.95	8.14	17,651.17	0.00%	0.00%	2,881.95	16.66%	8.14	83.34%
04.04	RELUCCION DE MATERIAL EXCEDENTE A 100M. DE LA OBRA e=carretilla	M3	540.37	19.29	10,423.74	0.00%	0.00%	540.37	0.00%	19.29	100.00%
03.05	VEREDA PEATONAL L=2.03x1.94 m										
03.05.01	SOLADO MEZCLA 1:10 e=2" vesado con carretilla	M2	144.10	29.49	4,249.51	0.00%	0.00%	144.10	20.82%	29.49	79.18%
03.05.02	MORTERO F=2:10 Kg/m ²	M3	450.00	64.77	316,439.61	0.00%	0.00%	450.00	0.00%	64.77	100.00%
03.05.03	CONFORTADO Y DESECONFORTADO	M2	1,000.00	31.81	35,141.00	0.00%	0.00%	1,000.00	17.35%	31.81	82.65%
03.05.04	RELLENO DE JUNTAS DE DILATACION Y AISLAMIENTO DE 1" X 2" CON MORTERO ASFALTICO Y TECHOMPO	M	600.65	0.94	6,539.21	0.00%	0.00%	600.65	0.00%	0.94	100.00%
03.05.05	CURADO	M2	2,881.95	0.78	2,247.00	0.00%	0.00%	2,881.95	0.00%	0.78	100.00%
03.05.06	BRUNADO	m	8,655.52	1.88	12,733.13	0.00%	0.00%	8,655.52	0.00%	1.88	100.00%
03.06	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL										
03.06.01	MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL	und	1.00	12,000.00	12,000.00	100.00%	100.00%	1.00	100.00%	12,000.00	100.00%
11.01	ELABORACION DE INPL. Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	und	1.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	100.00%	1.00	100.00%	5,000.00	100.00%
11.02	PROGRAMAS DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y MITIGACION DE LA CONSTRUCCION	und	1.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	100.00%	1.00	100.00%	5,000.00	100.00%
11.03	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS EN LA CONSTRUCCION	und	1.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	100.00%	1.00	100.00%	5,000.00	100.00%
11.04	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	und	1.00	7,000.00	7,000.00	100.00%	100.00%	1.00	100.00%	7,000.00	100.00%
11.05	PLAN DE MONITOREO DE SEGURIDAD AMBIENTAL Y SALUD EN LA CONSTRUCCION	und	1.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	100.00%	1.00	100.00%	5,000.00	100.00%
11.06	PROGRAMA DE ABANDONO EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION	und	1.00	15,000.00	15,000.00	100.00%	100.00%	1.00	100.00%	15,000.00	100.00%
04.02	MEDICOS DE COCIENTIZACION										
2.01	LETREROS AMBIENTALES	und	5.00	524.37	2,621.65	100.00%	100.00%	5.00	100.00%	2,621.65	100.00%
2.02	LETREROS DE PREVENCIÓN	und	5.00	509.37	2,531.65	100.00%	100.00%	5.00	100.00%	2,531.65	100.00%
04	COMUNIDAD - ANCASH										
4.01	CERAS PROVISIONALES										
4.01.01	CARTEL DE OBRA DE (3.60 X 2.40M), GIGANTOGRAFIA	und	1.00	590.38	590.38	100.00%	100.00%	1.00	0.00%	990.38	100.00%
4.01.02	ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN	m ²	3.00	2,000.00	6,000.00	0.00%	0.00%	3.00	33.33%	6,000.00	100.00%
4.01.03	FLETE TERRESTRE	ton	249.59	20.00	4,831.50	0.00%	0.00%	249.59	16.67%	4,831.50	100.00%
4.01.04	FLETE FLUMINAL	ton	249.59	120.00	35,183.60	0.00%	0.00%	249.59	30.00%	35,183.60	100.00%
4.01.05	FLETE CARGUO Y DESCARGUO	ton	249.59	45.00	13,195.60	0.00%	0.00%	249.59	30.00%	13,195.60	100.00%
4.01.06	TRASORTE DE MATERIALES	ton	249.59	30.00	6,797.20	0.00%	0.00%	249.59	30.00%	6,797.20	100.00%
4.01.07	POZA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LADRILLO TARRAJEADO DE 1.00 X 2.00 X 1.20 m.	und	2.00	405.55	811.16	100.00%	100.00%	2.00	0.00%	811.16	100.00%
4.01.08	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA										
4.01.08.01	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	GLB	1.00	10,600.00	10,600.00	100.00%	100.00%	1.00	100.00%	10,600.00	100.00%
4.01.08.02	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD, DURANTE EL TRABAJO	GLB	1.00	7,000.00	7,000.00	100.00%	100.00%	1.00	100.00%	7,000.00	100.00%
4.01.08.03	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	GLB	1.00	2,000.00	2,000.00	100.00%	100.00%	1.00	0.00%	2,000.00	100.00%
4.01.08.04	TRABAJOS PRELIMINARES										
4.01.08.04.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL (con piso, limpia y carretilla)	M2	2,011.64	270	5,431.43	100.00%	100.00%	2,011.64	0.00%	5,431.43	100.00%

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

CONSORCIO VEREDAS PUINHANUA

ALEXIS FLORES RODRIGUEZ
Representante Común

MARCE PASCUAL COPIA-HEDINA
Representante Común

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

ING. JOAN VICTOR ACEVEDO VASQUEZ
Jefe de Supervisión - CIP 123510

CONSORCIO VEREDAS PUINHANUA
INGENIERO CIVIL
M.C. CIP N° 66394



VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 04
PERIODO DEL 21/01/2021 AL 31/01/2021

"MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH, DEL DISTRITO DE PUINAHUA, PROVINCIA DE RECUEÑA, DEPARTAMENTO LORETO"

LEGISLACION PUBLICA N° 010-2005-05-001 (PRIMERA CONVOCATORIA)

MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH DEL DISTRITO DE PUINAHUA

GOBIERNO REGIONAL DEL LORETO

HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH- PUINAHUA - RECUEÑA - LORETO

CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA

ING. JORGE ESTEBAN TOCAS CUSPUE

ING. JUAN VICTOR ACEVEDO VASQUEZ

UNICA

Valor Referencial (C/0/V)
Valor Referencial (S/0/V)
Monto Otorgado (S/0/V)
Plazo de Ejecución

S/ 3,489,657.97
S/ 2,840,384.11
S/ 3,019,196.04
: 90 d.c.

C/C	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL		ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		SALDO	
		Und	Unidad	Parcial	%	Parcial	%	Parcial	%	Parcial	%
03.02	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO	und	2,011.64	5,411.31	100.00%	2,011.64	0.00%	47.65	5,411.31	100.00%	20,133.05
03.03	DEMOLICION DE VEREDA EXISTENTE	m3	1,293.68	-	0.00%	-	0.00%	-	47.65	0.24%	-
04.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m3	1,293.68	18.72	100.00%	2,011.64	0.41%	2.85	2,011.64	0.24%	1,204.13
04.01	EXCAVACION DE TERRENO MAJUAL	m3	301.75	48.23	47.43%	6,903.16	52.57%	158.62	7,650.24	100.00%	-
04.02	CAMA DE ARENA e = 0.10 m. - ANTICONTAMINANTE	m3	160.93	102.22	47.43%	8,113.12	52.57%	84.60	6,592.13	100.00%	-
04.03	NIVELACION REGLADO Y AFISADO MANUAL	m2	2,011.64	6.14	47.43%	5,658.67	52.57%	1,057.46	6,492.60	100.00%	-
04.04	ELEVACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 100M DE LA OBRA	m3	371.16	19.25	47.43%	3,451.17	52.57%	193.27	3,824.63	100.00%	-
04.05	VEREDA PEATONAL L = 1078.64 m	m	103.53	29.49	47.43%	1,406.57	52.57%	52.87	1,559.14	100.00%	-
05.01	SOLDADO MEZCLA 1:10 e=2" colocado con carpeta	m3	413.39	64.377	47.43%	126,230.42	52.57%	217.31	139,897.66	100.00%	-
05.02	MORTERO (1:2:10) 60cm2	m3	35.83	5.89472	47.43%	11,965.79	52.57%	370.11	13,261.04	100.00%	-
05.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m	870.55	8.84	47.43%	2,843.46	0.00%	318.06	25,238.83	47.43%	3,151.26
05.05	RELLENO DE JUNTAS DE DILATACION Y AISLAMIENTO DE 1" X 2" CON MORTERO ASFALTICO Y TECNOSPO	m	2,011.64	0.78	47.43%	954.18	0.00%	1,057.46	824.82	100.00%	-
05.08	BRUJADO	m	2,514.55	1.86	47.43%	2,218.48	52.57%	1,321.82	2,458.59	100.00%	-
06.03	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	und	1.00	12.000.00	100.00%	12.000.00	0.00%	-	12.000.00	100.00%	-
06.01	MEJORA DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL	und	1.00	5,000.00	100.00%	5,000.00	0.00%	-	5,000.00	100.00%	-
01.01	ELABORACION E IMPL. Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	und	1.00	5,000.00	100.00%	5,000.00	0.00%	-	5,000.00	100.00%	-
01.02	PROGRAMAS DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y MITIGACION DE LA CONSTRUCCION	und	1.00	5,000.00	100.00%	5,000.00	0.00%	-	5,000.00	100.00%	-
01.03	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS EN LA CONSTRUCCION	und	1.00	5,000.00	100.00%	5,000.00	0.00%	-	5,000.00	100.00%	-
01.04	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	und	1.00	7,000.00	80.00%	5,600.00	20.00%	0.20	1,400.00	100.00%	-
01.05	PLAN DE MONITOREO DE SEGURIDAD AMBIENTAL Y SALUD EN LA CONSTRUCCION	und	1.00	6,000.00	100.00%	6,000.00	0.00%	-	6,000.00	100.00%	-
01.06	PROGRAMA DE AVANZANDO EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION	und	1.00	15,000.00	100.00%	15,000.00	0.00%	-	15,000.00	100.00%	-
02.01	MEJORA DE LAS COMUNICACIONES	und	1.00	15,000.00	100.00%	15,000.00	0.00%	-	15,000.00	100.00%	-
02.02	LETREOS AMBIENTALES	und	5.00	524.37	100.00%	2,621.85	0.00%	-	2,621.85	100.00%	-
02.03	LETREOS DE PREVENION WAL	und	8.00	608.37	100.00%	2,531.85	0.00%	-	2,531.85	100.00%	-
TOTAL COSTO DIRECTO		CD	2,450,323.43	57.32%	1,442,429.41	21.03%	529,239.49	78.36%	1,971,668.50	21.64%	478,654.53
GASTOS GENERALES		GG	245,032.34	52.93355	144,242.94	52.93355	52,933.55	197,166.89	197,166.89	47,865.45	
UTILIDAD		UT	247,787.31	144,098.69	52,871.02	196,969.71	52,871.02	196,969.71	196,969.71	47,817.60	
PLAN COVD		ST-CO-CO-UT-COVD	79,062.96	3,019,196.04	635,034.46	2,365,805.50	635,034.46	2,365,805.50	2,365,805.50	79,062.96	
SUB TOTAL			3,019,196.04	1,730,771.04	635,034.46	635,034.46	635,034.46	2,365,805.50	2,365,805.50	653,390.54	
FACTOR DE RELACION = 10000				1,730,771.04	635,034.46	635,034.46	635,034.46	2,365,805.50	2,365,805.50	653,390.54	
TOTAL PRESUPUESTO = \$60V.			3,019,196.04	1,730,771.04	635,034.46	635,034.46	635,034.46	2,365,805.50	2,365,805.50	653,390.54	

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

ING. JUAN VICTOR ACEVEDO VASQUEZ
Jefe de Supervision - CIP 123310



CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

JAZHELL ALEXIS FLORES RODRIGUEZ
Representante Común



"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

ACTA DE REINICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA
CONTRATO N° 037-2020-GRL-GRI

OBRA: "MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH, DEL DISTRITO DE PUINAHUA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO"

Por la presente Acta, suscrita por una parte por el **GOBIERNO REGIONAL DE LORETO – SEDE CENTRAL**, con RUC N° 20493196902, con domicilio legal en Av. Abelardo Quiñonez km 1.5 Belén – Maynas – Loreto, en adelante **LA ENTIDAD**, debidamente representado por el Gerente Regional de Infraestructura **Ingeniero EDI WISBERTO RUIZ ZARATE**, identificado con DNI N° 32914247, con las facultades que le confiere la Resolución Ejecutiva Regional N° 235-2019-GRL-GR, de fecha 26 de Marzo del 2019; y de otra parte el **CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA**, con domicilio legal en Jirón Túpac Amaru N° 339 – Iquitos – Maynas – Loreto; consorcio conformado por las Empresas; **CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA MC E.I.R.L.**, con RUC N° 20528162895, con domicilio en Jirón Túpac Amaru N° 339 – Iquitos – Maynas – Loreto, inscrita en la Partida Electrónica N° 11029896, del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Iquitos, con una participación del 26%, debidamente representado por su Gerente, Señora **REYNA NEYSI CORREA TANCHIVA**, identificada con DNI N° 74074016, según poder inscrito en inscrita en la Partida Electrónica N° 11029896, Asiento C00002, del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Iquitos; la Empresa **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES MAR & MAR S.A.C.**, con RUC N° 20528162976, con domicilio legal en Jirón Túpac Amaru N° 339 – Iquitos – Maynas – Loreto, inscrita en la Partida Electrónica N° 11029897, del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Iquitos, con una participación del 50%, debidamente representado por su Gerente General, Señora **REYNA NEYSI CORREA TANCHIVA**, identificada con DNI N° 74074016, según poder inscrito en la Partida Registral N° 11029897, Asiento N° C00002, del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Iquitos; y la Empresa **M.L. CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.**, con RUC N° 20493733096, con domicilio legal en calle Sargento Lores N° 1450 – Iquitos – Maynas – Loreto, inscrita en la Partida Electrónica N° 11024713, del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Iquitos, con una participación del 24%, debidamente representado por su Titular Gerente, Señora **MARIA LINA SATALAYA PEREZ**, identificada con DNI N° 05313070, según poder inscrito en la Partida Registral N° 11024713, Asiento N° A0001, del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Iquitos; que en común acuerdo designan como Representante Común del Consorcio al Señor **MARDE PASCUAL CORREA MEDINA**, identificado con DNI N° 05855542, a quien en adelante se le denominara **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:



CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA
MARDE PASCUAL CORREA MEDINA
REPRESENTANTE COMÚN

I.- GENERALIDADES

Obra:	:"MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH, DEL DISTRITO DE PUINAHUA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO"
Proceso de Selección	: LICITACIÓN PÚBLICA N° 010-2020-CSO-GRL PRIMERA CONVOCATORIA
Presupuesto contratado	: S/ 3'019,196.04 (SIN IGV)
Contratista	: CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA
Contrato de obra	: CONTRATO N° 037-2020-GRL-GRI.
Rep. Común del Consorcio	: Marde Pascual Correa Medina.
Plazo de ejecución	: 90 días calendarios.
Computo Inicio Plazo Cont.	: 07 de octubre 2020



"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

Supervisor de Obra : CONSORCIO SUPERVISOR HBSA.

II.- ANTECEDENTES

Con fecha 07 de setiembre del 2020, el comité de selección de Obras adjudicó la buena pro de la LICITACION PUBLICA N° 010-2020-CSO-GRL- PRIMERA CONVOCATORIA, para la contratación de la ejecución de la obra denominada MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH, DEL DISTRITO DE PUINAHUA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO, al CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA; consorcio conformado por las empresas; CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA MC E.I.R.L., con RUC N° 20528162895, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES MAR & MAR S.A.C., con RUC N° 20528162976, M.L. CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L., con RUC N° 20493733096; cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

Con fecha 22 de setiembre del 2020, se suscribió el Contrato N° 037-2020-GRL-GRI, entre LA ENTIDAD y EL CONTRATISTA, para la ejecución de la Obra en mención, por el monto de S/. 3'019,196.04 (Tres Millones Diecinueve Mil Ciento Noventa y Seis con 04/100 Soles), exonerado del IGV, con plazo de ejecución de Noventa (90) días calendario.

Con fecha 11 de enero del 2021, se suscribió el Acta de Suspensión de Plazo de Ejecución Contractual del Contrato N° 037-2020-GRL-GRI, entre el GOBIERNO REGIONAL DE LORETO y la Empresa Contratista CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA, en la que ambas partes acuerdan; "(...)SUSPENDER EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH, DEL DISTRITO DE PUINAHUA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO" y por ende, paralizar la ejecución de las actividades que forman parte contractual, a partir del 11 de diciembre del 2020, hasta que se apruebe la modificación de la obra N° 01 emitiendo la resolución ya se aprobando o denegándola. (...)".

Mediante Carta N° 004-2021-CSHBSA, suscrita por la señora Jazhell Alexis Flores Rodriguez, Representante común del Consorcio Supervisor HBSA, remite al Gobierno Regional de Loreto, Ingeniero Edi Wisberto Ruiz Zarate, Gerente Regional de Infraestructura, con atención a la Sub Gerencia de Supervisión y Control, en la cual adjunta el Acta de levantamiento de la suspensión de plazo de ejecución de obra N° 01 del Contrato N° 037-2020-GRL-GRI que con fecha 20 de enero del 2021 siendo las 5 .00 pm, las partes acuerdan: "(...) Reiniciar la ejecución de la obra a partir del 21 de enero del 2021(...)".

Mediante Informe Técnico N° 040-2021-GRL-GRI-SGSyC-JAZP, de fecha 27 de enero 2021, suscrito por el Ingeniero José Armando Zumaran Pérez, Coordinador de Obra, comunica al Ingeniero Raúl Flores Aquepucho, Sub Gerente de Supervisión y Control de la Gerencia Regional de Infraestructura, en la que analiza lo siguiente : "(...) Adjunto al documento 1 de la referencia, el contratista remite 03 juegos originales del Acta de levantamiento de Suspensión de Plazo de Ejecución de Obra, firmada por el Consorcio Supervisor HBSA (Jazhell Alexis Flores Rodriguez, Representante común y el Ing. Juan Víctor Acebedo Vásquez, Jefe de Supervisión) y por el contratista – CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA (Sr. Marde Pascual Correa Medina, Representante Común del Consorcio y el Ing. Jorge Esteban Tocas Quispe, Residente de Obra). Dicha Acta de levantamiento de suspensión de plazo de ejecución de Obra debe ser formalizada con un Acta similar, firmada por el Gerente Regional de Infraestructura Ing. Edi W. Ruiz Zarate por parte de la Entidad, y por el Representante Común del Consorcio, Sr. Marde Pascual Correa Medina, por el Consorcio Veredas Puinahua.(...)"



CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA
MARDE PASCUAL CORREA MEDINA
REPRESENTANTE COMUN



"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

III.- ACUERDOS

En tal sentido, en atención a lo descrito por el Representante Común del CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA y el Informe Técnico del Coordinador de Obra, las partes acuerdan lo siguiente:


1. **REINICIAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA; "MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH, DEL DISTRITO DE PUINAHUA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO"**, a partir del **21 de Enero del 2021**; debido que la causal de la supervisión ha culminado, en consecuencia; el Contratista deberá presentar los calendarios reprogramados según corresponda, de acuerdo a lo expuesto anteriormente.

En señal de conformidad con lo señalado en el contenido de la presente Acta, las partes suscriben la misma en Tres (3) ejemplares del mismo contenido, en la ciudad de Iquitos, a los 27 días del mes de Enero del Año Dos Mil Veintiuno.

 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

Ing. Edi Wisberto Ruiz Zarate
Gerente Regional de Infraestructura

LA ENTIDAD


CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA
MARDE PASCUAL CORREA MEDINA
REPRESENTANTE COMUN

EL CONTRATISTA

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA
[Signature]
 JAZHELL ALEXIS FLORES RODRIGUEZ
 Representante Común

PANEL FOTOGRAFICO



FOTO N° 01: SE OBSERVA A JEFE DE SEGURIDAD, REALIZANDO LAS CHARLAS CORRESPONDIENTES ANTES DEL INICIO DE LOS TRABAJOS DE OBRA EN LA COMUNIDAD DE ANCASH.

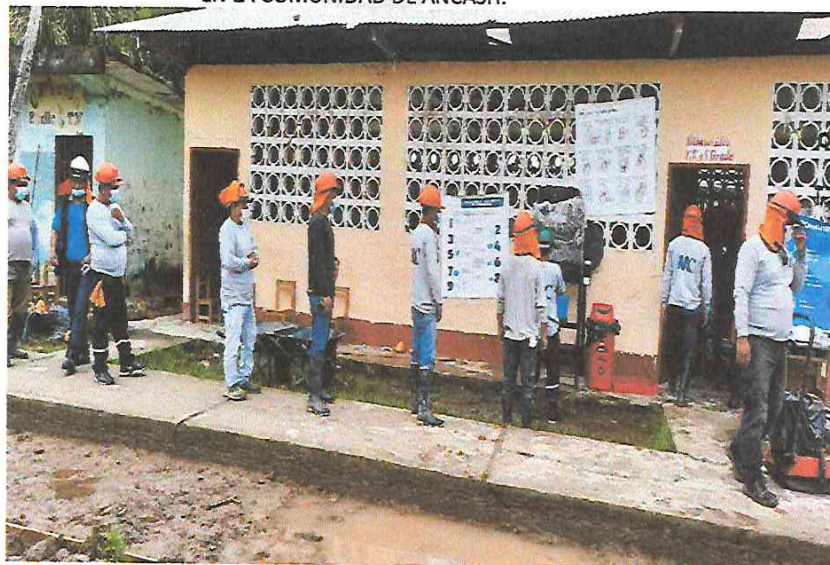


FOTO N° 02: SE OBSERVA AL PERSONAL EFECTUANDO EL CORRECTO LAVADO DE MANOS.

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA
[Signature]
 JUAN VICTOR ACEVEDO VASQUEZ
 Ing. Supervision - CIP 123510

CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA
[Signature]
 MARCE PASCUAL CORREA MEDINA
 REPRESENTANTE COMUN

[Signature]
 ESTEBAN YOLAS QUISPE
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 84502

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

JAZHELL ALEXIS FLORES RODRIGUEZ
Representante Común

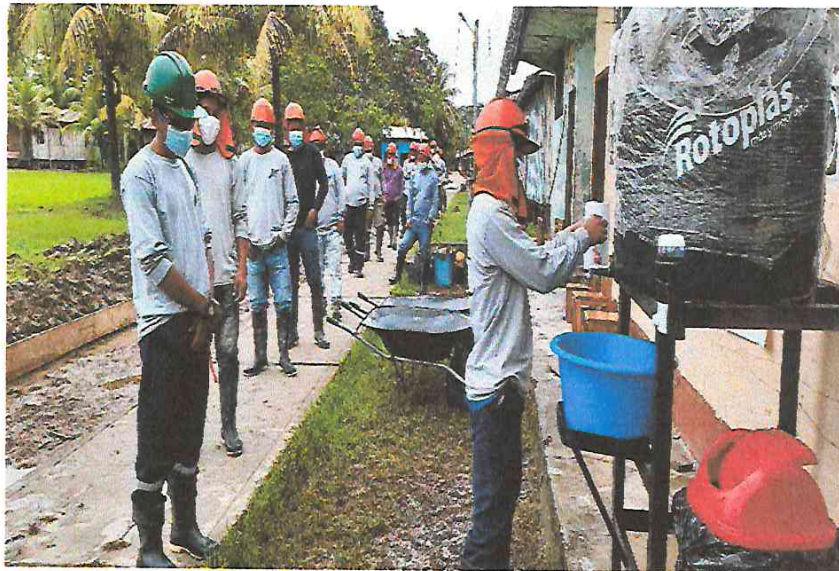


FOTO N° 03: SE OBSERVA LAVADO DE MANOS DEL PERSONAL DE OBRA.



CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

Ing. JUAN VICTOR ACEVEDO VASQUEZ
Jefe de Supervisión - CIP 123510

CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA

PAUL DE PASQUAL CERREA MEDINA
REPRESENTANTE COMUN

FOTO N° 04: SE OBSERVA ENCOFRADO EN VEREDAS, Y EXCAVACIÓN MANUAL EN LA COMUNIDAD DE HUACRACHIRO.



JORGE ESTEBAN TOMÁS QUIPE
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 64602

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA
Jazhell
 JAZHELL ALEXIS FLORES RODRIGUEZ
 Representante Comun

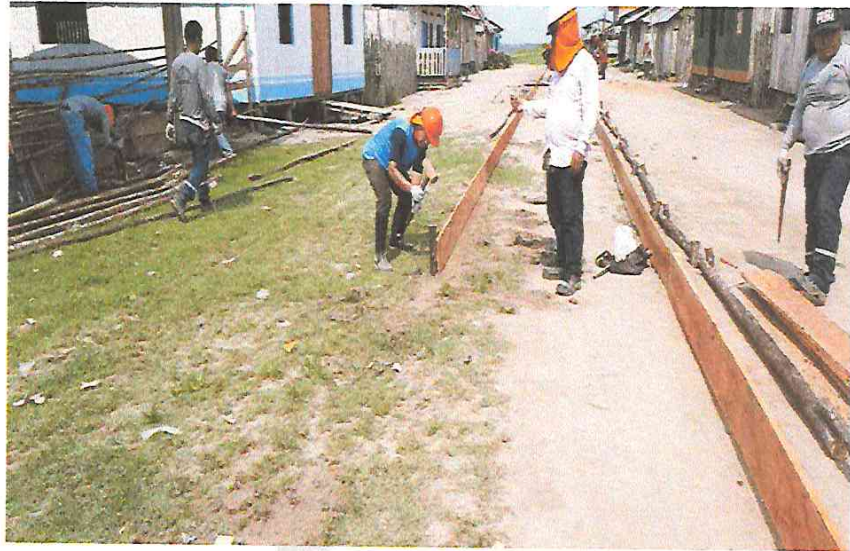


FOTO N° 05: SE OBSERVA ENCOFRADO EN VEREDAS, Y EXCAVACIÓN MANUAL EN LA COMUNIDAD DE HUACRACHIRO.



CONSORCIO SUPERVISOR HBSA
Juan Victor
 Ing. JUAN VICTOR ACVEDO VASQUEZ
 Jefe de Supervisión - CIP 123510

CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA
Juan Victor
 JUAN VICTOR ACVEDO VASQUEZ
 REPRESENTANTE COMUN

FOTO N° 06: SE OBSERVA ENCOFRADO EN VEREDAS, Y EXCAVACIÓN MANUAL EN LA COMUNIDAD DE HUACRACHIRO.

Juan Victor

 JUAN VICTOR ACVEDO VASQUEZ
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 64652

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA
J2
 JAZHELL ALEXIS FLORES RODRIGUEZ
 Representante Comun



FOTO N° 07: SE OBSERVA ENCOFRADO EN VEREDAS, COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA, Y COMPACTADO DE MATERIAL EN LA COMUNIDAD DE HUACRACHIRO.



CONSORCIO SUPERVISOR HBSA
J2
 ING. JUAN WILFOR ACEVEDO VASQUEZ
 Jefe de Supervision - CIP 123510

CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA
J2
 MARCE PASCUAL CORREA MEDINA
 REPRESENTANTE COMUN

FOTO N° 08: SE OBSERVA COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA EN LA COMUNIDAD DE HUACRACHIRO.

J2
 ING. ESTEBAN TORRES QUISPE
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 64562

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA
Jc
 JAZHELL ALEXIS FLORES RODRIGUEZ
 Representante Común



FOTO N° 09: SE OBSERVA EXCAVACIÓN MANUAL EN VEREDAS EN LA COMUNIDAD DE HUACRACHIRO.



CONSORCIO SUPERVISOR HBSA
Jc
 Ing. JUAN VICTOR ACEVEDO VASQUEZ
 Jefe de Supervisión - CIP 123510

CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA
Jc
 HARDE PASCUAL CORREA MEDINA
 REPRESENTANTE COMÚN

Jc
 JORGE ESTEBAN TOCASA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 64502

FOTO N° 10: SE OBSERVA ENCOFRADO EN VEREDAS Y EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS EN LA COMUNIDAD DE HUACRACHIRO.

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

Jazhell Alexis Flores Rodriguez
JAZHELL ALEXIS FLORES RODRIGUEZ
Representante Común



FOTO N° 11: SE OBSERVA COLOCACION DE CAMA DE ARENA, ENCOFRADO EN VEREDAS Y COMPACTACIÓN DE TERRENO EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA.



CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

Juan Victor Acevedo Vasquez
Ing. JUAN VICTOR ACEVEDO VASQUEZ
Jefe de Supervision - CIP 123510

CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA

Marde Pascual Correa Medina
MARDE PASCUAL CORREA MEDINA
REPRESENTANTE COMUN

Jorge Esteban Tocas Quepe
JORGE ESTEBAN TOCAS QUEPE
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 64502

FOTO N° 12: SE OBSERVA COLOCACION DE CAMA DE ARENA, ENCOFRADO EN VEREDAS Y COMPACTACIÓN DE TERRENO EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA.

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

JAZHELL ALEXIS FLORES RODRIGUEZ
Representante Común



FOTO N° 13: SE OBSERVA ENCOFRADO DE VEREDAS EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA.

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

Ing. JUAN VICTOR ACEVEDO VASQUEZ
Jefe de Supervisión - CIP 123510



CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA

MANDE PASCUAL CORREA MEDINA
REPRESENTANTE COMÚN

JORGE ESTEBAN TOCASCANSPE
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 54502

FOTO N° 14: SE OBSERVA COMPACTACIÓN DE VEREDA Y ENCOFRADO EN LA COMUNIDAD DE ANCASH.

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA
Jr
 JAZHELL ALEXIS FLORES RODRIGUEZ
 Representante Común



FOTO N° 15: SE OBSERVA VACEO DE MORTERO DE VEREDA EN LA COMUNIDAD DE ANCASH.

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA
Jr
 Ing. JUAN VICTOR ACEVEDO VASQUEZ
 Jefe de Supervisión - CIP 123510



CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA
Jr
 MARCE PASCUAL CORREA MEDINA
 REPRESENTANTE COMUN

Jr

 JORGE ESTEBAN TOCAS QUISPE
 INGENIERO C-VI
 Reg. CIP N° 64572

FOTO N° 16: SE OBSERVA COLOCACION DE CAMA DE ARENA, VACEO DE SOLADO Y ENCOFRADO DE VEREDAS EN LA COMUNIDAD DE HUACRACHIRO.

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

JZ
JAZHELL ALEXIS FLORES RODRIGUEZ
Representante Comun



CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

FOTO N° 17: SE OBSERVA VACEO DE MORTERO EN LA COMUNIDAD DE ANCASH. *JV*
Ing. JUAN VICTOR ACEVEDO VASQUEZ
Jefe de Supervisión - CIP 123510



CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA
Marde Pascual
MARDE PASCUAL CORREA MEGINA
REPRESENTANTE COMUN

Jorge Esteban
JORGE ESTEBAN TOCAS QUNISPE
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 64502

FOTO N° 18: SE OBSERVA VACEO DE MORTERO EN LA COMUNIDAD DE ANCASH.

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA
Jr
 JAZHELL ALEXIS FLORES RODRIGUEZ
 Representante Comun



FOTO N° 19: SE OBSERVA TRABAJOS DE BRUÑADO EN LA COMUNIDAD DE HUACRACHIRO.

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA
Jr
 Ing. JUAN VICTOR ACEVEDO VASQUEZ
 Jefe de Supervisión - CIP 123510



CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA
Jr
 MARCE PASCUAL CORREA MEDINA
 REPRESENTANTE COMUN

Jr
 JORGE ESTEBAN TOCAS QUISPE
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 54592

FOTO N° 20: SE OBSERVA MUESTRA DE PROBETAS PARA CONTROL DE CALIDAD.



VALORIZACION

N.º 5



“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Belén, 10 de febrero de 2021

CARGO

Oficio n° 0677-2021-GRL-GRI-SGSyC

Ingeniero Edi Wisberto Ruiz Zárate
Gerente Regional de Infraestructura
Presente



Asunto: Remite Valorización de Obra n° 05
febrero 2021.

Obra: “Mejoramiento de Veredas Peatonales en
las Localidades de Huacrachiro, Bellavista, San
Carlos y Ancash, del Distrito de Puinahua,
Provincia de Requena, Departamento de Loreto”

- Ref. : a. Informe n° 094-2021-GRL/GRI/SGSyC/JAZP
b. Carta n° 011-2021-CSHBSA
c. Carta n° 002-2021-JVAV/JS/CSHBSA
d. Carta n° 014-2021-CVP

Tengo el agrado de saludarle cordialmente, en atención a la referencia a), remitirle la valorización n° 05 por ejecución de obra, correspondiente a febrero de 2021, aprobada por el Supervisor, la misma que asciende a la suma de (S/. 606 303.93); asimismo se indica que los reajustes serán pagados en la liquidación de obra, y de acuerdo a la amortización por adelanto directo y materiales, consideramos el monto neto a pagar la suma de **Cuatrocientos seis mil ciento veintiuno con 41/100 Soles (406 121.41)**, sin incluir IGV, de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización bruta n° 05 – febrero 2021	S/. 606 303.93
Regularización valorizaciones anteriores	S/. - 4 165.37
Amortización adelanto directo	S/. - 65 339.05
Amortización adelanto materiales	S/. - 130 678.10
Retención Garantía de Fiel Cumplimiento	S/.
Neto a Pagar	S/. 406 121.41

Asimismo, la obra a enero de 2021, tiene un avance real acumulado ejecutado de 98.44%, versus un avance programado de 100.00%, encontrándose la obra terminada.

Por lo tanto, encontrándose **conforme** la documentación que sustenta el Supervisor y revisada por el Coordinador, se solicita continuar con el trámite respectivo a favor de Consorcio Veredas Puinahua, siendo a facturar a nombre de **Constructora y Consultoría M.C. Empresa Individual de Responsabilidad Limitada**, se adjunta factura electrónica E001-130.

Atentamente, GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regional de Infraestructura

Ing. RAÚL FLORES AQUEPUCHO
Sub Gerente de Supervisión y Control



INFORME N° 094-2021-GRL/GRI/SGSyC/JAZP

AL : **Ing. Raúl Flores Aquepucho**
Sub Gerente de Supervisión y Control

DE : **Ing. José Armando Zumarán Pérez**
Inspector de Obra

ASUNTO : Remite Valorización N° 05 – Mes de Febrero 2021.
Obra: **"MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH DEL DISTRITO DE PUINAHUA-PROVINCIA DE REQUENA- DEPARTAMENTO DE LORETO"**. Código Unico 2352929.

REFERENCIA : 1 CARTA N° 011-2021-CSHBSA (05/03/2021).
2 CARTA N° 002-2021-WMRM/JS/CSHBSA (03/03/2021).
3 CARTA N° 014/2021-CVP (02/03/2021).
4 PROVEIDO N° 04890 (SGSyC).

FECHA : Iquitos, 08 de Marzo de 2021.



Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo muy cordialmente e informar sobre lo indicado en el asunto.

DATOS GENERALES

Obra : "Mejoramiento de Veredas Peatonales en las Localidades de Huacrachiro, Bellavista, San Carlos y Ancash del Distrito de Puinahua-Provincia de Requena- Departamento de Loreto". Código Unico 2352929.

Entidad : Gobierno Regional de Loreto.

Proceso de Selección : Licitación Pública N° 010-2020-CSO-GRL (PRIMERA CONVOCATORIA).

Contrato : Contrato N° 037-2020-GRL-GRI.

Sistema de Contrato : Contrata a Precios Unitarios.

Otorgamiento de la Buena Pro : 07-Septiembre-2020.

Contratista : CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA.
Integrado por : CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA MC E.I.R.L.
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES MAR & MAR S.A.C.
M.L. CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

Financiamiento : Recursos Ordinarios (Cuenta de Fideicomiso).

Valor Referencial : S/. 2'940,388.11 Sin IGV.

Valor Contractual : S/. 3'019,196.04 Sin IGV.

Fecha del Valor Referencial : Julio de 2020.

Adelanto Directo : S/ 301,920.00 (Septiembre 2020).

Suscripción del Contrato : 22- Septiembre -2020.

Plazo de ejecución Contractual : 90 días calendario.


Fecha de Entrega de Terreno : 07-Octubre-2020.

Fecha de Inicio Contractual : 19-Octubre-2020.

Término de Plazo Contractual : 16-Enero-2021.

Fecha de Recepción de la Obra : .

Residente de Obra : Ing° Jorge Esteban Tocas Quispe.





Inspector de Obra	:	Ing° José Armando Zumarán Pérez.
Avance Físico Programado	:	32.15%.
Avance Físico Prog. Acumul.	:	100.00%.
Avance Físico Real	:	20.08%.
Avance Físico Real Acumul.	:	98.44%.
Situación actual de la obra	:	TERMINADA.

ANTECEDENTES.-

- Con fecha 21 de Setiembre de 2020 se firmó el Contrato N° 035-2020-GRL-GRI de la obra: **"Mejoramiento de Veredas Peatonales en las Localidades de Huacrachiro, Bellavista, San Carlos y Ancash del Distrito de Puinahua-Provincia de Requena-Departamento de Loreto"**.
- Con fecha 07 de Octubre de 2020 se dio por finalizado el acto de Entrega del Terreno en las localidades de Huacrachiro, Bellavista, San Carlos y Ancash.
- De común acuerdo entre las partes, mediante Carta N° 667-2020-GRL/GRI/SGSyC y CARTA N° 005/2020-CVP, de la entidad y del Contratista, respectivamente, se fijó como fecha de inicio de obra el día **19 de Octubre de 2020**.

ANALISIS

Se ha tomado conocimiento de la Valorización N° 05, practicada por el Residente, y presentada por la supervisión, mediante documento 1 de la referencia, a la Gerencia Regional de Infraestructura, cuyo contenido pasamos a evaluar.

De la revisión de las copias del Cuaderno de Obra, el Ing. Residente, Jorge Esteban Tocas Quispe, en su Asiento N° 143 del cuaderno de obra (página 74), de fecha 26 de Febrero de 2021, presenta los metrados ejecutados, para la elaboración de la Valorización N° 05. El Supervisor, mediante Asiento N° 144 del cuaderno de obra (página 75) aprueba dichos metrados y, en forma conjunta, elaboran la Valorización N° 05 de Febrero de 2021.

La Valorización N° 05 arroja el siguiente resultado en forma global:

Valorización Contractual	S.	606,303.93	
Regularización valorizaciones anteriores	(-)	4,165.37	
Amortización Adelanto Directo	(-)	65,339.05	
Amortización Adelanto Materiales	(-)	130,678.10	
Sub total			406,121.41
Retención por Garantía de Fiel Cumplimiento			0.00
TOTAL VALORIZADO S.			<u>406,121.41</u>

Monto valorización : S/ 606,303.93
VALOR ACUMULADO: S/ 2,940,143.08 (sin IGV) AVANCE **20.62%.**




PROVIDO N° 04890
Secretaría de Finanzas
PARA: a GRI - Para
Trámite de pago
corresponsable

[Handwritten signature]



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

PERIODO	PROGRAMADO			REAL EJECUTADO			ESTADO (adelantada / atrasada)
	PARCIAL	ACUMULADO	% ACUM	PARCIAL	ACUMULADO	% ACUM	
oct-20	273,150.74	273,150.74	9.05%	273,150.74	273,150.74	9.05%	ADELANTADA
nov-20	1,425,800.36	1,698,951.10	56.27%	1,425,800.36	1,698,951.10	56.27%	ADELANTADA
dic-20	31,819.94	1,730,771.04	57.33%	31,819.94	1,730,771.04	57.33%	ATRASADA
ene-21	317,763.76	2,048,534.80	67.85%	635,034.46	2,365,805.50	78.36%	ADELANTADA
feb-21	970,661.24	3,019,196.04	100.00%	606,303.93	2,972,109.43	98.44%	TERMINADA
	3,019,196.04			2,972,109.43			

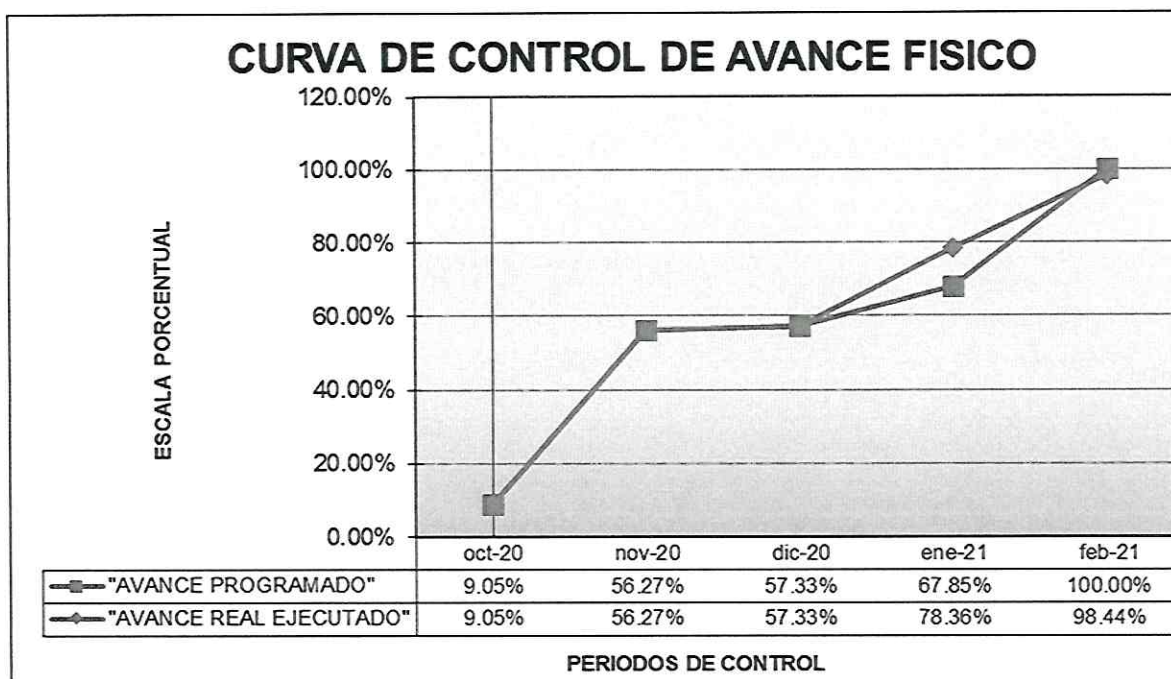

CONCLUSION

De acuerdo con la Supervisión, se ha cumplido con presentar toda la documentación pertinente de la Valorización N° 05 del Contratista, en consecuencia, da su aprobación. De acuerdo al CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA vigente, el porcentaje de avance programado acumulado para el mes de Febrero 2021 es de 100.00% y el avance de obra acumulado real es de 98.44%, por lo tanto la obra se encuentra **terminada**.

RECOMENDACION


Continuar con el trámite respectivo para el pago de la Valorización N° 05 por un monto de **S/ 406,121.41 (Cuatrocientos Seis Mil Ciento Veintiuno y 41/100 Soles)**, correspondiente.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y tramite respectivo.

Atentamente,



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regional de Infraestructura
Sub. Gerencia de Supervisión y Control


JOSE ARMANDO ZUMARAN PEREZ

Ingeniero Civil
CIP. N°10738

José Armando Zumarán Pérez

Ingeniero Civil
N° Reg. Prof.: 10738



CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
08 MAR 2021
Hora: 8:11 am Firma: [Firma]

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GERENCIA REGIONAL DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO
Iquitos, 04 de marzo del 2021
4890
05 MAR 2021
Nombre: CONTROL Fecha: [Firma]

CARTA N° 011-2021-CSHBSA

Señores:
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ING. EDI WISBERTO RUIZ ZARATE
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Atención:
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Sub Gerencia de Supervisión y Control
08 MAR 2021
Fecha: 04890 Hora: 9:05 AM
N° Reg: [Firma]

Asunto: **REMITE VALORIZACION DE OBRA N° 005 FEBRERO 2021**
Ref.: OBRA "MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH, DEL DISTRITO DE PUINAHUA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO"
Carta N° 014/2021-CVP (02-03-2021)

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de remitir la **Valorización de Obra N° 005** correspondiente al mes de **FEBRERO del 2021**, en **01 original y 03 copias**, la misma que se encuentra con un avance físico del 20.08% y un acumulado de 98.44%, encontrándose la obra culminada, cuyo neto a cobrar por el contratista (Ejecutor de Obra) asciende a **SI. 406,121.41 (CUATROSCIENTOS SEIS MIL CIENTO VEINTIUNO CON 41/100 Soles)**, de los trabajos ejecutados en la obra: "MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH, DEL DISTRITO DE PUINAHUA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO" por la firma Contratista **CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA**, en el periodo del **01/02/2021 al 26/02/2021**.

A la vez de acuerdo a lo indicado en el asunto, se ha elaborado la solicitud de pago de Obra al mes de **FEBRERO 2021**, cuyo detalle es el siguiente:

1.	Valorización Bruta N° 005 – FEBRERO 2021	SI.	606,303.93
2.	Reajuste Neto (+)	SI.	-4,165.37
3.	Amortización de Adelanto Directo (-)	SI.	65,339.05
4.	Amortización de Adelanto Materiales (-)	SI.	130,678.10
	NETO A FACTURAR	SI.	406,121.41
5.	Garantía de Fiel Cumplimiento	SI.	0.00
	NETO A PAGAR	SI.	406,121.41

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA
[Firma]
JAZHELL ALEXIS FLORES RODRIGUEZ
Representante Comun

COPIA N° 04890
Ing. Zomaran
SU
Atención
URB. SARGENTO LORES 18 IQUITOS-MAYNAS-LORETO





CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

CARTA N° 002-2021-WMRM/JS/CSHBSA

Iquitos, 03 de Marzo del 2021

**ING. JAZHELL ALEXIS FLORES RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMÚN
CONSORCIO SUPERVISOR HBSA**

Presente:

**Asunto: REMITE SOLICITUD DE PAGO - VALORIZACIÓN DE OBRA N° 05 -
CONTRATO PRINCIPAL - MES FEBRERO 2021 DEL CONTRATISTA
CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA.**

**Referencia: "MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE
HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH, DEL DISTRITO DE PUINAHUA,
PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO".**

De mi especial consideración:

Me dirijo a usted, con un cordial saludo y a la vez remitir la documentación revisada en el cual se da la **CONFORMIDAD** de la **VALORIZACIÓN DE OBRA N° 05 – CONTRATO PRINCIPAL** correspondiente al mes de **FEBRERO** del **2021** del contratista **CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA**, de la obra de referencia, en concordancia con el art 194° del R.L.C.E., para ello adjunto la valorización de Obra en 01 original y 04 copias., adjuntando el procesamiento correspondiente por el avance de obra indicada en la referencia.

El resumen de la presente valorización es como sigue:

Valorización N° 05 – Contrato Principal Mes Febrero 2021	S/.	606,303.93
Reajuste Valorización N° 05		-4,165.37
Amortización Adelanto Directo		-65,339.05
Amortización Adelanto Materiales		-130,678.10
Sub Total		406,121.41
I.G.V. 18.00 %		0.00
NETO A PAGAR		406,121.41

A la fecha, la obra cuenta con un avance físico acumulado de **98.44%**, siendo **MENOR** al avance físico programado de **100.00%**, por lo que la obra se encuentra **CULMINADA**. Además, para la cancelación de dicha valorización, el contratista deberá acreditar el pago a **SENCICO** por la cantidad de **S/. 1,212.61**

Esperando la atención debida a la presente, quede de usted, no sin antes expresarles las muestras de mi especial estima.

Muy atentamente,

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

[Firma]
ING. WILLY MARTIN RAMIREZ MACEDO
JEFE DE SUPERVISIÓN - CIP 72128

ING. WILLY MARTIN RAMIREZ MACEDO
Jefe de Supervisión
Consortio Supervisor HBSA

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA
[Firma]
JAZHELL ALEXIS FLORES RODRIGUEZ
Representante Común

*Recibido 03/03/2021
8:00 am*



198

Iquitos, 02 de marzo de 2021

CARTA N° 014/2021-CVP

Señores:
Consortio Supervisor HBSA
Sra. Jazhell Alexis Flores Rodríguez – Representante Común
Presente.-

Referencia: CONTRATO N° 037-2020-CSO-GRL-GRI, Obra "MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH, DEL DISTRITO DE PUINAHUA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO"

Asunto: Valorización N° 05 - Mes febrero 2021

De nuestra consideración:

Mediante la presente los saludamos muy cordialmente y, al mismo tiempo, les hacemos llegar adjunto a la presente la VALORIZACION DE OBRA N° 05, por la ejecución de la obra de la referencia, correspondiente al mes de FEBRERO 2021, para su revisión, aprobación y trámite correspondiente para su cancelación.

Sin otro particular, quedamos a sus órdenes.

Atentamente,

CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA
[Signature]
MARDE PASCUAL CORREA MEDINA
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA
[Signature]
JAZHELL ALEXIS FLORES RODRIGUEZ
Representante Común
Recibido 02/03/2021
3:00 p.m.

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 05
PERIODO DEL 01/02/2021 AL 26/02/2021

"MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH DEL DISTRITO DE PUINAHUA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO"
LICITACION PUBLICA N° 010-2020-CO-SR.L (PRIMERA CONVOCATORIA)
MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH DEL DISTRITO DE PUINAHUA
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH - PUINAHUA - REQUENA - LORETO
CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA
ING. JORGE ESTEBAN TUCAS QUISEP
ING. WILLY MARTIN RAMIREZ MACEDO
UNCA

Valor Referencial (CI/IG)
Valor Referencial (SI/IG)
Monto Ofertado (SI/IG)
Plazo de Ejecución

S/ 3,469,857.97
S/ 2,840,388.11
S/ 3,019,193.04
: 60 d.c

JUN-20
JUN-23
JUN-20

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL			ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO			SALDO		
		Und	Metrado	Unitario	Metrado	Parcial	%	Metrado	Parcial	%	Metrado	Parcial	%	Metrado	Parcial	%
01	COMUNIDAD - HUACRACHIRO															
01.01	OPRAS PROVISIONALES															
01.01.01	CARTEL DE OBRA DE (0.60 X 2.40M). GIGANTOGRAFIA	und	1.00	590.33	590.33	1.00	100.00%	590.33	1.00	100.00%	590.33	100.00%	590.33	-	0.00%	
01.01.02	ALQUILER DE OBRA DE (0.60 X 2.40M). GIGANTOGRAFIA	mes	3.00	2,000.00	6,000.00	3.00	100.00%	6,000.00	3.00	100.00%	6,000.00	100.00%	6,000.00	-	0.00%	
01.01.03	ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN	ton	413.42	20.00	8,268.48	413.42	100.00%	8,268.48	413.42	100.00%	8,268.48	100.00%	8,268.48	-	0.00%	
01.01.04	FLETE TERRESTRE	ton	413.42	120.00	49,610.63	413.42	100.00%	49,610.63	413.42	100.00%	49,610.63	100.00%	49,610.63	-	0.00%	
01.01.05	FLETE FLUVIAL	ton	413.42	46.00	19,604.08	413.42	100.00%	19,604.08	413.42	100.00%	19,604.08	100.00%	19,604.08	-	0.00%	
01.01.06	FLETE CARGUIO Y DESCARGUIO	ton	413.42	30.00	12,402.72	413.42	100.00%	12,402.72	413.42	100.00%	12,402.72	100.00%	12,402.72	-	0.00%	
01.01.07	TRASORTE DE MATERIALES	ton	413.42	30.00	12,402.72	413.42	100.00%	12,402.72	413.42	100.00%	12,402.72	100.00%	12,402.72	-	0.00%	
01.01.08	POZA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LADRILLO TARRAJEADO DE 1.00 X 2.00 X 1.20 m.	und	2.00	465.55	811.16	2.00	100.00%	811.16	2.00	100.00%	811.16	100.00%	811.16	-	0.00%	
01.02	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA															
01.02.01	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	GLB	1.00	10,800.00	10,800.00	1.00	100.00%	10,800.00	1.00	100.00%	10,800.00	100.00%	10,800.00	-	0.00%	
01.02.02	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD, DURANTE EL TRABAJO	GLB	1.00	7,000.00	7,000.00	1.00	100.00%	7,000.00	1.00	100.00%	7,000.00	100.00%	7,000.00	-	0.00%	
01.02.03	SERIALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	GLB	1.00	2,000.00	2,000.00	1.00	100.00%	2,000.00	1.00	100.00%	2,000.00	100.00%	2,000.00	-	0.00%	
01.03	TRABAJOS PRELIMINARES															
01.03.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL (Con pico, lampa y cestilla)	M2	3,355.30	2.70	9,140.31	3,355.30	100.00%	9,140.31	3,355.30	100.00%	9,140.31	100.00%	9,140.31	-	0.00%	
01.03.02	TRAZO NIVELES Y REPLANTEO	M2	3,355.30	2.69	9,106.46	3,355.30	100.00%	9,106.46	3,355.30	100.00%	9,106.46	100.00%	9,106.46	-	0.00%	
01.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS															
01.04.01	EXCAVACION DE TERRENO MANUAL	M3	507.60	48.23	24,491.19	507.60	100.00%	24,491.19	507.60	100.00%	24,491.19	100.00%	24,491.19	-	0.00%	
01.04.02	CAMA DE ARENA e = 0.10 m. - ANTICONTAMINANTE	M3	339.53	109.29	35,932.35	339.53	100.00%	35,932.35	339.53	100.00%	35,932.35	100.00%	35,932.35	-	0.00%	
01.04.03	NIVELACION REGLADO Y APISONADO MANUAL	M2	3,355.30	6.14	20,783.90	3,355.30	100.00%	20,783.90	3,355.30	100.00%	20,783.90	100.00%	20,783.90	-	0.00%	
01.04.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 100M. DE LA OBRA c/carrilla	M3	634.74	19.29	12,244.14	634.74	100.00%	12,244.14	634.74	100.00%	12,244.14	100.00%	12,244.14	-	0.00%	
01.05	VEREDA PEATONAL L = 2.172.58 m															
01.05.01	SOLADO MEZCLA 1:10 e=2" vaciado con cestilla	M2	135.41	29.49	3,993.24	135.41	100.00%	3,993.24	135.41	100.00%	3,993.24	100.00%	3,993.24	-	0.00%	
01.05.02	MORTERO Fc=210 Kg/cm2	M3	695.68	64.77	44,787.92	695.68	100.00%	44,787.92	695.68	100.00%	44,787.92	100.00%	44,787.92	-	0.00%	
01.05.03	RELLENO Y DESENCORFRADO	M	1,184.88	35.83	42,453.53	1,184.88	100.00%	42,453.53	1,184.88	100.00%	42,453.53	100.00%	42,453.53	-	0.00%	
01.05.04	RELLENO DE JUNTAS DE DILATACION Y AISLAMIENTO DE 1" X 2" CON MORTERO ASFALTICO Y TECNORF	M	1,128.43	8.94	10,058.17	1,128.43	100.00%	10,058.17	1,128.43	100.00%	10,058.17	100.00%	10,058.17	-	0.00%	
01.05.05	CURADO	M2	3,355.30	0.78	2,640.51	3,355.30	100.00%	2,640.51	3,355.30	100.00%	2,640.51	100.00%	2,640.51	-	0.00%	
01.05.06	BRUADO	m	4,231.63	1.80	7,870.64	4,231.63	100.00%	7,870.64	4,231.63	100.00%	7,870.64	100.00%	7,870.64	-	0.00%	
01.06	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL															
01.06.01	MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL															
03.01.01	ELABORACION E IMPL. Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	und	1.00	12,000.00	12,000.00	1.00	100.00%	12,000.00	1.00	100.00%	12,000.00	100.00%	12,000.00	-	0.00%	
03.01.02	PROGRAMAS DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y MITIGACION DE LA CONSTRUCCION	und	1.00	5,000.00	5,000.00	1.00	100.00%	5,000.00	1.00	100.00%	5,000.00	100.00%	5,000.00	-	0.00%	
03.01.03	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS EN LA CONSTRUCCION	und	1.00	5,000.00	5,000.00	1.00	100.00%	5,000.00	1.00	100.00%	5,000.00	100.00%	5,000.00	-	0.00%	
03.01.04	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	und	1.00	7,000.00	7,000.00	1.00	100.00%	7,000.00	1.00	100.00%	7,000.00	100.00%	7,000.00	-	0.00%	
03.01.05	PLAN DE MONITOREO DE SEGURIDAD AMBIENTAL Y SALUD EN LA CONSTRUCCION	und	1.00	5,000.00	5,000.00	1.00	100.00%	5,000.00	1.00	100.00%	5,000.00	100.00%	5,000.00	-	0.00%	
03.01.06	PROGRAMA DE ABANDONO EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION	und	1.00	15,000.00	15,000.00	1.00	100.00%	15,000.00	1.00	100.00%	15,000.00	100.00%	15,000.00	-	0.00%	
01.06.02	MEDIDAS DE CONSERVACION															
35.02.01	LETREROS AMBIENTALES	und	5.00	524.37	2,621.85	5.00	100.00%	2,621.85	5.00	100.00%	2,621.85	100.00%	2,621.85	-	0.00%	
35.02.02	LETREROS DE PREVENICION VUL	und	5.00	500.37	2,531.85	5.00	100.00%	2,531.85	5.00	100.00%	2,531.85	100.00%	2,531.85	-	0.00%	

CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA
ING. WILLY MARTIN RAMIREZ MACEDO
JEFE DE SUPERVISION - CIP 71210

CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA
ING. WILLY MARTIN RAMIREZ MACEDO
JEFE DE SUPERVISION - CIP 71210

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA
ING. WILLY MARTIN RAMIREZ MACEDO
JEFE DE SUPERVISION - CIP 71210

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA
ING. WILLY MARTIN RAMIREZ MACEDO
JEFE DE SUPERVISION - CIP 71210

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 05
PERIODO DEL 01/02/2021 AL 26/02/2021

MEMORANDO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH DEL DISTRITO DE PUINAHUA, PROVINCIA DE REQUEMA, DEPARTAMENTO LORETO

LICITACION PUBLICA N° 010-2020-CO-GRU (PRIMERA CONVOCATORIA)

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH- PUINAHUA - REQUEMA - LORETO

CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA

ING. JORGE ESTEBAN TOCAS QUISPE

ING. WILLY MARTIN RAMIREZ MACEDO

UNICA

Valor Referencial (C/IGV)
Valor Referencial (SIGV)
Monto Ofertado (S/IGV)
Plazo de Ejecución

S/. 3,485,657.97
S/. 2,940,388.11
S/. 3,019,198.04
: 90 d.c

JUL/20
JUL/20
JUL/20

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL		ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		SALDO	
		Unid	Mt	Unid	Mt	Unid	Mt	Unid	Mt	Unid	Mt
02	COMUNIDAD - BELLAVISTA										
02.01	02.01 OBRAS PROVISORIAS										
02.01.01	02.01.01 CARTEL DE OBRA DE (0.60 X 2.40M), GIGANTOGRAFIA	und	990.38		990.38		990.38		990.38		0.00%
02.01.02	02.01.02 ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN	m ²	3.00	2,000.00	6,000.00	3.00	6,000.00	3.00	6,000.00		0.00%
02.01.03	02.01.03 FLETE TERRESTRE	ton	225.05	20.00	4,501.00	225.05	4,500.90	225.05	4,500.90		0.00%
02.01.04	02.01.04 FLETE FLUVIAL	ton	225.05	238.00	53,581.50	225.05	53,560.71	225.05	53,560.71		0.00%
02.01.05	02.01.05 FLETE CARGADO Y DESCARGUO	ton	225.05	45.00	13,127.28	225.05	10,127.03	225.05	10,127.03		0.00%
02.01.06	02.01.06 TRASORTE DE MATERIALES	ton	225.05	30.00	8,751.50	225.05	6,751.35	225.05	6,751.35		0.00%
02.01.07	02.01.07 POZA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LADRILLO TARRAJEADO DE 1.00 X 2.00 X 1.20 m	und	2.00	495.58	811.16	2.00	811.16	2.00	811.16		0.00%
02.02	02.02 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA										
02.02.01	02.02.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	GLB	1.00	10,800.00	10,800.00	1.00	10,800.00	1.00	10,800.00		0.00%
02.02.02	02.02.02 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD, DURANTE EL TRABAJO	GLB	1.00	7,000.00	7,000.00	1.00	7,000.00	1.00	7,000.00		0.00%
02.02.03	02.02.03 SERIALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	GLB	1.00	2,000.00	2,000.00	1.00	2,000.00	1.00	2,000.00		0.00%
02.03	02.03 TRABAJOS PRELIMINARES										
02.03.01	02.03.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL (Con pico, lampa y curreña)	M2	1,833.84	2.79	4,933.03	1,833.84	4,933.03	1,833.84	4,933.03		0.00%
02.03.02	02.03.02 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO	M2	1,833.84	2.69	4,933.03	1,833.84	4,933.03	1,833.84	4,933.03		0.00%
02.04	02.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS										
02.04.01	02.04.01 EXCAVACION DE TERRENO MANUAL	M3	275.08	48.23	13,267.11	275.08	13,267.11	275.08	13,267.11		0.00%
02.04.02	02.04.02 CARA DE ARERA e=0.0m - ANTICONTAMINANTE	M2	146.71	108.29	15,593.80	146.71	15,593.80	146.71	15,593.80		0.00%
02.04.03	02.04.03 REVELACION REGULADA Y APISONADO MANUAL	M2	1,833.84	6.14	11,259.78	1,833.84	11,259.78	1,833.84	11,259.78		0.00%
02.04.04	02.04.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 100% DE LA OBRA c/curreña	M3	343.85	19.29	6,632.85	343.85	6,632.85	343.85	6,632.85		0.00%
02.05	02.05 VEREDA PEATONAL L=816.82 m										
02.05.01	02.05.01 SOLADO MEZCLA 1:10 e=2" baseado con curreña	M2	91.63	29.49	2,703.93	91.69	2,703.93	91.69	2,703.93		0.00%
02.05.02	02.05.02 MORTERO 1:2:10 e=2" baseado con curreña	M3	376.85	64.77	242,604.72	376.85	242,604.72	376.85	242,604.72		0.00%
02.05.03	02.05.03 ORFADO Y DESORFADO	M2	641.84	35.83	22,997.14	641.84	22,997.14	641.84	22,997.14		0.00%
02.05.04	02.05.04 RELLENO DE JUNTAS DE DILATACION Y AISLAMIENTO DE 1" X 2" CON MORTERO ASFALTICO Y TECHNOF	M	811.84	8.94	5,469.85	811.84	5,469.85	811.84	5,469.85		0.00%
02.05.05	02.05.05 CURADO	M2	1,833.84	0.78	1,430.40	1,833.84	1,430.40	1,833.84	1,430.40		0.00%
02.05.06	02.05.06 BRUNADO	m	2,292.30	1.89	4,253.65	2,292.30	4,253.65	2,292.30	4,253.65		0.00%
02.06	02.06 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL										
02.06.01	02.06.01 REPOSICION DE MANTENIMIENTO AMBIENTAL	und	12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00%
02.06.02	02.06.02 ELABORACION E IMPL. Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	und	1.00	5,000.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00		0.00%
02.06.03	02.06.03 PROGRAMAS E MEDIDAS PREVENTIVAS Y MITIGACION DE LA CONSTRUCCION	und	1.00	5,000.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00		0.00%
02.06.04	02.06.04 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	und	1.00	7,000.00	7,000.00	1.00	7,000.00	1.00	7,000.00		0.00%
02.06.05	02.06.05 PLAN DE MONITOREO DE SEGURIDAD AMBIENTAL Y SALUD EN LA CONSTRUCCION	und	1.00	5,000.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00		0.00%
02.06.06	02.06.06 PROGRAMA DE ABANDONO EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION	und	1.00	15,000.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00		0.00%
02.07	02.07 MEDIDAS DE IDENTIFICACION										
02.07.01	02.07.01 LETREROS AMBIENTALES	und	5.00	524.37	2,621.85	5.00	2,621.85	5.00	2,621.85		0.00%
02.07.02	02.07.02 LETREROS DE PREVENCIÓN VIAL	und	5.00	500.37	2,531.85	5.00	2,531.85	5.00	2,531.85		0.00%

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA
MARCE PASQUALI
REPRESENTANTE

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

JAZHELL ALEXIS FLORES RODRIGUEZ
Representante Común

Jorge Esteban Tocas Quispe
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 54502

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 05
PERIODO DEL 01/02/2021 AL 26/02/2021

"MEJORAMIENTO DE VEREDAS FEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH DEL DISTRITO DE PUNAHUA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO LORETO"

Valor Referencial (C/IGV)
Valor Referencial (S/IGV)
Monto Obrero (S/IGV)
Plazo de Ejecución

SI. 3.469.657,97
SI. 2.840.388,11
SI. 3.018.193,04
: 60 d.c

LICITACION PUBLICA N° 000-2020-CSD-ORL (PRIMERA CONVOCATORIA)
MEJORAMIENTO DE VEREDAS FEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH DEL DISTRITO DE PUNAHUA
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
HUACACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH - PUNAHUA - REQUENA - LORETO
CONSORCIO VEREDAS PUNAHUA
ING. JORGE ESTEBAN TOCAS QUISEP
ING. WILLY MARTIN RAMIREZ MACEDO
UNICA


EM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL			ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO			SALDO	
		Und	Metrado	Unbrido	Metrado	Parcial	%	Metrado	Parcial	%	Metrado	Parcial	%	Metrado	Parcial
03	03.01	und	1,00	590,33	1,00	990,33	100,00%	-	-	0,00%	1,00	990,33	100,00%	-	0,00%
03	01.01	mes	3,00	2.000,00	3,00	6.000,00	100,00%	-	-	0,00%	3,00	6.000,00	100,00%	-	0,00%
03	01.03	ton	293,24	20,00	293,24	5.654,60	100,00%	-	-	0,00%	293,24	5.654,60	100,00%	-	0,00%
03	01.04	ton	293,24	120,00	293,24	35.183,60	100,00%	-	-	0,00%	293,24	35.183,60	100,00%	-	0,00%
03	01.05	ton	293,24	45,00	293,24	13.195,80	100,00%	-	-	0,00%	293,24	13.195,80	100,00%	-	0,00%
03	01.06	ton	293,24	30,00	293,24	8.797,20	100,00%	-	-	0,00%	293,24	8.797,20	100,00%	-	0,00%
03	01.07	und	2,00	405,58	2,00	811,16	100,00%	-	-	0,00%	2,00	811,16	100,00%	-	0,00%
03	02.01	GLB	1,00	10.800,00	1,00	10.800,00	100,00%	-	-	0,00%	1,00	10.800,00	100,00%	-	0,00%
03	02.02	GLB	1,00	7.000,00	1,00	7.000,00	100,00%	-	-	0,00%	1,00	7.000,00	100,00%	-	0,00%
03	02.03	GLB	1,00	2.000,00	1,00	2.000,00	100,00%	-	-	0,00%	1,00	2.000,00	100,00%	-	0,00%
03	03.01	M2	2.831,65	2,70	2.831,65	7.781,27	100,00%	-	-	0,00%	2.831,65	7.781,27	100,00%	-	0,00%
03	03.02	M2	2.851,95	2,69	2.851,95	7.752,45	100,00%	-	-	0,00%	2.851,95	7.752,45	100,00%	-	0,00%
03	03.03	m3	1.393,30	16,72	1.393,30	23.252,63	0,00%	4.188,53	17,589%	250,51	4.188,53	17,589%	1.142,79	19.107,45	82,023%
03	04.01	M3	432,29	43,23	432,29	20.849,35	34,70%	7.234,50	65,30%	282,29	432,29	65,30%	20.849,35	20,849,35	100,00%
03	04.02	M3	230,65	100,29	230,65	192,55	20,82%	5.104,92	79,18%	192,55	230,65	79,18%	24.506,22	24,506,22	100,00%
03	04.03	M2	2.831,65	8,14	2.831,65	17.653,17	16,65%	2.947,20	83,34%	2.831,65	2.831,65	100,00%	17.653,17	17,653,17	100,00%
03	04.04	M3	540,37	19,29	540,37	4.023,74	0,00%	540,37	100,00%	540,37	540,37	100,00%	4.023,74	4,023,74	100,00%
03	05.01	M2	144,10	29,49	144,10	4.249,51	20,82%	654,70	79,18%	144,10	144,10	79,18%	4.249,51	4,249,51	100,00%
03	05.02	M2	490,08	64,77	490,08	3.154,93	0,00%	490,08	100,00%	490,08	490,08	100,00%	3.154,93	3,154,93	100,00%
03	05.03	M2	1.009,69	35,83	1.009,69	8.558,21	17,35%	6.270,25	82,65%	1.009,69	1.009,69	100,00%	8.558,21	8,558,21	100,00%
03	05.04	M	809,85	8,84	809,85	560,65	0,00%	560,65	100,00%	809,85	809,85	100,00%	560,65	560,65	100,00%
03	05.05	M	2.831,65	0,78	2.831,65	2.831,65	0,00%	-	100,00%	2.831,65	2.831,65	100,00%	-	-	
03	05.06	m	6.856,52	1,69	6.856,52	12.753,13	0,00%	6.856,52	100,00%	6.856,52	6.856,52	100,00%	12.753,13	12,753,13	100,00%
03	06.01	und	1,00	12.000,00	1,00	12.000,00	100,00%	-	-	0,00%	1,00	12.000,00	100,00%	-	0,00%
03	06.02	und	1,00	5.000,00	1,00	5.000,00	100,00%	-	-	0,00%	1,00	5.000,00	100,00%	-	0,00%
03	06.03	und	1,00	5.000,00	1,00	5.000,00	100,00%	-	-	0,00%	1,00	5.000,00	100,00%	-	0,00%
03	06.04	und	1,00	7.000,00	1,00	7.000,00	100,00%	-	-	0,00%	1,00	7.000,00	100,00%	-	0,00%
03	06.05	und	1,00	5.000,00	1,00	5.000,00	100,00%	-	-	0,00%	1,00	5.000,00	100,00%	-	0,00%
03	06.06	und	1,00	15.000,00	1,00	15.000,00	100,00%	-	-	0,00%	1,00	15.000,00	100,00%	-	0,00%
03	02.01	und	5,00	524,37	5,00	2.621,65	100,00%	-	-	0,00%	5,00	2.621,65	100,00%	-	0,00%
03	02.02	und	5,00	503,37	5,00	2.531,65	100,00%	-	-	0,00%	5,00	2.531,65	100,00%	-	0,00%
04	04.01	und	1,00	990,38	1,00	990,38	100,00%	-	-	0,00%	1,00	990,38	100,00%	-	0,00%
04	01.01	mes	3,00	2.000,00	3,00	6.000,00	100,00%	-	-	0,00%	3,00	6.000,00	100,00%	-	0,00%
04	01.03	ton	245,53	20,00	245,53	4.931,52	100,00%	-	-	0,00%	245,53	4.931,52	100,00%	-	0,00%
04	01.04	ton	245,53	120,00	245,53	29.559,12	100,00%	-	-	0,00%	245,53	29.559,12	100,00%	-	0,00%
04	01.05	ton	245,53	45,00	245,53	11.095,92	100,00%	-	-	0,00%	245,53	11.095,92	100,00%	-	0,00%
04	01.06	ton	245,53	30,00	245,53	7.397,28	100,00%	-	-	0,00%	245,53	7.397,28	100,00%	-	0,00%
04	01.07	und	2,00	405,58	2,00	811,16	100,00%	-	-	0,00%	2,00	811,16	100,00%	-	0,00%
04	02.01	GLB	1,00	10.800,00	1,00	10.800,00	100,00%	-	-	0,00%	1,00	10.800,00	100,00%	-	0,00%
04	02.02	GLB	1,00	7.000,00	1,00	7.000,00	100,00%	-	-	0,00%	1,00	7.000,00	100,00%	-	0,00%
04	02.03	GLB	1,00	2.000,00	1,00	2.000,00	100,00%	-	-	0,00%	1,00	2.000,00	100,00%	-	0,00%
04	03.01	M2	2.011,64	2,70	2.011,64	5.431,43	100,00%	-	-	0,00%	2.011,64	5.431,43	100,00%	-	0,00%
04	03.02	M2	2.011,64	2,69	2.011,64	5.411,31	100,00%	-	-	0,00%	2.011,64	5.411,31	100,00%	-	0,00%

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA
ING. WILLY MARTIN RAMIREZ MACEDO
JEFE DE SUPERVISION - CIP 1717A

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA
ING. WILLY MARTIN RAMIREZ MACEDO
JEFE DE SUPERVISION - CIP 1717A

CONSORCIO VEREDAS PUNAHUA
ING. ALEXIS FLORES RODRIGUEZ
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA
ING. ALEXIS FLORES RODRIGUEZ
Representante Comun



123

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 05
PERIODO DEL 01/02/2021 AL 26/02/2021

"MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH DEL DISTRITO DE PUNAHUA, PROVINCIA DE REQUEÑA, DEPARTAMENTO LORETO"
LICITACION PUBLICA N° 010-2020-CO-GR. (PRIMERA CONVOCATORIA)
MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS LOCALIDADES DE HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH DEL DISTRITO DEL PUNAHUA
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
HUACRACHIRO, BELLAVISTA, SAN CARLOS Y ANCASH- PUNAHUA - REQUEÑA - LORETO
CONSORCIO VEREDAS PUNAHUA
ING. JORGE ESTEBAN TOCAS QUISEP
ING. WILLY MARTIN RAMIREZ MACEDO
UNCA

Jul-20
Jul-20
Jul-20
Jul-20

Valor Referencial (CIGV)
Valor Referencial (SIGV)
Monto Ofrido (SIGV)
Plazo de Ejecución

S/. 3,489,657.97
S/. 2,840,388.11
S/. 3,019,156.04
: 90 d.c

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL			ANTERIOR			ACTUAL			ACUMULADO			SALDO			
		Und	Métrada	Unitario	Métrada	Parcial	%	Métrada	Parcial	%	Métrada	Parcial	%	Métrada	Parcial	%	
04 03 03	DEMOLICION DE VEREDA EXISTENTE			16.72	20,180.71	2,85	47.65	0.24%	-	-	0.00%	2.65	47.65	0.24%	1,204.13	20,133.05	89.28%
04 04 01	MOVIMIENTO DE TIERRAS			48.23	14,553.40	301.75	17,105.25	100.00%	-	-	0.00%	301.75	14,553.40	100.00%	-	-	0.00%
04 04 02	EXCAVACION DE TERRENO MANUAL			180.93	17,105.25	160.93	17,105.25	100.00%	-	-	0.00%	160.93	17,105.25	100.00%	-	-	0.00%
04 04 03	CAMA DE ARENA ø = 0.10 m. -ANTICOMINERANTE			0.14	12,351.47	2,011.64	12,351.47	100.00%	-	-	0.00%	2,011.64	12,351.47	100.00%	-	-	0.00%
04 04 04	NIVELACION REGLADO Y APlSONADO MANUAL			19.29	7,275.60	377.18	7,275.60	100.00%	-	-	0.00%	377.18	7,275.60	100.00%	-	-	0.00%
04 04 05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 100M. DE LA OBRA			104.58	2,968.10	100.58	2,968.10	100.00%	-	-	0.00%	100.58	2,968.10	100.00%	-	-	0.00%
04 05 01	VEREDA PEATONAL L= 1.0716.64 m			29.49	268,128.08	413.39	268,128.08	100.00%	-	-	0.00%	413.39	268,128.08	100.00%	-	-	0.00%
04 05 02	SOLADO MEZCLA 1:10 ø=2" veveado con carrilla			643.77	25,226.83	704.07	25,226.83	100.00%	-	-	0.00%	704.07	25,226.83	100.00%	-	-	0.00%
04 05 03	MORTERO Fe=210 Kg/cm2			35.83	5,994.72	318.06	5,994.72	100.00%	-	-	0.00%	318.06	5,994.72	100.00%	-	-	0.00%
04 05 04	ENCOPFRADO Y DESENCOPFRADO			8.84	1,569.08	2,011.64	1,569.08	100.00%	352.49	3,151.26	0.09%	2,011.64	1,569.08	100.00%	-	-	0.00%
04 05 05	RELLENO DE JUNTAS DE DILATACION Y AISLAMIENTO DE 1" X 2" CON MORTERO ASFALTICO Y TECNORF			0.78	4,677.07	2,514.55	4,677.07	100.00%	-	-	0.00%	2,514.55	4,677.07	100.00%	-	-	0.00%
04 05 06	CURADO			1.86	4,677.07	2,514.55	4,677.07	100.00%	-	-	0.00%	2,514.55	4,677.07	100.00%	-	-	0.00%
04 05 08	BRUADO			1.86	4,677.07	2,514.55	4,677.07	100.00%	-	-	0.00%	2,514.55	4,677.07	100.00%	-	-	0.00%
04 06 01	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL			1.00	12,000.00	1.00	12,000.00	100.00%	-	-	0.00%	1.00	12,000.00	100.00%	-	-	0.00%
04 06 02	MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL			5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	-	-	0.00%	5,000.00	5,000.00	100.00%	-	-	0.00%
05 01 01	ELABORACION E IMPL. Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	100.00%	-	-	0.00%	1.00	5,000.00	100.00%	-	-	0.00%
05 01 02	PROGRAMAS DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y MITIGACION DE LA CONSTRUCCION			1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	100.00%	-	-	0.00%	1.00	5,000.00	100.00%	-	-	0.00%
05 01 03	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS EN LA CONSTRUCCION			1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	100.00%	-	-	0.00%	1.00	5,000.00	100.00%	-	-	0.00%
05 01 04	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD			1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	100.00%	-	-	0.00%	1.00	5,000.00	100.00%	-	-	0.00%
05 01 05	PLAN DE MONITOREO DE SEGURIDAD AMBIENTAL Y SALUD EN LA CONSTRUCCION			1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	100.00%	-	-	0.00%	1.00	5,000.00	100.00%	-	-	0.00%
05 01 06	PROGRAMA DE ABANDONO EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION			1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	100.00%	-	-	0.00%	1.00	15,000.00	100.00%	-	-	0.00%
04 03 02	MEDIOS DE CONCIENTIZACION			500.37	2,821.65	5.00	2,821.65	100.00%	-	-	0.00%	5.00	2,821.65	100.00%	-	-	0.00%
05 02 01	LETREROS AMBIENTALES			500.37	2,821.65	5.00	2,821.65	100.00%	-	-	0.00%	5.00	2,821.65	100.00%	-	-	0.00%
05 02 02	LETREROS DE PREVENCIÓN WAL			500.37	2,821.65	5.00	2,821.65	100.00%	-	-	0.00%	5.00	2,821.65	100.00%	-	-	0.00%
TOTAL COSTO DIRECTO		CO			2,450,333.43		1,971,658.90	78.36%					439,412.43			2,411,081.33	58.44%
GASTOS GENERALES		GG			17,468.95		17,468.95	100.00%					17,468.95			17,468.95	100.00%
UTILIDAD		UT			24,782.34		156,553.71	631.75%					43,697.50			240,652.01	970.21%
PLAN COVID		SI			79,052.95		2,385,805.50	3018.13%					79,052.95			2,972,108.43	378.05%
SUB TOTAL		SI	CO + GG + UT + COVID		3,019,156.04		2,385,805.50	78.98%					606,303.93			2,972,109.43	98.43%
TOTAL PRESUPUESTO = SIGV				0.00%	3,019,156.04		2,385,805.50	78.98%	606,303.93			606,303.93			2,972,109.43		

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA
JAZHELL ALEXIS FLORES RODRIGUEZ
Representante Común

CONSORCIO VEREDAS PUNAHUA
ING. WILLY MARTIN RAMIREZ MACEDO
JEFE DE SUPERVISION - CIP 73124



PANEL FOTOGRAFICO



FOTO N° 01: SE OBSERVA A JEFE DE SEGURIDAD, REALIZANDO LAS CHARLAS CORRESPONDIENTES ANTES DEL INICIO DE LOS TRABAJOS DE OBRA EN LA COMUNIDAD DE ANCASH.



FOTO N° 02: SE OBSERVA AL PERSONAL EFECTUANDO EL CORRECTO LAVADO DE MANOS.

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA
Jazhell Alexis Flores Rodriguez
JAZHELL ALEXIS FLORES RODRIGUEZ
Representante Comun

CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA
Mardo Pascual Correa Medina
MARDE PASCUAL CORREA MEDINA
REPRESENTANTE COMUN

Jorge Esteban Tocas Quispe
JORGE ESTEBAN TOCAS QUISPE
INGENIERO CIVIL
Rgg. CIP N° 64502



FOTO N° 03: SE OBSERVA MEDICION DE TEMPERATURA DEL PERSONAL DE OBRA.



FOTO N° 04: SE OBSERVA ENCOFRADO EN VEREDAS, Y EXCAVACIÓN MANUAL EN LA COMUNIDAD DE SAN CARLOS.

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA
Jazhell Alexis Flores Rodriguez
JAZHELL ALEXIS/FLORES RODRIGUEZ
Representante Comun

CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA
Marde Pascual Correa Medina
MARDE PASCUAL CORREA MEDINA
REPRESENTANTE COMUN

Jorge Esteban Tocas Quispe
JORGE ESTEBAN TOCAS QUISPE
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 64572

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

Gary Flores
ING. WILLY MARTIN RAMIREZ MACEDO
JEFE DE SUPERVISIÓN - CIP 72128



FOTO N° 05: SE OBSERVA ENCOFRADO EN VEREDAS, Y EXCAVACIÓN MANUAL EN LA COMUNIDAD DE SAN CARLOS.



FOTO N° 06: SE OBSERVA ENCOFRADO EN VEREDAS, Y EXCAVACIÓN MANUAL EN LA COMUNIDAD DE SAN CARLOS.

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

Jazhell Alexis Flores Rodriguez
JAZHELL ALEXIS FLORES RODRIGUEZ
Representante Común

CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA

Marde Pascual Correa Medina
MARDE PASCUAL CORREA MEDINA
REPRESENTANTE COMUN



Jorge Esteban Tocas Quispe
JORGE ESTEBAN TOCAS QUISPE
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 94302



FOTO N° 07: SE OBSERVA ENCOFRADO EN VEREDAS, COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA, Y COMPACTADO DE MATERIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN CARLOS.



FOTO N° 08: SE OBSERVA COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA EN LA COMUNIDAD DE SAN CARLOS.

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA
[Signature]
MARDE PASCUAL CORREA MEDINA
REPRESENTANTE COMUN

[Signature]
ING. ESTEBAN TOCÁS QUISEPÉ
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 54502

JAZHELL ALEXIS FLORES RODRIGUEZ
Representante Común
Jirón Túpac Amará 339 – Iquitos – Maynas - Loreto
Celular: 965919190 Teléfono: 065-267140 E-mail: j.mardecorrea@gmail.com

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

Willy Martin Ramirez Macedo
ING. WILLY MARTIN RAMIREZ MACEDO
JEFE DE SUPERVISIÓN - CIP 72128



FOTO N° 09: SE OBSERVA EXCAVACIÓN MANUAL EN VEREDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN CARLOS.



Esteban Togas Quispe
JORGE ESTEBAN TOGAS QUISPE
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 54572

FOTO N° 10: SE OBSERVA VACEO DE MORTERO DE VEREDA EN LA COMUNIDAD DE SAN CARLOS.

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA

Jazhell Alexis Flores Rodriguez
JAZHELL ALEXIS FLORES RODRIGUEZ
Representante Comun

CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA

Marde Pascual Corvea Medina
MARDE PASCUAL CORVEA MEDINA
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA
Consulda
ING. WILLY MARTIN RAMIREZ MACEDO
JEFE DE SUPERVISION - CIP 72128



FOTO N° 11: SE OBSERVA VACEO DE MORTERO DE VEREDA EN LA COMUNIDAD DE SAN CARLOS.



FOTO N° 12: SE OBSERVA VACEO DE MORTERO DE VEREDA EN LA COMUNIDAD DE SAN CARLOS.

CONSORCIO SUPERVISOR HBSA
[Signature]
JAZHELL ALEXIS FLORES RODRIGUEZ
Representante Comun

CONSORCIO VEREDAS PUINAHUA
[Signature]
MARCE PASCUAL CORREA MEDINA
REPRESENTANTE COMUN

[Signature]
JORGE ESTEBAN TOCAS QUISPE
INGENIERO CIVIL
Rg. CIP N° 54552
