



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

CARGO

Belén, 05 de febrero de 2021

Oficio n° 0351-2021-GRL-GRI-SGSyC

Ingeniero Edi Wisberto Ruiz Zarate
Gerente Regional de Infraestructura
Presente



Asunto: Remite Valorización de Obra n° 05
Enero 2021.

Obra: "Mejoramiento de la Calle Libertad (Tramo Jr. Castilla/Ca. Garcilazo), Ca. San Román, Ca. Atlántida, Psje. Independencia, Psje. Sesquicentenario, Calle Palmeras y Psje. 22 de Setiembre, Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas – Loreto".

Ref. : a. Informe n° 047-2021-GRL/GRI/SGSyC/GMCZE
b. Carta n° 028-CP&B-2020/La Libertad.
c. Carta n° 003-2021-CLDO

Tengo el agrado de saludarle cordialmente, en atención a la referencia a), remitirle la valorización n° 05 por ejecución de obra, correspondiente a enero de 2021, revisada y aprobada por el Supervisor, que asciende a la suma de **Quinientos ochenta mil trescientos setenta y cuatro con 48/100 Soles (S/. 580 374.48)**; de acuerdo a los reajustes, amortizaciones de adelanto directo y materiales, siendo el monto neto a pagar de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización bruta n° 05 – enero 2021	S/. 580 374.48
Amortización adelanto directo	S/. - 58 037.45
Amortización adelanto materiales	S/. - 126 696.32
SUB TOTAL	S/. 395 640.71
Reajuste	S/. 11 607.49
MONTO NETO A PAGAR	S/. 407 248.20

Asimismo, la obra a enero de 2021, tiene un avance real acumulado ejecutado de 13.06%, versus un avance programado de 13.18%, encontrándose la obra atrasada y en ejecución.

Por lo tanto, encontrándose **conforme** la documentación que sustenta la Supervisión, solicito continuar con el trámite respectivo a favor del **Consorcio Libertador del Oriente**. Se adjunta factura electrónica E001-15.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regional de Infraestructura

Ing. BASE FLORES ACUEPUCHO
Sub Gerente de Supervisión y Control



"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

INFORME N°047-2021-GRL-GRI-SGSyC-GMCZE

AL : Raúl Flores Aquepucho
SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

DE : Ing. Madeleine Zapata Espinoza
COORDINADORA DE OBRA

ASUNTO : Informe respecto al pago de valorización de Obra N°05 –ENERO.2021
PROYECTO: "Mejoramiento de la Calle Libertad (Tramo Jr. Castilla/CA. Garcilazo), CA. San Román, CA. Atlantida, PSJE. Independencia, PSJE. SESQUICENTENARIO, Calle Palmeras y PSJE. 22 de Setiembre, distrito de Iquitos, provincia de Maynas- Loreto"

REFERENCIA : Carta N°028-CP&B-2020/La Libertad

FECHA : Iquitos, 05 de febrero DEL 2021.



Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo remitirle la presente documentación.

1. GENERALIDADES DE OBRA

Nombre del Proyecto : "Mejoramiento de la Calle Libertad (Tramo Jr. Castilla/CA. Garcilazo), CA. San Román, CA. Atlantida, PSJE. Independencia, PSJE. SESQUICENTENARIO, Calle Palmeras y PSJE. 22 de Setiembre, distrito de Iquitos, provincia de Maynas- Loreto"

Monto Contractual : S/. 11'899,568.92 (SIN IGV)

Convocatoria : S/. LP-N°003-2019-CSO-GRL

Contrato : N°031-2020-GRL-GGR-GRI

Sistema : Precios Unitarios

Contratista : CONSORCIO LIBERTADOR DEL ORIENTE

Entrega de Terreno : 19-09-2020

Adelanto Directo : S/.1'189,956.89

Adelanto de Materiales : S/.2'379,913.78

Inicio de Ejecución : 21-10-2020

Plazo de Ejecución : 360 días calendario

Residente de Obra : Ing. Gilmer Iván Ulloa Bocanegro

SUPERVISION DE OBRA:

Empresa : CONSORCIO SUPERVISOR P&B

Jefe de Supervisión : Ing. Ángel Portillo

Madeleine Zapata Espinoza
ING. CIVIL
R. CIP. N° 211312




2. ANTECEDENTES

- ✓ Con fecha 25 de agosto del 2020, el comité de selección de Obras adjudicó la buena pro de la LICITACION PUBLICA N°003-2020-CSO-GRL (I CONVOCATORIA) para la contratación de la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DE LA CALLE LIBERTAD (TRAMO JR. CASTILLA/CA. GARCILAZO), CA. SAN ROMÁN, CA. ATLANTIDA, PSJE. INDEPENDENCIA, PSJE. SESQUICENTENARIO, CALLE PALMERAS Y PSJE. 22 DE SETIEMBRE, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS- LORETO", a la Empresa Contratista CONSORCIO LIBERTADOR DEL ORIENTE, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del contrato
- ✓ Con fecha 16 de setiembre del 2020, se suscribió el Contrato N°031-2020-GRL-GRI, entre el GOBIERNO REGIONAL DE LORETO y la empresa Contratista CONSORCIO LIBERTADOR DEL ORIENTE, para la ejecución de la obra mencionada, por un monto de S/ 11, 899,568.92 (once millones ochocientos noventa y nueve mil quinientos sesenta y ocho con 92/100 soles), y con un plazo de ejecución de trescientos sesenta (360) días calendario.
- ✓ Con fecha 21 de octubre del 2020, el comité de selección de Obras adjudicó la buena pro del CONCURSO PUBLICO N°005-2020-CSO-GRL (I CONVOCATORIA) para la contratación de la Supervisión de Consultoría de Obra "MEJORAMIENTO DE LA CALLE LIBERTAD (TRAMO JR. CASTILLA/CA. GARCILAZO), CA. SAN ROMÁN, CA. ATLANTIDA, PSJE. INDEPENDENCIA, PSJE. SESQUICENTENARIO, CALLE PALMERAS Y PSJE. 22 DE SETIEMBRE, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS- LORETO", a la Empresa CONSORCIO P&B, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del contrato
- ✓ Con fecha 29 de octubre del 2020, se suscribió el Contrato N°048-2020-GRL-GRI, entre el GOBIERNO REGIONAL DE LORETO y la empresa CONSORCIO P&B, para la ejecución de la obra mencionada, por un monto de S/ 610,450.00 (seiscientos diez mil cuatrocientos cincuenta con 00/100 soles), y con un plazo de ejecución de trescientos sesenta (300) días calendario.
- ✓ Mediante Carta N°028-CP&B-2020/La Libertad El Consorcio P&B remite la Valorización de Obra N°05.

3. EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

De acuerdo al informe presentado por el Residente y Supervisor de obra, en la que se describe, cuantifica y aprueba los trabajos ejecutados para la Valorización cuyos avances ejecutados y programados es el siguiente:





"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

✓ Montos Valorizados Ejecutados


MES	MONTOS (sin IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
21/10/2020	0	0	0	0
31/10/2020	90,084.74	90,084.74	0.76%	0.76%
30/11/2020	398,703.95	488,788.69	3.35%	4.11%
20/12/2020	299,223.27	788,011.96	2.51%	6.62%
31/12/2020	185,383.99	973,395.95	1.56%	8.18%
31/01/2021	580,374.48	1,553,770.43	4.88%	13.06%
29/02/2021				
31/03/2021				
30/04/2021				
31/05/2021				
30/06/2021				
31/07/2021				
31/08/2021				
30/09/2021				
15/10/2021				
TOTAL	1,553,770.43		13.06%	

✓ Montos Valorizados Programados

MES	MONTOS (sin IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
21/10/2020	0	0	0	0
31/10/2020	89,699.52	89,699.52	0.75%	0.75%
30/11/2020	223,523.62	313,223.14	1.88%	2.63%
20/12/2020	197,977.15	511,200.29	1.66%	4.30%
31/12/2020	197,977.15	709,177.43	1.66%	5.96%
31/01/2021	858,703.22	1,567,880.65	7.22%	13.18%
29/02/2021	1,207,765.86	2,775,646.51	10.15%	23.33%
31/03/2021	1,257,170.53	4,032,817.04	10.56%	33.89%
30/04/2021	1,347,755.21	5,380,572.25	11.33%	45.22%
31/05/2021	1,406,359.66	6,786,931.91	11.82%	57.04%
30/06/2021	1,425,937.20	8,212,869.11	11.98%	69.02%
31/07/2021	1,353,093.71	9,565,962.82	11.37%	80.39%
31/08/2021	1,171,924.32	10,737,887.14	9.85%	90.24%
30/09/2021	876,230.80	11,614,117.94	7.36%	97.60%
15/10/2021	285,450.97	11,899,568.92	2.40%	100.00%
TOTAL	11,899,568.91		100.00%	


Greth Madroño Díaz Castro Zapata Espinoza
ING. CIVIL
R. CIP. N° 211312

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

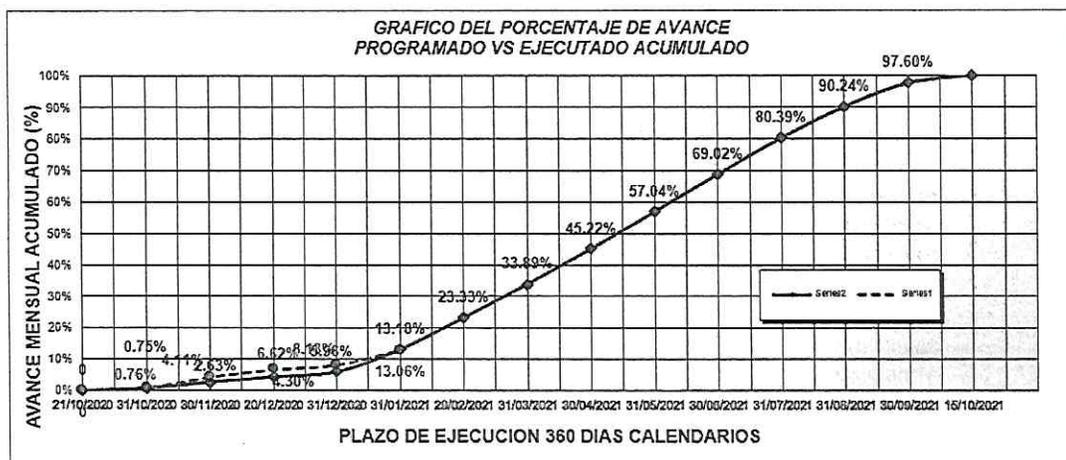

- ✓ La obra en mención tiene un avance físico acumulado al mes de enero 2021 de 13.06% versus calendario programado acumulado al mismo periodo de 13.18%, siendo el estado de la Obra ATRASADA.

- ✓ Amortización de Adelanto Directo

VALORIZACION		Monto Valorizado	Amortización del Adelanto	Monto del Adelanto	Saldo por Amortizar
Nº	Mes				
Nº 01	Octubre '2020	90,084.74	9,008.47	1,189,956.89	1,180,948.42
Nº 02	Noviembre '2020	398,703.95	39,870.39	1,189,956.89	1,141,078.03
Nº 03	Diciembre '2020	299,223.27	29,922.33	1,189,956.89	1,111,155.70
Nº 04	Diciembre '2020	185,383.99	18,538.40	1,189,956.89	1,092,617.30
Nº 05	Enero'2021	580,374.48	58,037.45	1,189,956.89	1,034,579.85
		1,553,770.43			

- ✓ Amortización de Adelanto de Materiales

DESCRIPCION	ADELANTO	AMORTIZACION	AMORTIZACION	AMORTIZACION	AMORTIZACION	AMORTIZACION	SALDO POR
	OTORGADO	VAL Nº 01	VAL Nº 02	VAL Nº 03	VAL Nº 04	VAL Nº 05	
		31-oct-20					ACUMULADA
ADELANTO PARA MATERIALES	2,379,913.78	0.00	86,231.74	64,716.03	40,094.87	126,696.32	317,738.96
TOTAL A AMORTIZAR	2,379,913.78	0.00	86,231.74	64,716.03	40,094.87	126,696.32	317,738.96
