

CUADRO Y GRÁFICO COMPARATIVO DE AVANCE DE OBRA ENERO 2021

Enero del 2021


: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DELSERVICIO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 62200 DEL BARRIO CARABACHEL EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON - LORETO

OBRA

PROPIETARIO	: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO	FECHA ENTREGA DE TERRENO	28/11/2019
CONTRATISTA	: RAMOS CONTRATISTAS GENERALES SAC	INICIO PLAZO CONTRACTUAL	27/12/2019
RESIDENTE	: ING. Marco Antonio Ramos Tafur	PARALIZACION DE OBRA	16/03/2020
FECHA BASE	Feb-19	REINICIO DE OBRA	1/10/2020
MONTO CONTRATADO	S/. 5,180,256.15 Sin IGV	FINAL PLAZO CONTRACTUAL	7/06/2021
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	SUMA ALZADA		
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 300 días calendarios		

PERIODO	PROGRAMADO			REAL EJECUTADO			ESTADO (adelani/retras)
	PARCIAL	ACUMULADO	% ACUM	PARCIAL	ACUMULADO	% ACUM	
Dic-2019	133,468.51	133,468.51	2.58%	133,468.51	133,468.51	2.58%	ADELANTADO
Ene-2020	439,294.09	572,762.60	11.06%	439,294.09	572,762.60	11.06%	ADELANTADO
Feb-2020	535,762.94	1,108,525.54	21.40%	535,762.94	1,108,525.55	21.40%	ADELANTADO
Mar-2020	313,638.74	1,422,164.28	27.45%	313,638.75	1,422,164.29	27.45%	ADELANTADO
Paralizacion			27.45%			27.45%	
Oct-2020	349,987.11	1,772,151.39	34.21%	715,145.82	2,137,310.11	41.26%	ADELANTADO
Nov-2020	396,000.92	2,168,152.31	41.85%	320,866.96	2,458,177.07	47.45%	ADELANTADO
Dic-2020	518,222.32	2,686,374.63	51.86%	292,965.29	2,751,142.36	53.11%	ADELANTADO
Ene-2021	621,141.15	3,307,515.78	63.85%	413,460.60	3,164,603.01	61.09%	ATRASADO
Feb-2021	666,961.93	3,974,477.71	76.72%				
Mar-2021	406,082.85	4,380,560.56	84.56%				
Abr-2021	312,392.52	4,692,953.08	90.59%				
May-2021	359,155.38	5,052,108.46	97.53%				
Jun-2021	128,147.69	5,180,256.15	100.00%				

SITUACIÓN DE LA OBRA : EN LO QUE COMPETE A ESTA FÓRMULA LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA DE ACUERDO AL CALENDARIO DE REINICIO DE OBRA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA Y APROBADA POR LA ENTIDAD.

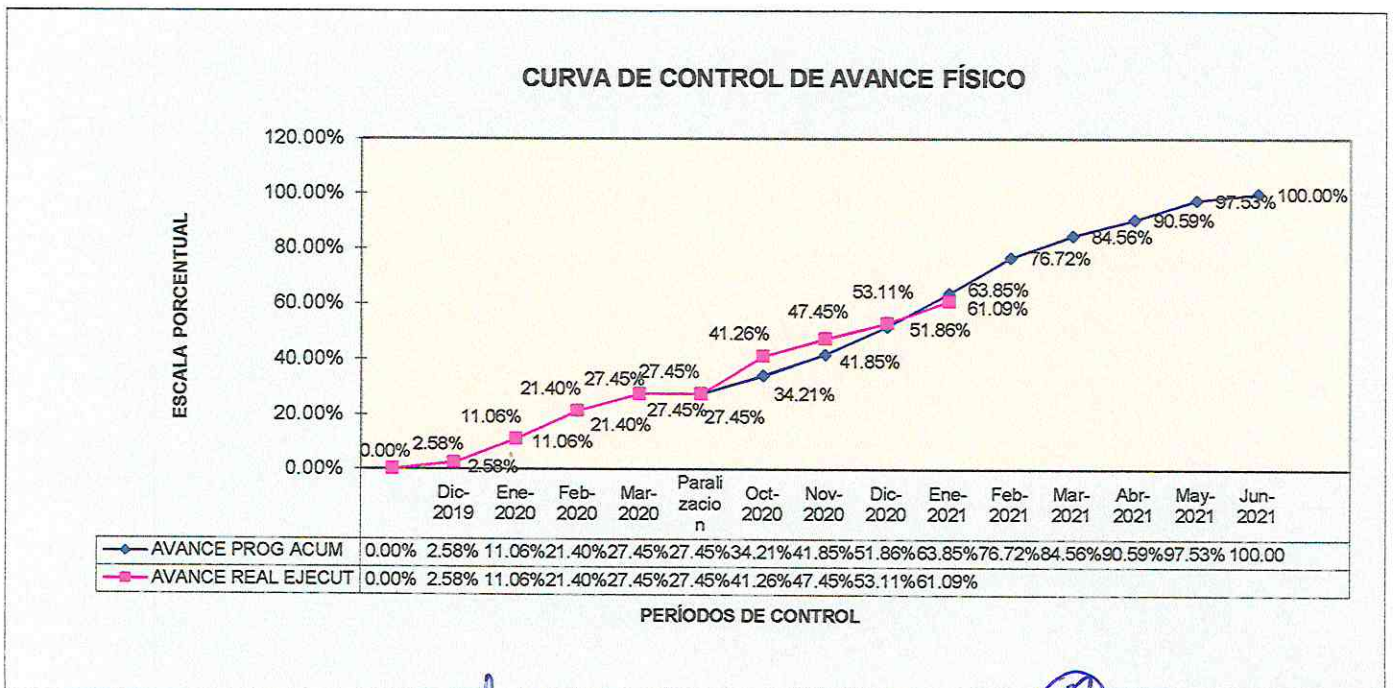

CONSORCIO SUPERVISOR CB

MARCO ANTONIO RAMOS TAFUR
INGENIERO CIVIL
