



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Belén, 20 de abril de 2021

**CARGO**

Oficio n°1165-2021-GRL-GRI-SGSyC

Ing. Mag. Artemio del Águila Panduro  
Gerente Regional de Infraestructura  
Presente

Asunto: Remite Valorización de Obra n° 07  
Marzo del 2021.



Obra: "Mejoramiento de la Calle Libertad (Tramo Jr. Castilla/Ca. Garcilazo), Ca. San Román, Ca. Atlántida, Psje. Independencia, calle palmeras y psj 22 de septiembre, distrito de, Iquitos, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto".

Ref. : a. Informe n° 104-2021-GRL/GRI/SGSyC/EGOS  
b. Carta n° 038-2021-CP&B/LA LIBERTADA

Tengo el agrado de saludarle, en atención a la referencia a), remitirle la valorización n° 02 por ejecución de obra, correspondiente al mes de **marzo del 2021**, presentada y aprobada por el supervisor y revisado por el coordinador, que asciende a la suma de **S/. 827 166.80 (Ochocientos Veintisiete mil cientos sesenta y seis y 80/100 soles)**

De acuerdo al siguiente detalle:

Valorización n° 07 – marzo 2021	S/.	827 166.80
Reajuste	S/.	0.00
Amortización Adelanto Directo (-)	S/.	82 716.68
Amortización Adelanto Materiales (-)	S/.	198 626.71
<b>NETO A PAGAR</b>	<b>S/.</b>	<b>545 823.41</b>

Asimismo, la obra a marzo del 2021, tiene un avance real acumulado ejecutado de 28.03%, versus un avance programado de 33.89%, por lo tanto la Obra se encuentra ligeramente ATRASADA en un 5.89%.

Por lo tanto, encontrándose **conforme** la documentación que sustenta el Coordinador, solicito continuar con el trámite respectivo a favor del **CONSORCIO LIBERTADOR DEL ORIENTE adjunto factura electrónica.**

Atentamente

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
Gerencia Regional de Infraestructura  
  
Ing. RAUL FLORES AGUEPACHO  
Sub Gerencia de Supervisión y Control

Copia: SGSyC – File obra (01)  
SGSyC – File obra (01)  
SGSyC – File correlativo (01)  
SGSyC – File personal (01)  
RFA – S.G.  
dap – Sec.  
Tramite: 07466



**INFORME N°104-2021-GRL-GRI-SGSyC-EGOS**

**A :** Ing. RAUL FLORES AQUEPUCHO  
Sub Gerente de Supervisión y Control

**De :** Ing. ERICK GERMAN OLIVEIRA SANGAMA

**Asunto :** Remito Valorización N°007 marzo del 2021 correspondiente al Contratista Ejecutor de la Obra "MEJORAMIENTO DE LA CALLE LIBERTAD (TRAMO JR. CASTILLA/CA. GARCILAZO) CA. SAN ROMAN, CA. ATLANTIDA, PSJE. INDEPENDENCIA, CALLE PALMERAS Y PSJE. 22 DE SEPTIEMBRE, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO"

**Referencia :** 1. No de Trámite **7466**  
2. Carta N°038-CP&B-2021/La Libertad  
3. Carta N°016-2021-CLDO

**Fecha :** Iquitos, 16 de abril del 2021

Por el presente documento me dirijo a usted para saludarle, y a la vez, remitirle el presente informe en relación a la Carta N°038-CP&B-2021/La Libertad.

**BASE LEGAL**

- ✓ Ley N°30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.
- ✓ Ley N°30880, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2019.
- ✓ Decreto Supremo N°011-79-VC.
- ✓ Texto único Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- ✓ Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
- ✓ Ley N°27806, Ley de Transparencia y de acceso a la información pública.
- ✓ Decreto Supremo N°344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- ✓ Reglamento Nacional de Edificaciones
- ✓ Normas sobre consideraciones de mitigación de impacto Ambiental
- ✓ Código Civil.

**DATOS GENERALES DE LA OBRA:**

- ✓ Proyecto : MEJORAMIENTO DE LA CALLE LIBERTAD (TRAMO JR. CASTILLA/CA. GARCILAZO) CA. SAN ROMAN, CA. ATLANTIDA, PSJE. INDEPENDENCIA, CALLE PALMERAS Y PSJE. 22 DE SEPTIEMBRE, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO
- ✓ CUI : 2302163

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA:**

- ✓ Contratista : CONSORCIO LIBERTADOR DEL ORIENTE
- ✓ Proceso de Selección : LICITACIÓN PÚBLICA N°003-2019-CSO-GRL - PRIMERA CONVOCATORIA
- ✓ Contrato : Contrato N°031-2020-GRL-GGR-GRI
- ✓ Presupuesto Contratado : S/. 11, 899,568.92 Sin Igv.
- ✓ Plazo de Ejecución : 360 días calendarios
- ✓ Adelanto Directo : S/. 1,189,956.89
- ✓ Adelanto de Materiales : S/. 2,379,913.78
- ✓ Inicio de Plazo : 21/10/2020

**DATOS GENERALES DE LA SUPERVISION:**

- ✓ Supervisor de Obra : CONSORCIO P&B
- ✓ Proceso de Selección : CONCURSO PUBLICO N°005-2020-CSO-GRL
- ✓ Contrato : Contrato N°048-2020-GRL-GRI
- ✓ Monto del Contrato : S/. 610,450.00 Sin Igv
- ✓ Plazo de Ejecución : 300 dc (Supervisión de Ejecución de Obra 270 dc + 30 dc Recepción y Liquidación)

Erick German Oliveira Sangama  
Gerente Civil  
CIP N° 141593




**ANTECEDENTES:**

- ✓ Con fecha 25/08/2020 el comité de selección de obra adjudico la buena pro de la Licitación Publica N°003-2020-CSO-GRL (PRIMERA CONVOCATORIA) para la contratación para la ejecución de la obra en mención.
- ✓ Con fecha 16/09/2020 se suscribe el contrato N°031-2020-GRL-GRI entre el Gobierno Regional de Loreto y el Consorcio Libertador del Oriente, contratando la ejecución de la obra mencionada.
- ✓ Con fecha 21/10/2020 el comité de selección adjudico la buena pro del concurso publico N°005-2020-CSO-GRL para la contratación de la supervisión de consultoría de la obra en mención.
- ✓ Con fecha 29/10/2020 se suscribe el Contrato N°048-2020-GRL-GRI entre el Gobierno Regional de Loreto y el Consorcio P&B, contratando los servicios de supervisión de la obra mencionada.
- ✓ Con fecha 04/03/2021 el Consorcio Libertador del Oriente presenta a la Supervisión Consorcio P&B su Carta N°008-2021-CLDO con el cual presenta su Valorización de Obra N°006 Febrero del 2021.
- ✓ Con fecha 05/03/2021 el Consorcio P&B presenta al Gobierno Regional de Loreto la Carta N°032-CP&B-2020/La Libertad con la cual indica que la valorización N°006 Febrero del 2021 está conforme.

**CON RESPECTO AL AVANCE DE OBRA:**

- ✓ El Supervisor de la Obra informa que hasta el mes de marzo del 2021 el avance acumulado ejecutado es del 28.03%, mientras que el avance acumulado programado es del 33.89% teniéndose un 5.89% de atraso, sin embargo, con estos porcentajes, aún están por encima del 80% del avance programado acumulado ya que  $28.03\%/33.89\%=82.71\%$ , es decir, el porcentaje de avance acumulado ejecutado representa el 82.71% del porcentaje de avance acumulado programado. por este motivo no están solicitando la reprogramación de la obra.

FECHA	PROGRAMADO (CONTRACTUAL)			AVANCE REAL DE LA OBRA			ESTADO OBRA (adelantada / retrasada)
	PARCIAL	ACUMULADO	% acumulado	PARCIAL	ACUMULADO	% acumulado	
31-oct-2020	89,699.52	89,699.52	0.75%	90,084.74	90,084.74	0.76%	
30-nov-2020	223,523.62	313,223.14	2.63%	398,703.95	488,788.69	4.11%	adelantada
20-dic-2020	197,977.15	511,200.29	4.30%	299,223.27	788,011.96	6.62%	adelantada
31-dic-2020	197,977.15	709,177.43	5.96%	185,383.99	973,395.95	8.18%	adelantada
31-ene-2021	858,703.22	1,567,880.65	13.18%	580,374.48	1,553,770.43	13.06%	adelantada
28-feb-2021	1,207,765.86	2,775,646.51	23.33%	954,521.12	2,508,291.55	21.08%	atrasada
31-mar-2021	1,257,170.53	4,032,817.04	33.89%	827,166.80	3,335,458.35	28.03%	atrasada
30-abr-2021	1,347,755.21	5,380,572.25	45.22%				
31-may-2021	1,406,359.66	6,786,931.91	57.04%				
30-jun-2021	1,425,937.20	8,212,869.11	69.02%				
31-jul-2021	1,353,093.71	9,565,962.82	80.39%				
31-ago-2021	1,171,924.32	10,737,887.14	90.24%				
30-sep-2021	876,230.80	11,614,117.94	97.60%				
15-oct-2021	285,450.97	11,899,568.92	100.00%				

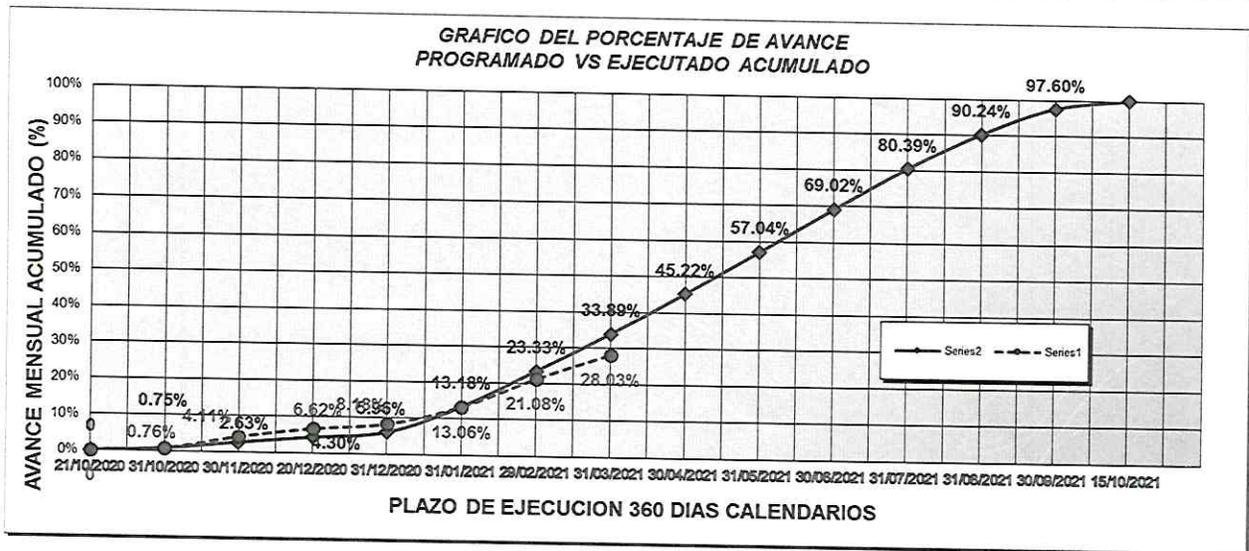

  
**Erick German Oliveira Sangama**  
 Ingeniero Civil  
 CIP N° 141593



**CON RESPECTO AL ADELANTO DIRECTO**

✓ El supervisor y el contratista mediante la valorización N°007 marzo del 2021 informan que en el mes se tiene una amortización de S/. 82,716.68 Soles, quedando un saldo por amortizar de S/. 856,411.06.

VALORIZACION		Monto Valorizado	Amortización del Adelanto	Monto del Adelanto	Saldo por Amortizar
N°	Mes				
N° 01	Octubre '2020	90,084.74	9,008.47	1,189,956.89	1,180,948.42
N° 02	Noviembre '2020	398,703.95	39,870.39	1,189,956.89	1,141,078.03
N° 03	Diciembre '2020	299,223.27	29,922.33	1,189,956.89	1,111,155.70
N° 04	Diciembre '2020	185,383.99	18,538.40	1,189,956.89	1,092,617.30
N° 05	Enero 2021	580,374.48	58,037.45	1,189,956.89	1,034,579.85
N° 06	Febrero 2021	954,521.12	95,452.11	1,189,956.89	939,127.74
N° 07	Marzo 2021	827,166.80	82,716.68	1,189,956.89	856,411.06
		3,335,458.35			
Total Amortización de Adelanto Directo en la presente valorización					82,716.68

**CON RESPECTO AL ADELANTO DE MATERIALES**

✓ El supervisor y el contratista mediante la valorización N°007 marzo del 2021 informan que en el mes se tiene una amortización de S/. 198,626.71 Soles, quedando un saldo por amortizar de S/. 1,634,300.34.

Cuadro # 03		CONTROL DE AMORTIZACIONES											
IU	MATERIAL	Monto del Adelanto	Ade. Utilizado en el Mes	VALOR DE LOS INDICES		ADELANTOS AMORTIZADOS POR VALORIZACIONES							Saldo
				Base mo Jun-20	Compra mo FEB-21	Val # 01	Val # 02	Val # 03	Val # 04	Val # 05	Val # 06	Val # 07	
05	AGREGADO GRUESO	1,011,888.87	17,148.02	100.00	100.00	-	36,800.12	27,678.15	17,148.02	53,664.64	88,293.20	76,512.93	711,891.81
03	ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGAD	376,014.72	5,932.29	554.21	748.10	-	17,222.09	12,925.00	8,057.70	25,069.37	41,230.72	35,720.62	237,830.22
21	CEMENTO PORTLAND TPO I	990,010.19	16,777.25	449.56	449.56	-	36,082.71	27,079.71	16,777.25	52,523.89	89,384.16	85,384.16	604,778.31
		2,377,913.78	39,857.56			-	90,104.92	67,682.86	41,982.97	131,277.90	215,008.08	198,626.71	1,634,300.34

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

- ✓ El suscrito concluye que según lo informado por el supervisor y el contratista ejecutor de la obra en su valorización N°007 marzo del 2021 la obra se encuentra atrasada en un 5.89% no siendo necesario aun una reprogramación debido a que la el porcentaje acumulado ejecutado con respecto al porcentaje acumulado programado es del 82.71% no estando por debajo el 80%.
- ✓ El avance acumulado ejecutado de la obra es de un 28.03% mientras que el avance acumulado programado es de 33.89%.
- ✓ El supervisor informa que el contratista aún tiene saldo por amortizar con respecto al adelanto directo siendo este de S/. 856,411.06 Soles; también tiene saldo por amortizar relacionado al adelanto de materiales e insumos otorgado siendo este de S/. 1, 634,300.34 Soles.
- ✓ En resumen la valorización N°007 marzo del 2021 se cuantifica de la siguiente manera:
  - Valorización Bruta : S/. 827,166.80
  - Amortización por Adelanto Directo (-) : S/. 82,716.68
  - Amortización por Adelanto de Materiales (-) : S/. 198,626.71
  - Reajuste : S/. 0.00
  - Valorización Neta : S/. 545,823.41

Atentamente;

Erick German Oliveira Sangama  
Ingeniero Civil  
17102141593

ING° ERICK GERMAN OLIVEIRA SANGAMA

# CONSORCIO P&B - SUPERVISION

RUC: 20606687096

Dirección: Calle Iquitos N° 288

CARTA N° 038 - CP&B - 2021/La Libertad

Señor:

ING. ARTEMIO DEL AGUILA PANDURO  
Gerente de Obras e Infraestructura  
Gobierno Regional de Loreto

Presente. -

Asunto : **PAGO DE LA VALORIZACION DE OBRA N° 07 - MARZO. 2021**

Referencia : a) Carta N° 016-2021-CLDO recibida el 07.ABR.2021  
b) OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CALLE LIBERTAD (TRAMO JR. CASTILLA / CA. GARCILAZO), CA. SAN ROMAN, CA. ATLANTIDA, PSJE. INDEPENDENCIA, PSJE. SESQUICENTENARIO, CALLE PALMERAS Y PSJE. 22 DE SETIEMBRE, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO"



De mi consideración:

Por medio del presente, se hace llegar la Valorización de Obra N° 07 del mes de MARZO del 2021 por el periodo de 31 días calendarios, el cual está conforme y tiene la siguiente estructura

## RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA N° 07 - MARZO-2021

a.- PRESUPUESTO BASE CON IGV	S/.	13,636,715.28
b.- MONTO CONTRATADO SIN IGV	S/.	11,899,568.92
1.- VALORIZACION DE OBRA N° 07 - MARZO .2021	S/.	827,166.80
2.- AMORTIZACION POR ADELANTO D'RECTO	S/.	-82,716.68
3.- AMORTIZACION POR ADELANTO MATERIALES	S/.	-198,626.71
<b>SUB TOTAL</b>		<b>S/.</b>
		<b>545,823.41</b>
4.- REAJUSTE VALORIZACION N° 07 - MARZO.2021	S/.	-
5.- DEDUCCIONES QUE NO CORRESPONDE	S/.	-
<b>MONTO A FACTURAR</b>		<b>S/.</b>
		<b>545,823.41</b>
6.- RETENCION POR FIEL CUMPLIMIENTO	S/.	-
7.- AVANCE ACUMULADO	28.03%	
<b>MONTO NETO A PAGAR:</b>		<b>S/.</b>
		<b>545,823.41</b>

El contratista tiene un avance acumulado al mes de MARZO del 2021 de 28.03%, y el avance acumulado programado indica 33.89% por lo tanto, la obra está **ATRASADA** en 5.86%, pero como está por encima del 80% del avance acumulado programado, NO se está solicitando la reprogramación de obra vigente; este atraso se debe a que el contratista NO ha culminado ni laborado en partidas que estaban programados su ejecución en este mes marzo 2021.

Es todo cuanto informo a su Despacho, y lo elevo para su trámite consiguiente.

Atentamente,

PROVEIDO N° 7466  
OA: 5651C-6RI  
PARA: Alejandro  
08/04/21

CONSORCIO P&B

KARLO S. MIJAIL CONTOGURIS POMA  
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA

