




"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Belén, 11 de junio de 2021

CARGO

Oficio n°1742-2021-GRL-GRI-SGSyC

Ing. Mag. Artemio del Águila Panduro
Gerente Regional de Infraestructura
Presente



Asunto: Remite Valorización de Obra n° 05
Mayo de 2021.

Obra: "Mejoramiento de la Oferta Educativa
Nivel Primaria en la Institución
Educativa de Educación Básica
Regular n.° 62056, Villa Lagunas del
distrito de Lagunas – Provincia de Alto
Amazonas – Departamento de Loreto.

Ref. : a. Informe n°142-2021-GRL/GRI/SGSyC/CDPBG
b. Carta n° 026-2021-CCL-MSCHC/RC

Tengo el agrado de saludarle cordialmente y en
relación al documento de la referencia a), remitirle la valorización n° 05 por ejecución de
obra, correspondiente a mayo de **2021**, aprobada por el supervisor y revisada por la
coordinadora de Obra, de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización n° 05 – Mayo 2021	SI.	352 756.41
Reajuste Neto	SI.	0.00
Amortización Adelanto Directo	SI.	35 275.64
Amortización de adelanto de materiales	SI.	87 699.53
Deducción de Reajuste Adelanto Directo	SI.	0.00
Deducción de Reajuste Adelanto de Materiales	SI.	0.00
Monto Neto a Pagar de Valorización	SI.	229 781.24
IGV 18%	SI.	0.00
Retención del 10% Fondo de Garantía	SI.	0.00
Monto a Pagar al Contratista	SI.	229 781.24

Asimismo, la obra a mayo del 2021, tiene un avance real acumulado ejecutado de
61.00%, versus un avance programado de 75.30%, teniendo en cuenta que la obra se
encuentra atrasada en un 14.30%

Por lo tanto, encontrándose **conforme** la documentación que sustenta la coordinadora,
solicito continuar con el trámite respectivo a favor del **CONSORCIO LAGUNAS**. Se
Adjunta factura electrónica

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regional de Infraestructura
Ing. RAUL FLORES AQUEPUCHO
Sub Gerente de Supervisión y Control
CIP. 33330

Copia: SGSyC – File obra (01)
SGSyC – File correlativo (01)
SGSyC – File personal (01)
RFA – S.G.
dap – Sec.
Trámite: 13310



420 ✓

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

INFORME N°0142-2021-GRL-GRI-SGSyC-CDPBG



AL : Ing. Raúl Flores Aquepucho
SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

DE : Arq. Carolina del Pilar Baneo Garate
COORDINADORA DE OBRA

ASUNTO : REMITO INFORME DE DOCUMENTACION, VALORIZACION DE OBRA N° 05 –
MAYO 2021 (CONTRATISTA)

REFERENCIA : (01) Obra: "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA
EN LA ISNTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR N°
62056 DE VILLA LAGUNAS DELL DISTRITO DE LAGUNAS – PROVINCIA DE
ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO".
(02) Carta N°026-2021-CLC-MSCHR/RC
(03) Informe N° 025-2021-CCL-MSCHR/RC
(03) Carta N° 027-2021/CL
(04) Trámite: 13310

FECHA : Iquitos, 09 de junio del 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo remitirle la presente documentación de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA ISNTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR N° 62056 DE VILLA LAGUNAS DEL DISTRITO DE LAGUNAS – PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO". Respecto a la Valorización N° 05 correspondiente al mes de mayo del 2021.

1. DATOS TECNICOS

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la obra : "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA ISNTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR N° 62056 DE VILLA LAGUNAS DELL DISTRITO DE LAGUNAS – PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO".

Ubicación :
Localidad : Lagunas
Distrito : Lagunas
Provincia : Alto Amazonas
Región : Loreto

COORDINADORA DE OBRA : ARQ. BANEO GARATE, CAROLINA DEL PILAR –
REG. CAP. N° 18391

MONTO CONTRATADO : S/. 3,872,652.12 (sin I.G.V.)

ENTREGA DE TERRENO : 16 de octubre del 2020.

INICIO DE OBRA : 01 de diciembre del 2020

PLAZO DE EJECUCION : 180 Días Calendario.

SUSPENSIÓN DE PLAZO 01 : 10 Días calendario

Fecha de Acta de Suspensión 01 : 01/02/2021

Reinicio de ejecución : 10/02/2021

Nuevo Término de Plazo : 08/07/2021



419

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

SUSPENSION DE PLAZO 02 : 08 días calendario
Fecha de Acta de Suspensión 02 : 06/04/2021
Reinicio de ejecución : 14/04/2021
Nuevo Término de Plazo : 16/07/2021

SUSPENSION DE PLAZO 03 : 08 días calendario
Fecha de Acta de Suspensión 02 : 06/04/2021
Reinicio de ejecución : 13/05/2021
Nuevo Término de Plazo : 25/07/2021

ESTADO DE OBRA : **EJECUCION - ATRASADA**
ADELANTO DIRECTO : 387,625.12 SOLICITADO
ADELANTO DE MATERIALES : 774,530.42 SOLICITADO
AVANCE FISICO DEL MES : 9.11%
AVANCE FISICO ACUMULADO : 61.00%
%Avance Programado al mes : 15.76%
%Avance Programado Acumulado : 75.30 %

• **DATOS DEL CONTRATISTA**

CONTRATISTA : **CONSORCIO LAGUNAS**
CONCURSO : L.P. N° 006-2020-CSO-GRL
RESIDENTE : **ING. ALFREDO RICARDO MARMOLEJO CUCHO**
CONTRATO : N° 038-2020-GRL-GGR-GRI.
MONTO CONTRATADO : S/ 3'872,524.99, con IG.V.
FIRMA DE CONTRATO : 01 de octubre del 2020.
PLAZO DE EJECUCION : 180 Días Calendarios.

• **DATOS DE LA SUPERVISION**

CONSULTOR : **CONSORCIO SUPERVISOR LAGUNAS**
JEFE DE SUPERVISIÓN : **ING. PINCHI, VASQUEZ, EDUARDO. – REG. CIP. 55689.**
CONTRATO : N° 027-2020-GRL-GGR-GRI.
PLAZO DE EJECUCION : 240 Días Calendarios.

2. ANTECEDENTES DE OBRA:

- ✓ **Con fecha 27 de febrero del 2019:**
Se aprueba el Expediente Técnico de “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA ISNTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR N° 62056 DE VILLA LAGUNAS DELL DISTRTITO DE LAGUNAS – PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO”, mediante Resolución de alcaldía N° 050-2019-MDL/A.020
- ✓ **Con fecha 11 de setiembre del 2020**
Se adjudica la buena pro de la Licitación Publica N° 0006-2020-CSO-GRL de la obra en mención.
- ✓ **Con fecha 01 de octubre del 2020:**
Se firma el contrato de ejecución de la obra en mención, entre el Gobierno Regional de Loreto y el CONSORCIO LAGUNAS, mediante Contrato N° 038-GRL-GRI
- ✓ **Con fecha 25 de noviembre del 2020:**
Mediante Carta N° 923-2020-GRL-GRI-SGSYC, se comunica al CONSORCIO LAGUNAS la reformulación de la Formula Polinómica.
- ✓ **Con fecha 15 de noviembre del 2020:**
Se realiza la entrega de terreno
- ✓ **Con fecha 01 de Diciembre del 2020:**
Se da inicio a la obra: “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA ISNTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR N° 62056 DE VILLA LAGUNAS DELL DISTRTITO DE LAGUNAS – PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO”.



- ✓ **Con fecha 01 de Enero del 2021:**
Mediante Acta de suspensión de Plazo de Ejecución del Contrato N° 038-2020-GRL-GGR-GRI, se suspenden las actividades de ejecución de obra por motivos de presencia de lluvia, que imposibilitan el desarrollo de las actividades.
- ✓ **Con fecha 05 de marzo del 2021:**
Mediante Carta N° 011-2021-CCL-MSCHC/RCCSA-RC CONSORCIO SUPERVISOR LAGUNAS presenta segunda Valorización – correspondiente al mes FEBRERO DEL 2021.
- ✓ **Con fecha 09 de abril del 2021:**
Mediante Carta N° 023-2021-CCL-MSCHC/RCCSA-RC CONSORCIO SUPERVISOR LAGUNAS presenta tercera Valorización – correspondiente al mes MARZO DEL 2021.
- ✓ **Con fecha 05 de mayo del 2021:**
Mediante Carta N° 021-2021-CCL-MSCHC/RCCSA-RC CONSORCIO SUPERVISOR LAGUNAS presenta cuarta Valorización – correspondiente al mes ABRIL DEL 2021.
- ✓ **Con fecha 07 de junio del 2021:**
Mediante Carta N° 026-2021-CCL-MSCHC/RCCSA-RC CONSORCIO SUPERVISOR LAGUNAS presenta quinta Valorización – correspondiente al mes MAYO DEL 2021.

3. DOCUMENTOS PRESENTADOS:

Con Carta N° 026-2021/CL CONSORCIO LAGUNAS recepcionada por el Supervisor el 07 de JUNIO del 2021, el Contratista presenta al Supervisor CONSORCIO SUPERVISOR LAGUNAS la Valorización de Ejecución de Obra N° 05 correspondiente al mes de MAYO del 2021, en la cual hace de conocimiento que se han ejecutado los metrados del presupuesto del Expediente Técnico Contractual, de manera que solicita su pago correspondiente, con la siguiente documentación como anexo:

- CD CON CONTENIDO DIGITAL DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA
- CARTA N° N° 027-2021/CL DEL CONTRATISTA
- FACTURA ELECTRONICA
- DOCUMENTACION TECNICA
- RESUMEN DE PAGOS DE VALORIZACIONES
- AMORTIZACIONES DE ADELANTOS
 - ADELANTO DIRECTO
 - ADELANTO DE MATERIALES
- COPIA DE FORMULA POLINOMICA DEL EXPEDIENTE TECNICO
- INDICE UNIFICADO
- CALENDARIO PROGRAMADO VALORIZADO ACTUALIZADO – ABRIL 2021
- CONTROL DE CALIDAD
- CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL RESIDENTE
- PAGO DE TRIBUTOS
 - SENCICO
 - ESSALUD
 - ONP
 - SCTR
 - CONAFOVICER
- COPIA DE PLANILLAS DE JORNALES
- COPIA DE DECLARACION PDT – SUNAT
- COPIA EL CUADERNO DE OBRA
 - DESDE EL ASIENTO N° 151 AL ASIENTO N° 198 – MES DE MAYO 2021
- RELACION DE PERSONAL TECNICO
- INFORME DE ACTIVIDADES
 - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
 - INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
- PANEL FOTOGRAFICO



470
417

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÙ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

- COPIA DE CARTAS FIANZAS
FIEL CUMPLIENTO
ADELANTO DIRECTO
ADELANTO DE MATERIALES
- INFORME COVID 19
ANEXOS
REGISTRO DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y SATURACION DE OXIGENO DE CADA TRABAJADOR.

4. ASPECTO LEGAL DE OBRA

- ✓ **01 de octubre del 2020**
Contrato de Ejecución de Obra N° 038-2020-GRL-GGR-GRI
- ✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento N° 30225 modificado por Decreto Legislativo N° 1444 aprobado por D.S. N° 344-2018-EF y el Código Civil Vigente.

5. CONTROL DE VIGENCIAS DE CARTAS FIANZAS DE OBRA

Del control de cartas fianzas de Obra, tenemos:

ESTADO DE CARTAS FIANZAS					
N°	CONCEPTOS	DOCUMENTO QUE SUSTENTA SOLICITUD DE DESEMBOLSO	MONTO (\$/)	INICIO DE VIGENCIA	TERMINO DE VIGENCIA
1	Fiel Cumplimiento	MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGURADOS	387,265.21	22 de septiembre del 2020.	18 de Junio del 2021
2	Adelanto Directo	MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGURADOS	299,173.68	05 de abril del 2021.	10 de julio del 2021
3	Adelanto de Materiales	MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGURADOS	412,128.91	31 de mayo del 2021.	10 de setiembre del 2021

SP

6. RESUMEN DE METRADOS EJECUTADOS

Con respecto a los Metrados de la Valorización N° 05 de la obra en mención en la referencia (1), se informa que en gabinete se ha efectuado la revisión de la documentación alcanzada a la suscrita, para lo cual el supervisor ratifica en el informe presentado a la Entidad.



7. RESUMEN DE VALORIZACION

De acuerdo a la documentación presentada por la Supervisión con respecto a la Valorización N° 05 de la obra mencionada en la referencia (1), se informa que se ha revisado en gabinete la documentación alcanzada a la suscrita luego de que los metrados para la elaboración de la valorización fuesen aprobados por el Residente y el Supervisor de la obra, para lo cual se presenta un resumen de la misma, tenemos:

VALORIZACION N° 05 - MAYO 2021	
DESCRIPCION	MONTO (S/)
MONTO BRUTO VALORIZADO	352756.41
REAJUSTE NETO	S/0.00
AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO	35275.64
AMORTIZACION ADELANTO DE MATERIALES	87699.53
DEDUCCION DE REAJUSTE ADELANTO DIRECTO	S/0.00
DEDUCCION DE REAJUSTE ADELANTO DE MATERIALES	S/0.00
MONTO A PAGAR DE VALORIZACION	S/229,781.24
IGV 18%	S/0.00
RETENCION DEL 10% FONDO DE GARANTIA	S/0.00
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA	S/229,781.24

"De acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, según el Art. 194° Valorizaciones y metrados:

194.1 Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada periodo previsto en las Bases, por el inspector o supervisor y el contratista.

...

194.6 El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes. Cuando las valorizaciones se refieran a periodos distintos a los previstos en este párrafo, las Bases deben establecer el tratamiento correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo.

194.7 A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil." Revisarlo en el RLCE.

8. ESTADO FISICO FINANCIERO ACTUAL DE OBRA

Del estado físico financiero actual de Obra, tenemos:

N° VAL.	PERIODO	CALENDARIO PROGRAMADO ACTUALIZADO			
		SOLES		PORCENTAJE	
		MENSUAL	ACUMUL.	MENSUAL	ACUMUL.
1	0	-	-	-	-
2	DICIEMBRE 2020	289,113.41	289,113.41	7.47%	7.47%
3	FEBRERO 2021	559,576.01	848,689.42	14.45%	21.91%
4	MARZO 2021	684,242.68	1,532,932.10	17.67%	39.58%
5	ABRIL 2021	772,779.48	2,305,711.58	19.95%	59.54%
6	MAYO 2021	610,404.79	2,916,116.37	15.76%	75.30%
7	JUNIO 2021	561,472.16	3,477,588.53	14.50%	89.80%
8	JULIO 2021	395,063.59	3,872,652.12	10.20%	100.00%
	TOTAL	3,872,652.12		100.00%	



415

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”


N° VAL.	PERIODO	AVANCE EJECUTADO			
		SOLES		PORCENTAJE	
		PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
1	0	-	-	-	-
2	DICIEMBRE 2020	289,113.41	289,113.41	7.47%	7.47%
3	FEBRERO 2021	591,801.17	880,914.58	15.28%	22.75%
4	MARZO 2021	555,623.48	1,436,538.06	14.35%	37.09%
5	ABRIL 2021	572,963.67	2,009,501.73	14.80%	51.89%
6	MAYO 2021	352,756.41	2,362,258.14	9.11%	61.00%
7	JUNIO 2021				
8	JULIO 2021				
TOTAL		ESTADO DE LA OBRA		ATRASADO	14.30%

De la figura tenemos, al término del mes de mayo del 2021, el estado de **AVANCE** de obra respecto a lo programado es **ATRASADA**.

- o De la figura tenemos, al término del QUINTO MES contractual del plazo de ejecución de obra (mayo del 2021), el estado de **AVANCE MENSUAL EJECUTADO ES DE 9.11 % respecto al AVANCE PROGRAMADO PARCIAL es de 15.76%, y un ACUMULADO EJECUTADO DE 61.00% Y AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO DE 75.30%** teniendo que la **OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA EN UN 14.30%**.

9. CURVA DE AVANCE DE OBRA

Del Avance de Obra comparado entre el Avance Programado vs. Avance Ejecutado, tenemos:

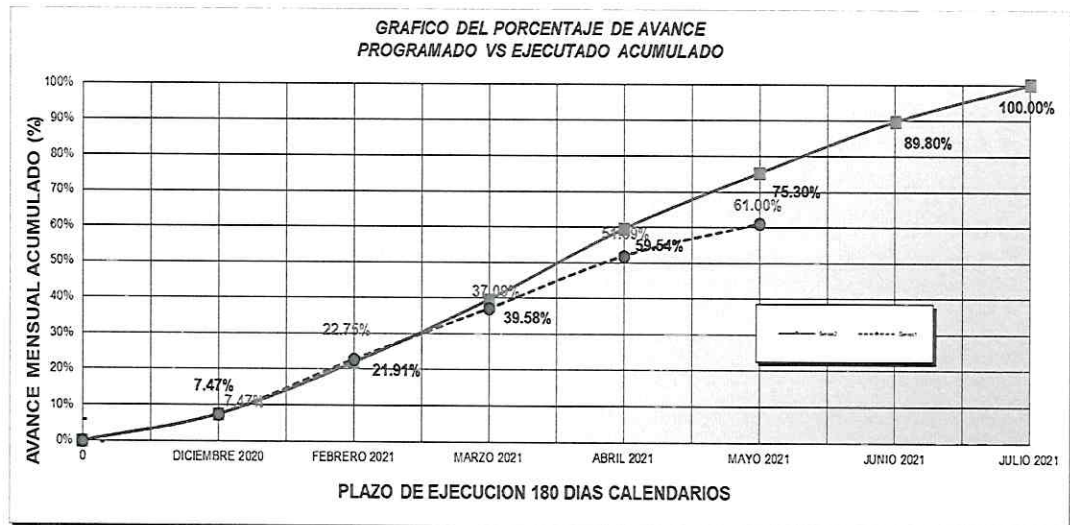

Mediante el grafico se observa que el avance ejecutado acumulado de la obra correspondiente al mes de mayo del 2021 es de 61.00%, el avance programado acumulado es 75.30 %, por lo que la obra se encuentra **ATRASADA**.



407
414

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

10. AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO DE OBRA:

De la Amortización del Adelanto Directo de Obra, tenemos:

VALORIZACION DE OBRA N° 05 AL 31 DE MAYO DEL 2021				
OBRA	"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR 62056 DE VILLA LAGUNAS, DEL DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS, LORETO"			
Modalidad de ejecución	A SUMA ALZADA			
ENTIDAD CONTRATANTE	GOBIERNO REGIONAL DE LORETO			
UBICACIÓN	VILLA LAGUNAS			
RAZON SOCIAL	CONSORCIO LAGUNAS			
SUPERVISOR DE OBRA	ING. EDUARDO PINCHI VASQUEZ			
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO				
M. CONTRATADO	C =	S/ 3,672,652.12	S/IGV	
A. OTORGADO	A =	S/ 387,265.21	S/IGV	
	A/C=	10.00%		
AMORTIZACION = A/C * V				
MES DE LA VALORIZACION	MONTO VALORIZADO	AMORTIZACION		SALDO POR AMORTIZAR (SIN I.G.V.)
		A/C * V DEL MES	AMORTIZACION ACUMULADA	
Dic-20	289,113.41	28,911.34	28,911.34	368,363.87
Feb-21	591,801.12	59,180.11	88,091.45	290,173.76
Mar-21	555,623.48	55,562.35	143,653.80	243,611.41
Abr-21	572,963.87	57,296.37	200,950.17	186,315.04
May-21	352,756.41	35,275.64	236,225.81	151,039.40
Jun-21	0.00	0.00	0.00	0.00

De la figura tenemos, la Amortización del Adelanto Directo en el mes de MAYO DEL 2021 es S/ 35,275.64 (TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 64/100 SOLES).

11. AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES:

De la Amortización del Adelanto de Materiales, tenemos:

VALORIZACION MENSUAL N° 5 AL 31 DE MAYO DEL 2021			
OBRA:	"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR 62056 DE VILLA LAGUNAS, DEL DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS, LORETO"		
SISTEMA:	A PRECIOS UNITARIOS		
PROPIETARIO:	GOBIERNO REGIONAL DE LORETO		
UBICACIÓN:	VILLA LAGUNAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO LAGUNAS		
SUPERVISION:	ING. EDUARDO PINCHI VASQUEZ		
RESUMEN AMORTIZACION ADELANTO PARA MATERIALES			
ADEL. MATERIALES	S/ 774,530.42 S/IGV		
MES DE LA VALORIZACION	AMORTIZACION	AMORTIZACION ACUMULADA	SALDO POR AMORTIZAR
Dic-20	0.00	0.00	774,530.42
Ene-21	0.00	0.00	774,530.42
Feb-21	130,991.56	130,991.56	643,538.86
Mar-21	129,045.62	260,037.18	514,493.24
Abr-21	102,364.33	362,401.51	412,128.91
May-21	87,699.53	450,101.04	324,429.38
Jun-21	0.00	450,101.04	324,429.38

De la figura tenemos, la Amortización del Adelanto de Materiales en el mes de MAYO DEL 2021 es S/ 87,699.53 (OCHENTA Y SIETE MIL SEIS CIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 53/100 SOLES).



406
413

12. CONCLUSIONES

- ✓ Se comunica que la suscrita ha realizado la verificación y análisis de la documentación presentada por el Supervisor **CONSORCIO SUPERVISOR LAGUNAS** en gabinete, correspondiente al mes de Mayo del 2021, donde previamente se da conformidad a los Metrados conciliados en conjunto por el Jefe de Supervisión y el Residente de Obra los mismos que fueran anotados en el Cuaderno de Obra, habiéndose tomado como válida toda la información presentada por el Supervisor, quién es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato.
- ✓ Se comunica que en la presente Valorización el **AVANCE REAL ACUMULADO DE OBRA** de 61.00%, con un **AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO DE OBRA** del 75.30% **AL MES DE MAYO**. Por tanto, la Obra se encuentra **ATRASADA** según lo programado. Dichos porcentajes se han verificado en los documentos tramitados de la Valorización N° 05 – MAYO del 2021 alcanzadas a la suscrita.
- ✓ Se comunica que el Monto Total Valorizado por el Contratista es de **S/ 352,756.41 (TRES CIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 41/100 SOLES)**; debiéndosele pagar un Monto Total **S/ 229,781.24 (DOS CIENTOS VEINTI NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 24/100 SOLES)**; dicho monto se ha verificado en los documentos tramitados de la Valorización N° 05 – MAYO del 2021 alcanzados a la suscrita y aprobados por la Supervisión – CONSORCIO SUPERVISOR LAGUNAS.

VALORIZACION N° 05 - MAYO 2021	
DESCRIPCION	MONTO (S/)
MONTO BRUTO VALORIZADO	352,756.41
REAJUSTE NETO	S/0.00
AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO	35,275.64
AMORTIZACION ADELANTO DE MATERIALES	87,699.53
DEDUCCION DE REAJUSTE ADELANTO DIRECTO	S/0.00
DEDUCCION DE REAJUSTE ADELANTO DE MATERIALES	S/0.00
MONTO A PAGAR DE VALORIZACION	S/229,781.24
IGV 18%	S/0.00
RETENCION DEL 10% FONDO DE GARANTIA	S/0.00
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA	S/229,781.24

13. RECOMENDACION

- ✓ Al contar con la opinión favorable, validación del monto consignado y conformidad por parte de la Supervisión de Obra **CONSORCIO SUPERVISOR LAGUNAS**, se recomienda continuar con el trámite de pago de la valorización N° 05, correspondiente al mes de Mayo 2021, de ejecución de obra: **"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR N° 62056 DE VILLA LAGUNAS DELL DISTRITO DE LAGUNAS – PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO"**, por el monto neto de **S/ 229,781.24 (DOS CIENTOS VEINTI NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 24/100 SOLES)** a favor de **CONSORCIO LAGUNAS**.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y tramite respectivo.

Atentamente,

Carolina Del Pilar Baneo Garate
ARQUITECTA

Arq. Carolina del Pilar Baneo Garate.
COORDINADORA DE OBRA



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
07 JUN. 2021
Hora: 12:59 pm

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Lagunas, 04 de junio de 2021
UNIDAD TRÁMITE DOCUMENTARIO
07 JUN 2021

CARTA N° 026 – 2021 – CCL – MSCHC/RC

Señor:

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

Atención : Gerencia Regional de Infraestructura.

Asunto : REMITE INFORME DE VALORIZACION N° 05 DE LA CONTRATISTA – CONSORCIO LAGUNAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021 DE LA OBRA : "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR N° 62056 DE VILLA LAGUNAS DEL DISTRITO DE LAGUNAS – PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEPARTAMENTO DE LORETO"

Referencia :

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Sub Gerencia de Supervisión y Control
08 JUN 2021
Fecha: 13310 A 9:23 AM
N° Reg:

1. INFORME N° 025 – 2021 – CSLAGUNAS/JS.EPINVAS

2. Supervisión de la Obra : "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR N° 62056 DE VILLA LAGUNAS DEL DISTRITO DE LAGUNAS – PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEPARTAMENTO DE LORETO"
3. Contrato N° 027– 20120– GRL/GRI

De mi especial Consideración:

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarlo muy cordialmente y en cumplimiento del contrato vigente, traslado informe de JEFE DE SUPERVISION sobre LA VALORIZACION N° 05 DEL CONTRATISTA CONSORCIO LAGUNAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021 DE LA OBRA : "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR N° 62056 DE VILLA LAGUNAS DEL DISTRITO DE LAGUNAS – PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEPARTAMENTO DE LORETO", para su evaluación y trámite correspondiente.

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi consideración y estima personal.

Atentamente,

CONSORCIO SUPERVISOR LAGUNAS
Marcos Sergio Chupillón Campos
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N° 16419686

PROVENIENCIA N° 13310
Asy. - Carolina



04 ALP
0100
PROVENIENCIA N° 13310
A: 3654C- GRI
PARA: Atenciones
08/06/21
Circular stamp: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, V° 50

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

LECCIÓN LICITACION PUBLICA Nº 06-2020-C-50 GRL
CONSORCIO LAGUNAS

OBRA
SI. 3,872,652.12

REGION Loreto
PROVINCIA Alto Amazonas
DISTRITO LAGUNAS

"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR 62056 DE VILLA LAGUNAS, DEL DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS, LORETO"

SI. 0.00

SI. 0.00

SI. 3,872,652.12

01-Dic-20

180 Dias

Fecha de Inicio de Obra

Plazo de Ejecución

1ª Paralización

2ª Paralización

3ª Paralización

Fecha de Término de Obra Inicial

Fecha de Término Contractual

25-Jul-21

PRESUPUESTO INTEGRAL

VALORIZACION MENSUAL Nº 5

AL 31 DE MAYO DEL 2021

ING. EDUARDO PINCHI VASQUEZ

AVANCE DE OBRA

PRESUPUESTO	UNID	AVANCE ANTERIOR						AVANCE ACTUAL			AVANCE ACUMULADO		SALDO POR VALORIZAR		
		Metrado		Valorizado		Metrado		Valorizado		Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado		
														%	
OBRA PROVISIONALES, TRABAJOS															
OBRA PROVISIONALES															
	und	1.00	678.83	0.00	0.00	1.00	678.83	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	mes	5.00	2,500.00	0.00	0.00	5.00	2,500.00	83.33	0.00	0.00	500.00	1.00			
	qib	0.50	2,000.00	0.00	0.00	0.50	2,000.00	50.00	0.00	0.00	2,000.00	0.50			
	m	300.00	6,261.00	0.00	0.00	300.00	6,261.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	gib	1.00	1,400.00	0.00	0.00	1.00	1,400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	mes	5.00	1,500.00	0.00	0.00	5.00	1,500.00	83.33	0.00	0.00	300.00	1.00			
	ton	1,140.00	171,000.00	1.00	150.00	1,141.00	171,150.00	99.65	0.00	0.00	600.00	4.00			
TRABAJOS PRELIMINARES															
	und	10.00	47.50	0.00	0.00	10.00	47.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	und	35.00	621.95	0.00	0.00	35.00	621.95	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	m2	591.00	1,312.02	0.00	0.00	591.00	1,312.02	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	m2	591.00	1,932.57	0.00	0.00	591.00	1,932.57	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	m2	479.93	2,279.67	0.00	0.00	479.93	2,279.67	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	m2	10.13	1,323.89	0.00	0.00	10.13	1,323.89	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	m2	591.00	2,943.18	0.00	0.00	591.00	2,943.18	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SEGURIDAD Y SALUD															
	gib	1.00	5,580.00	0.00	0.00	1.00	5,580.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	gib	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	2,500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
CONSORCIO SUPERVISOR LAGUNAS S46.00															
Ing. Eduardo Pinchi Vasquez Supervisor N. 56689															
	gib	3,218.39	14,579.31	0.10	78.00	0.80	624.00	80.00	0.20	0.00	156.00	0.20			
ESTRUCTURA															
TRABAJOS PRELIMINARES															
	m2	200.00	524.00	200.00	524.00	4,794.26	12,560.96	88.78	0.00	0.00	605.74	1,587.04			
	m2	50.00	226.50	50.00	226.50	3,268.39	14,805.81	98.49	0.00	0.00	50.00	226.50			
MOVIMIENTO DE TIERRAS															
	m3	1,098.31	6,523.96	0.00	0.00	1,098.31	6,523.96	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	m3	2,095.40	141,292.82	70.00	4,720.10	2,165.40	146,012.92	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	m3	185.40	8,076.02	0.00	0.00	185.40	8,076.02	97.60	0.00	0.00	4.56	198.64			
	m3	177.03	6,610.30	0.00	0.00	177.03	6,610.30	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	m3	140.00	5,233.57	10.00	373.40	150.16	5,606.97	93.76	0.00	0.00	10.00	373.40			

Segundo Michel Gonzales Cuñuri, Página 1
Representante Común
CONSORCIO LAGUNAS

Alfredo Ricardo Marmolejo Cuchó
ING. CIVIL

090248

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

LECCION LICITACION PUBLICA N° 06-2020-CSO GRL
CONSORCIO LAGUNAS

OBRA "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR 62056 DE VILLA LAGUNAS, DEL DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS, LORETO"

Region LORETO

Provincia ALTO AMAZONAS

SI. 3.872.652.12

Distrito LAGUNAS

SI. 0.00

01-Dic-20

SI. 0.00

180 Dias

T.U.A.L

PRESUPUESTO INTEGRAL

Fecha de Inicio de Obra

Plazo de Ejecucion

1ª Paralización

2ª Paralización

3ª Paralización

Fecha de Terminó de Obra Inicial

Fecha de Terminó Contratado

25-Jul-21

VALORIZACION MENSUAL N° 5

AL 31 DE MAYO DEL 2021

ING. EDUARDO PINCHI VASQUEZ

ING. ALFREDO RICARDO MARMOLEJO CUCHO

PRESUPUESTO	STO	UND	AVANCE DE OBRA						SALDO POR VALORIZAR		
			AVANCE ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		AVANCE ACUMULADO		Metrado	Valorizado	
			Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado			%
EXCAVACION DE ZANJA PARA CUNETAS	m3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.94	2,872.94
RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL	m3		209.78	209.78	22,098.23	0.00	209.78	22098.23	100.00	0.00	0.00
RELLENO CON MATERIAL DE CHACRA DE=0.10M	m3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.93	3,963.05
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3		1,676.58	1,666.81	36,515.97	0.00	1,676.58	36515.97	90.29	180.23	3,925.35
NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL	m2		2,049.01	2,049.01	8,216.53	0.00	2,849.01	11424.53	87.69	400.00	1,604.00
CAMA DE ARENA e=2", COMPACTADA	m2		2,555.13	2,555.13	33,318.90	0.00	2,555.13	33318.90	100.00	0.00	0.00
CAMA DE ARENA e=4", COMPACTADA	m2		264.59	264.59	4,902.85	0.00	534.59	9905.95	68.14	250.00	4,632.50
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE											
SOLADO ZAPATA H=4" f'c=100 Kg/Cm2	m2		157.04	3,288.42	0.00	0.00	157.04	3288.42	97.64	3.80	79.57
SOLADO PARA VIGA DE CIMENTACION H=4" f'c=100	m2		48.65	1,018.73	0.00	0.00	48.65	1018.73	100.00	0.00	0.00
SOLADO PARA MURO PERIMETRICO H=2" f'c=100	m2		69.12	825.98	0.00	0.00	69.12	825.98	100.00	0.00	0.00
CONCRETO f'c = 140 kg/cm2 EN CIMIENTOS	m3		113.56	55,591.03	5.00	2,447.65	118.56	58038.68	95.95	5.00	2,447.65
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS	m2		255.58	6,995.22	5.00	136.85	260.58	7132.07	94.22	16.00	437.92
CONCRETO f'c = 175 kg/cm2 EN SOBRECIMENTOS	m3		11.86	6,441.88	1.00	543.16	12.86	6985.04	92.78	1.00	543.16

CONSORCIO SUPERVISION LAGUNAS
ING. EDUARDO PINCHI VASQUEZ
CIP N° 65088

Segundo Michel Gonzalez Cucho
Representante Común
CONSORCIO LAGUNAS

Alfredo Ricardo Marmolejo Cucho
ING.-CIVIL
CIP. N° 41401

343
000347

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

ELECCIÓN LICITACION PÚBLICA N° 06-2020-CSO GRL
CONSORCIO LAGUNAS

OBRA

"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR 62056 DE VILLA LAGUNAS, DEL DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS, LORETO"

Region
LORETO
Provincia
ALTO AMAZONAS
Distrito
LAGUNAS

S/. 3,872,652.12

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 3,872,652.12

Fecha de inicio de Obra

Plazo de Ejecución

1ª Paralización

2ª Paralización

3ª Paralización

Fecha de Término de Obra Inicial

Fecha de Término Contractual

01-Dic-20

180 Días

25-Jul-21

PRESUPUESTO INTEGRAL

VALORIZACION MENSUAL N° 5

AL 31 DE MAYO DEL 2021

ING. EDUARDO PINCHI VASQUEZ
ING. ALFREDO RICARDO MARMOLEJO CUCHO

PRESUPUESTO UNO	AVANCE DE OBRA									
	AVANCE ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		AVANCE ACUMULADO		SALDO POR VALORIZAR			
	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	%	Metrado	Valorizado	
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CONCRETO Fc = 140 kg/cm2 EN FALSO PISO	m2	169.67	4,643.87	5.00	136.85	174.67	4780.72	97.22	5.00	136.85
CONCRETO Fc = 175 kg/cm2 EN LOSA DEPORTIVA Y ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA	m3	910.82	42,526.19	220.00	10,271.80	1,130.82	52,797.99	93.39	80.00	3,735.20
OBRAS DE CONCRETO ARMADO ZAPATAS	m2	230.05	124,953.96	0.00	0.00	230.05	124,953.96	100.00	0.00	0.00
CONCRETO Fc = 210 kg/cm2 EN ZAPATAS	m3	62.82	37,881.09	1.56	940.70	64.38	38,821.78	95.55	3.00	1,809.03
ACERO CORRUGADO DE Ø 1/2" y=4200 kg/cm2 VIGA DE CIMENTACION	kg	1,509.94	8,667.06	14.23	81.68	1,524.17	8748.74	98.70	20.00	114.80
CONCRETO Fc = 210 kg/cm2 EN VIGAS DE ACERO CORRUGADO DE Ø 1/2" y=4200 kg/cm2	m3	28.51	17,191.82	0.00	0.00	28.51	17,191.82	100.00	0.00	0.00
ACERO CORRUGADO DE Ø 3/8" y=4200 kg/cm2 COLUMNAS	kg	1,475.67	8,470.35	0.00	0.00	1,475.67	8,470.35	100.00	0.00	0.00
CONCRETO Fc = 210 kg/cm2 EN COLUMNAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m3	36.12	21,780.72	0.00	0.00	36.12	21,780.72	97.83	0.80	482.41
ACERO CORRUGADO DE Ø 1/2" y=4200 kg/cm2	m2	502.21	13,745.49	0.00	0.00	502.21	13,745.49	98.05	10.00	273.70
ACERO CORRUGADO DE Ø 3/8" y=4200 kg/cm2	kg	3,009.70	17,275.68	0.00	0.00	3,009.70	17,275.68	99.34	20.00	114.80
COLUMNETAS	kg	2,150.62	10,430.51	0.00	0.00	2,150.62	10,430.51	100.00	0.00	0.00
CONCRETO Fc = 175 kg/cm2 EN COLUMNETAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN	m3	15.10	8,201.72	3.50	1,901.06	18.60	10,102.78	84.16	3.50	1,901.06
ACERO CORRUGADO DE Ø 1/2" y=4200 kg/cm2	m2	174.93	3,984.91	76.00	1,708.50	249.93	5,693.41	76.92	75.00	1,708.50
ACERO CORRUGADO DE Ø 3/8" y=4200 kg/cm2	kg	782.12	4,489.37	350.00	2,009.00	1,132.12	6,498.37	73.89	400.00	2,286.00
ACERO CORRUGADO DE Ø 1/4" y=4200 kg/cm2 PANTALLAS Y SOBRECIMENTOS ARMADOS	kg	1,152.12	5,587.78	100.00	485.00	1,252.12	6,072.78	92.60	100.00	485.00
CONCRETO Fc = 175 kg/cm2 EN SOBRECIMIENTO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN	m3	270.30	1,173.10	0.00	0.00	270.30	1,173.10	100.00	0.00	0.00
ACERO CORRUGADO DE Ø 1/2" y=4200 kg/cm2	m2	52.41	28,467.02	1.00	543.16	53.41	29,010.18	96.39	2.00	1,086.32
ACERO CORRUGADO DE Ø 3/8" y=4200 kg/cm2	kg	896.53	24,538.03	4.00	109.48	900.53	24,647.51	99.12	8.00	218.96
ACERO CORRUGADO DE Ø 1/4" y=4200 kg/cm2 VIGAS	kg	791.21	4,541.55	0.00	0.00	791.21	4,541.55	100.00	0.00	0.00
CONCRETO Fc = 210 kg/cm2 EN VIGAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS	m3	2,887.26	14,003.21	60.00	242.50	2,937.26	14,245.71	96.71	100.00	485.00
	m2	21.84	13,169.74	1.00	603.01	22.84	13,772.75	91.95	2.00	1,206.02
	kg	212.62	6,146.84	20.00	578.20	232.62	6,725.04	88.58	30.00	867.30

Segundo Michel Gonzales Cujqui
Representante Común
CONSORCIO LAGUNAS

Alfredo Ricardo Marmolejo Cuzco
Alfredo Ricardo Marmolejo Cuzco

342
000346

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

ELECCIÓN LICITACION PUBLICA N° 06-2020-CSO GRL OBRA "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR 62056 DE VILLA LAGUNAS, DEL DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS, LORETO" Region Loreto, Provincia Alto Amazonas, Distrito Lagunas

SI. 3,872,652.12

SI. 0.00

SI. 0.00

SI. 3,872,652.12

Fecha de inicio de Obra 01-Dic-20

Plazo de Ejecucion 180 Dias

1° Paralización

2° Paralización

3° Paralización

Fecha de Terminó de Obra Inicial

Fecha de Terminó Contractual

25-Jul-21

PRESUPUESTO INTEGRAL

**VALORIZACION MENSUAL N° 5
AL 31 DE MAYO DEL 2021**

ING. EDUARDO PINCHI VASQUEZ
ING. ALFREDO RICARDO MARMOLEJO CUCHO

PRESUPUESTO	UNID	AVANCE ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		AVANCE ACUMULADO		SALDO POR VALORIZAR		
		Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	
3	kg	2,033.21	11,670.63	75.00	430.50	12101.13	94.40	125.00	717.50	
4	kg	1,582.47	7,674.98	75.00	363.75	8038.73	92.99	125.00	606.25	
LOSA MACIZA										
1	m3	2.00	1,206.02	0.00	0.00	1,206.02	41.24	2.85	1,718.59	
2	m2	10.10	291.99	0.00	0.00	291.99	77.99	2.85	82.39	
3	kg	130.30	631.96	0.00	0.00	631.96	48.44	138.71	672.74	
VIGAS Y DINTELES										
1	m3	17.12	9,298.90	0.00	0.00	9,298.90	100.00	0.00	0.00	
2	m2	244.19	6,011.96	0.00	0.00	6,011.96	100.00	0.00	0.00	
3	kg	777.03	4,460.15	0.00	0.00	4,460.15	100.00	0.00	0.00	
4	kg	1,048.54	5,085.42	0.00	0.00	5,085.42	100.00	0.00	0.00	
5	kg	76.50	332.01	0.00	0.00	332.01	100.00	0.00	0.00	
MESAS DE CONCRETO										
1	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	711.54	

CONSORCIO SUPERVISOR LAGUNAS
ING. Eduardo Pinchi Vasquez
Jefe Supervisor
CIP N° 55668

Segundo Michel Gohzáles Cujqui
Representante Común
CONSORCIO LAGUNAS

Alfredo Ricardo Marmolejo Cucho
ING-CIVIL
CIP N° 81401

341
800345

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

LECCIÓN LICITACION PUBLICA N° 06-2020-CSO GRL
CONSORCIO LAGUNAS

OBRA

"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
DE EDUCACION BASICA REGULAR 62056 DE VILLA LAGUNAS, DEL DISTRITO DE LAGUNAS,
ALTO AMAZONAS, LORETO"

LORETO

ALTO AMAZONAS

LAGUNAS

SI. 3,872,652.12

SI. 0.00

SI. 0.00

SI. 3,872,652.12

PRESUPUESTO INTEGRAL

Fecha de Inicio de Obra 01-Dic-20

Plazo de Ejecucion 180 Dias

1° Paralización

2° Paralización

3° Paralización

25-Jul-21

VALORIZACION MENSUAL N° 5

AL 31 DE MAYO DEL 2021

ING. EDUARDO PINCHI VASQUEZ

ING. ALFREDO RICARDO MARMOLEJO CUCHO

PRESUPUESTO	UNID	AVANCE DE OBRA						SALDO POR VALORIZAR	
		AVANCE ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		AVANCE ACUMULADO		Metrado	Valorizado
		Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado		
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MESAS DE	m ²	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.62	719.22
ACERO CORRUGADO DE Ø 3/8" Y=4200 kg/cm ²	kg	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.30	525.28
CUNETAS									
CONCRETO f _c = 175 kg/cm ² EN CUNETAS	m ³	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.75	37,342.25
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS	m ²	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788.60	27,845.47
ACERO CORRUGADO DE Ø 3/8" Y=4200 kg/cm ²	kg	0.00	0.00	1,839.93	8,923.66	1,839.93	8,923.66	2,000.00	9,700.00
TAPA DE CONCRETO ARMADO	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.00	18,889.18
GRADERIA									
CONCRETO f _c = 175 kg/cm ² EN GRADERIA	m ³	4.95	2,688.64	0.00	0.00	4.95	2,688.64	0.00	0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN GRADERIA	m ²	103.95	2,845.11	0.00	0.00	103.95	2,845.11	0.00	0.00
ACERO CORRUGADO DE Ø 3/8" Y=4200 kg/cm ²	kg	611.47	2,965.63	0.00	0.00	611.47	2,965.63	0.00	0.00
ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA									
TIJERAL DE MADERA TORNILLO	p ²	4,159.83	38,561.62	120.00	1,112.40	4,279.83	39,674.02	0.00	0.00
CORREA DE MADERA 2" X 4"	m	1,887.04	16,738.04	180.74	1,603.16	2,067.78	18,341.21	0.00	0.00
ARRIOSTRES LONGITUDINALES ENTRE TIJERALES	m	241.72	4,072.98	18.60	313.41	260.32	4,386.39	0.00	0.00
COBERTURA CON PLANCHA DE POLIPROPILENO	m ²	1,191.27	109,680.23	395.00	36,367.65	1,586.27	146,047.88	0.00	0.00
FRISOS CON POLIPROPILENO	m	0.00	0.00	84.86	2,803.77	84.86	2,803.77	200.00	6,608.00
CUMBRERA CO POLIPROPILENO	m	101.40	7,571.54	30.00	2,240.10	131.40	9,811.64	0.00	0.00
ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA									
TIJERAL METALICO TM -01 (L=4.55 M)	pza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	4,290.44
CORREA METALICAS	pza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.51	14,115.82
ANCLAJE PARA TIJERALES METALICO	pza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	3,060.00
COBERTURA CON PLANCHA DE POLIPROPILENO	m ²	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.08	10,048.22
ARQUITECTURA									
MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA									
MURO DE LADRILLO TUBULAR APAREJO DE SOGA	m ²	1,155.14	91,070.84	70.00	5,518.80	1,225.14	96,589.64	60.00	4,730.01
CERCO DE MADERA L=184.23 m. H=2.80 m	m ²	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.84	33,854.58
REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS									
TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO EN	m ²	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.01	3,376.90
TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS EXTE./INTE	m ²	1,565.83	43,608.37	755.22	21,032.88	2,321.05	64,641.24	600.00	16,710.00
TARRAJEO FROTACHADO EN SARDINELES Y	m ²	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.25	1,650.11

Segundo Michel González Cutqui
Representante Común Página 5
CONSORCIO LAGUNAS

Alfredo Ricardo Marmolejo Cutqui
ING. CIVIL

SELECCIÓN LICITACION PUBLICA Nº 06-2020-CSO GRL
CONSORCIO LAGUNAS

OBRA

"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR 62056 DE VILLA LAGUNAS, DEL DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS, LORETO"

Region LORETO

Provincia ALTO AMAZONAS

SI. 3,872,652.12

Distrito LAGUNAS

SI. 0.00

01-Dic-20

SI. 0.00

180 Días

SI. 3,872,652.12

1ª Paralización

2ª Paralización

3ª Paralización

Fecha de Inicio de Obra

Plazo de Ejecución

Fecha de Término de Obra Inicial

25-Jul-21

ING. EDUARDO PINCHI VASQUEZ

Fecha de Término Contractual

VALORIZACION MENSUAL Nº 5

AL 31 DE MAYO DEL 2021

PRESUPUESTO	STO	UND	AVANCE DE OBRA						SALDO POR VALORIZAR			
			AVANCE ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		AVANCE ACUMULADO		Metrado	Valorizado		
			Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado			Metrado	Valorizado
TARRAJEO FROTACHADO EN COLUMNAS	m2	251.63	7,007.90	5,281.50	190.00	5,281.50	441.63	12299.40	83.07	83.07	90.00	2,506.50
TARRAJEO FROTACHADO EN VIGAS	m2	185.19	5,916.82	6,390.00	200.00	6,390.00	385.19	12306.82	81.06	81.06	90.00	2,875.50
REVESTIMIENTO DE GRADAS C/A 1.5 e= 1.5 cm	m2	103.95	2,895.01	0.00	0.00	0.00	103.95	2895.01	100.00	100.00	0.00	0.00
TARRAJEO PULIDO EN CUNETAS	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731.35	22,408.56
VESTIDURA DE DERRAMES c-a = 1:5 e = 1.5cm	m2	354.44	4,618.35	2,345.40	180.00	2,345.40	534.44	6963.75	75.87	75.87	170.00	2,215.10
CONFECCION DE PIZARRA DE MORTERO	m2	40.40	2,350.07	1,745.10	30.00	1,745.10	70.40	4095.17	63.77	63.77	40.00	2,326.80
BRUÑAS	m	645.00	2,334.90	524.00	144.76	524.00	789.75	2858.90	41.79	41.79	1,100.00	3,982.00
CIELORRASOS												
CIELORASO DE PLANCHA DE SUPERBOARD	m2	0.00	0.00	54,010.82	796.15	54,010.82	796.15	54010.82	57.02	57.02	600.00	40,704.00
CIELORASO CON MEZCLA DE CEMENTO - ARENA	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.13	1,389.40
PISOS Y PAVIMENTOS												
CONTRAPIOSOS DE 35MM. MEZCLA 1:5 BASE 3cm	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.67	17,185.76
PISO DE CERAMICA 0.30 X 0.30 ANTIDESLIZANTE	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.21	2,936.61


 Segundo Michel Gonzalez Quiqui
 Representante Comunal
 CONSORCIO LAGUNAS


 Alfredo Ricardo Marmolejo Cacho
 ING. CIVIL
 CIP. N° 81301


 CONSORCIO SUPERVISION LAGUNAS
 Ing. Eduardo Pinchi Vasquez
 Jefe Supervisor
 CIP N° 55688

339
000343

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

LECCIÓN: LICITACION PUBLICA Nº 06-2020-C-SO GRL
 CONSORCIO LAGUNAS

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR 62056 DE VILLA LAGUNAS, DEL DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS, LORETO"

Region: LORETO
 Provincia: ALTO AMAZONAS
 Distrito: LAGUNAS

S/. 3,872,652.12

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 3,872,652.12

Fecha de Inicio de Obra: 01-Dic-20
 Plazo de Ejecución: 180 Días

1ª Paralización

2ª Paralización

3ª Paralización

Fecha de Término de Obra Inicial: 25-Jul-21

Fecha de Término Contractual

PRESUPUESTO INTEGRAL


VALORIZACION MENSUAL Nº 5

AL 31 DE MAYO DEL 2021

ING. EDUARDO PINCHI VASQUEZ

ING. ALFREDO RICARDO MARMOLEJO CUCHO

PRESUPUESTO	STO	DESCRIPCION	AVANCE ANTERIOR				AVANCE ACTUAL				AVANCE ACUMULADO				SALDO POR VALORIZAR	
			Metrado		Valorizado		Metrado		Valorizado		Metrado		Valorizado		Metrado	Valorizado
	UND	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	700.00	
	UND	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	7,000.00	
	m	BARANDA DE TUBO FIERRO GALVANIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.50	1,743.89	
	m	ESCALERA DE GATO - TANQUE ELEVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	3,200.80	
	m	POSTE DE TUBO DE FIERRO PARA LUMINARIA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	446.08	
	UND	MASTIL DE F°G° PIBANDERA DE 9.00 M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	586.75	
	UND	MASTIL DE F°G° PIBANDERA DE 7.00 M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1,053.50	
		CERRAJERIA														
	par	BISAGRA ALUMINIZADA 3 1/2" x 3 1/2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.00	1,606.54	
	pza	CERRADURA PARA PUERTAS DE DOS GOLPES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	2,908.08	
	pza	CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	1,599.57	
	UND	CERROJO DE 3" ALUMINIZADO PARA PUERTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	1,483.11	
		PINTURA														
	m2	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936.78	35,055.72	
	m2	PINTURA ESMALTE EN MURO PERIMETRICO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326.42	24,684.68	


CONSORCIO SUPERVISOR LAGUNAS
 Ing. Edgardo Pinchi Vásquez
 Jefe Supervisor
 CIP N° 56669


Segundo Michel Fontales Carique
 Representante Común
 CONSORCIO LAGUNAS


Alfredo Ricardo Marmolejo Cucho
 (ING. CIVIL)
 CIP N° 43401

337
000341

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

LECCIÓN LICITACION PUBLICA Nº 06-2020-C50 GRL
CONSORCIO LAGUNAS

OBRA

"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR 62056 DE VILLA LAGUNAS, DEL DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS, LORETO"

Region
Provincia

LORETO
ALTO AMAZONAS

SI. 3,872,652.12

SI. 0.00

SI. 0.00

SI. 3,872,652.12

Fecha de Inicio de Obra

01-Dic-20

Plazo de Ejecución

180 Días

1ª Paralización

2ª Paralización

3ª Paralización

Fecha de Término de Obra Inicial

25-Jul-21

Fecha de Término Contractual

PRESUPUESTO INTEGRAL

VALORIZACION MENSUAL Nº 5

AL 31 DE MAYO DEL 2021

PRESUPUESTO STO UND	DESCRIPCION	AVANCE ANTERIOR				AVANCE ACTUAL				AVANCE ACUMULADO				SALDO POR VALORIZAR				
		Metrado		Valorizado		Metrado		Valorizado		Metrado		Valorizado		Metrado		Valorizado		
	PINTURA LATEX EN SUPERBOARD	m2	0.00	0.00	701.23	12,692.26	701.23	12,692.26	12692.26	50.04	700.00	12,670.00						
	PINTURA LATEX EN CIELORASO DE CEMENTO	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.53	2,362.59						
	PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS (2 Manos)	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.61	11,233.04						
	PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALOS h=0.30	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997.58	7,441.95						
	PINTURA EN PUERTAS DE MADERA C/BARNIZ 02	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.75	1,020.31						
	PINTURA ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.26	5,783.65						
	PINTURA CON ESMALTE ANTICORROSIVO EN	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.27	679.43						
	PINTURA DE TRAFICO COLOR AZUL	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	1,365.76						
	PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	558.72						
	PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.50	904.04						
	VIARIOS																	
	SIEMBRA DE PLANTONES INCLUYE TAPADO DE	und	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	1,578.60						
	SIEMBRA DE GRASS	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391.89	10,083.33						
	LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA	qib	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,045.49						
	EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	qib	0.22	55,092.00	0.22	49,526.80	0.22	49,526.80	42.25	0.58	143,015.20							
	SEÑALIZACIONES DE SEGURIDAD Y	qib	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	525.60						
	PLACA RECORDATORIA	und	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	440.43						
	INSTALACIONES SANITARIAS																	
	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS																	
	INODORO TANQUE BAJO CON ACCESORIOS	pza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	3,246.54						
	LAVATORIO DE LOSA TIPO OVALIN 1 LLAVE	pza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	2,651.44						
	LAVATORIO DE PEDESTAL BLANCO	pza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	3,059.25						
	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA	pza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	538.48						
	PAPELERA DE LOSA BLANCA DE 0.15 X .015 M	pza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	448.91						
	URINARIO DE LOSA DE PICO COLOR BLANCO	pza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	552.12						
	DUCHA CROMADA Y LLAVE INCL. ACCESORIOS	und	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	380.30						
	TOALLERA DE PLASTICO 24" DE COLOR	pza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	227.60						
	JABONERA DE LOSA BLANCA SIMPLE DE 0.15 X	pza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	177.60						
	BARRAS PARA CORTINA	pza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	223.10						
	APOYABRAZOS PARA DISCAPACITADOS	pza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	521.16						
	SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION																	

Segundo Michel Gonzales Cuiti
Representante Común
CONSORCIO LAGUNAS

Alfredo Ricardo Marmolejo Cuchó
ING. CIVIL
CIP. N° 43401

000340
236

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

LECCIÓN LICITACION PUBLICA Nº 06-2020-CO SO GRL
CONSORCIO LAGUNAS

"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR 62056 DE VILLA LAGUNAS, DEL DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS, LORETO"

OBRA OBRERA
SI. 3,872,652.12

REGION Loreto
PROVINCIA Alto Amazonas
DISTRITO LAGUNAS

Fecha de Inicio de Obra 01-Dic-20
Plazo de Ejecución 180 Días

PRESUPUESTO INTEGRAL

FUJAL SI. 3,872,652.12

25-Jul-21

VALORIZACION MENSUAL N° 5

ING. EDUARDO PINCHI VASQUEZ
ING. ALFREDO RICARDO MARMOLEJO CUCHO

AL 31 DE MAYO DEL 2021

PRESUPUESTO	STO	DESCRIPCION	AVANCE DE OBRA						SALDO POR VALORIZAR				
			AVANCE ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		AVANCE ACUMULADO		Metrado	Valorizado			
			Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado			%		
UND													
	m3	EXCAVACION DE ZANJAS DE TERRENO NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.55	1,467.21		
	m	RED DE DISTRIBUCION DE TUBERIAS PVC SAL DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	496.05		
	m	RED DE DISTRIBUCION DE TUBERIAS PVC SAL DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	3,880.80		
	m	RED DE DISTRIBUCION DE TUBERIAS PVC SAL DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	1,315.20		
	plo	SALIDA DE VENTILACION PVC SAL 2"	2.00	146.90	0.00	0.00	2.00	146.90	50.00	2.00	146.90		
	plo	SALIDA PARA DESAGUE PVC-SAL 2"	1.00	56.03	0.00	0.00	1.00	56.03	6.67	14.00	784.42		
	plo	SALIDA PARA DESAGUE PVC-SAL 4"	1.00	65.31	0.00	0.00	1.00	65.31	16.67	5.00	326.55		
	pza	SUMIDERO CON TRAMPA DE 2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	315.30		
	pza	REGISTRO DE BRONCE CROMADO DE 4"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	128.48		
	pza	CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24"	2.00	419.60	0.00	0.00	2.00	419.60	20.00	8.00	1,678.40		
	pza	CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 24" X 24"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	507.76		
		SISTEMA DE AGUA FRIA											
		RED DE DISTRIBUCION											
	plo	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC - SAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.06		
	m	RED DE DISTRIBUCION DE TUBERIA 1/2" PVC-SAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	1,907.10		

CONSORCIO SUPERVISOR LAGUNAS
ING. EDUARDO PINCHI VASQUEZ
Jefe Supervisor
CIP- N° 65609

Segundo Michel Gonzales Colqui
Representante Común
CONSORCIO LAGUNAS

Alfredo Ricardo Marmolejo Cuzco
Jefe Civil
CIP- N° 01401

335
000333

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

LECCIÓN: LICITACION PUBLICA Nº 06-2020-C50 GRL
CONSORCIO LAGUNAS

OBRA

"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR 62056 DE VILLA LAGUNAS, DEL DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS, LORETO"

LORETO

Provincia

ALTO AMAZONAS

SI. 3,872,652.12

DISTRITO

LAGUNAS

SI. 0.00

Fecha de Inicio de Obra

01-Dic-20

SI. 0.00

Plazo de Ejecución

180 Días

SI. 3,872,652.12

1ª Paralización

2ª Paralización

3ª Paralización

Fecha de Término de Obra Inicial

25-Jul-21

Fecha de Término Contractual

PRESUPUESTO INTEGRAL

VALORIZACION MENSUAL Nº 5

AL 31 DE MAYO DEL 2021

ING. EDUARDO PINCHI VASQUEZ

ING. ALFREDO RICARDO MARMOLEJO CUCHO

PRESUPUESTO	STO	DESCRIPCION	AVANCE DE OBRA						SALDO POR VALORIZAR		
			AVANCE ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		AVANCE ACUMULADO		Metrado	Valorizado	
			Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado			%
UND		RED DE DISTRIBUCION DE TUBERIA 3/4" PVC-SAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	1,431.40	0.00
m		RED DE DISTRIBUCION DE TUBERIA 1" PVC-SAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	1,929.40	0.00
und		COLOCACION Y SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	267.20	0.00
und		CODO PVC SAP DE 1/2" X 90°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	70.64	0.00
und		CODO PVC SAP 3/4" X 90°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	55.98	0.00
und		CODO PVC SAL 1" X 90°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	168.20	0.00
und		TEE PVC SAP 1/2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	56.46	0.00
und		TEE PVC SAP 3/4" X 1/2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	59.46	0.00
und		TEE PVC SAP 1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	140.56	0.00
und		REDUCCION PVC DE 1" A 3/4"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	319.85	0.00
und		VALVULAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.62	8,951.10	0.00
und		VALVULA COMPUERTA CON UNION UNIVERSAL DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	4,670.00	21.06
und		SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	2,580.48	0.00
m		CANALETA COLECTORA DE AGUA PLUVIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	373.40	0.00
m		MONTANTE DE 4" BAJADA DE AGUAS PLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	1,811.50	0.00
und		PROTECTOR DE MONTANTE DE AGUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1,015.52	0.00
m3		EXCAVACION DE ZANJAS DE TERRENO NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	0.00
m		RED DE DISTRIBUCION DE TUBERIAS PVC SAL DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00
pza		CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 24" X 24"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	0.00
		POZO PERFORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	662.58	0.00
		ESTUDIO Y TRABAJOS PRELIMINARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	7,985.30	0.00
glb		ESTUDIO DE PROSPECCION PARA POZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	3,753.30	0.00
und		ESTUDIO BACTERIOLOGICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	1,035.30	0.00
glb		TRASLADO PERSONAL ESPECIALIZADO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	103.46	0.00
glb		TRABAJOS DE PERFORACION Y ENTUBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	544.05	0.00
glb		MONTAJE Y DESMONTAJE DE CASTILLO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
m		PERFORACION DE POZO CON EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
m		ENTUBADO CON TUBO PVC SAP DE 6" CLASE 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
m		ENTUBADO CON TUBO PVC SAP DE 6" CLASE 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
m		TUBERIA PVC SAP DE 1 1/4" CLASE 10 AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
m		FILTRO DE GRAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

334
000338


 Ing. Eduardo Pinchi Vasquez
 Director Supervisor
 Dpto. N. 05009


 Alfredo Ricardo Marmolejo Cucho
 INSC-0176

G O B I E R N O R E G I O N A L D E L O R E T O

ELECCIÓN LICITACION PUBLICA N° 06-2020-CSO GRL OBRERA "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA REGION LORETO
 CONSORCIO LAGUNAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 62056 DE VILLA LAGUNAS, DEL DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS, LORETO
 ALTO AMAZONAS, LORETO"
 Provincia ALTO AMAZONAS
 Distrito LAGUNAS

Fecha de Inicio de Obra 01-Dic-20
 Plazo de Ejecución 180 Días

1ª Paralización
 2ª Paralización
 3ª Paralización

25-Jul-21

PRESUPUESTO INTEGRAL

VALORIZACION MENSUAL N° 5
 AL 31 DE MAYO DEL 2021

ING. EDUARDO PINCHI VASQUEZ
 ING. ALFREDO RICARDO MARMOLEJO CUCHO

PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	AVANCE DE OBRA						SALDO POR VALORIZAR		
			AVANCE ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		AVANCE ACUMULADO		Metrado	Valorizado	
			Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado			%
UND		SISTEMA DE TRATAMIENTO DE FILTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100,246.21	0.00
glb		PRUEBA DE RENDIMIENTO + DESINFECCION DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	351.31	0.00
m		TUBERIA DE IMPULSION PVC SAP DE 1" C-10 AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	430.50	0.00
und		CODO PVC SAP 1" X 90°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	81.84	0.00
und		VALVULA CHECK DE 1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	77.95	0.00
und		VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	78.21	0.00
und		BOMBA SUMERGIBLE DE 2 HP INCLUYE TANQUE ELEVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,355.78	0.00
m		TUBERIA DE ALIMENTACION PVC SAP 1"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	520.60	0.00
m		TUBERIA DE REBOSE DE 2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	173.70	0.00
und		TANQUE DE POLIPROPILENO DE 2.5 M3 CON INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,804.91	0.00
pto		SALIDAS SALIDA DE CENTRO DE LUZ (TECHO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00	7,351.16	0.00


 Alfredo Ricardo Marmolejo Cucha
 ING. CIVIL
 CIP. N° 81303


 Segundo Michel Gonzales Cuyqui
 Representante Común
 CONSORCIO LAGUNAS


 Ing. Eduardo Pinchi Vasquez
 Jefe Supervisor
 CIP. N° 65689

333
000337

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

ELECCIÓN LICITACION PUBLICA Nº 06-2020-CSO GRL
 CONSORCIO LAGUNAS

"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
 DE EDUCACION BASICA REGULAR 62056 DE VILLA LAGUNAS, DEL DISTRITO DE LAGUNAS,
 ALTO AMAZONAS, LORETO"

LORETO
 ALTO AMAZONAS
 LAGUNAS

OBRA
 SI. 3,872,652.12
 SI. 0.00
 SI. 0.00
 SI. 3,872,652.12

Fecha de inicio de Obra
 Plazo de Ejecucion
 1ª Paralización
 2ª Paralización
 3ª Paralización

01-Dic-20
 180 Días

PRESUPUESTO INTEGRAL

VALORIZACION MENSUAL Nº 5
AL 31 DE MAYO DEL 2021

25-Jul-21

PRESUPUESTO	STO	UND	AVANCE DE OBRA				AVANCE ACUMULADO		SALDO POR VALORIZAR			
			AVANCE ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		Valorizado	%	Metrado	Valorizado		
			Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado						
ING. EDUARDO PINCHI VASQUEZ												
ING. ALFREDO RICARDO MARMOLEJO CUCHO												
SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE	pto		23.00	1,548.13	0.00	0.00	1548.13	100.00	23.00	0.00	0.00	0.00
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE	pto		18.00	1,221.30	0.00	0.00	1221.30	100.00	18.00	0.00	0.00	0.00
SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE	pto		61.00	4,012.58	0.00	0.00	4012.58	100.00	61.00	0.00	0.00	0.00
SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE	pto		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALIDA PARA VENTILADORES DE TECHO	pto		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.42
SALIDA ESPECIAL PARA INTERRUPTOR DE	pto		15.00	1,017.75	0.00	0.00	1017.75	100.00	15.00	0.00	45.00	2,235.15
CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS												0.00
TUBERIA PVC SEL DE 3/4" SIN EMPOTRAR TECHO-	m		341.26	2,136.29	0.00	0.00	2136.29	53.22	341.26	0.00	300.00	1,878.00
TUBERIA PVC SEL DE 1" SIN EMPOTRAR PISO-	m		58.76	398.98	0.00	0.00	398.98	22.71	58.76	0.00	200.00	1,358.00
CAJA DE PASE SUBTERRANEO	und		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	70.52
CONDUCTORES Y/O CABLES												
CONDUCTOR DE CU. NYY/1KV DE 3-1X35 mm2 (INC. m			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	2,156.80
CONDUCTOR DE CU. NYY/1KV DE 1X35 mm2)	m		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	1,154.40
CONDUCTOR DE CU. NYY/1KV DE 4-1X16 mm2 (INC. m			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	6,968.50
CONDUCTOR DE CU. NYY/1KV DE 1X16mm2	m		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	403.20
CONDUCTOR DE CU. NYY/1KV DE 4-1X10 mm2 (INC. m			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00	5,506.29
CONDUCTOR DE CU. NYY/1KV DE 1X10mm2	m		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00	2,466.54
CONDUCTOR DE 4.0 mm2 THW/0.6 KV (N°12 AWG)	m		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.40	5,140.33
CONDUCTOR DE cu THW/0.6 KV DE 1x25mm2	m		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.03	5,605.75
TABLEROS Y CUCHILLAS												
TABLERO GENERAL MONOFASICO 220V-60HZ	und		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	987.43
TABLERO GENERADOR 220V-60HZ CFON BARRAS	und		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,072.86
TABLERO DE TRANSFERENCIA MANUAL/AUTOM.	und		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,646.80
TABLERO DE DISTRIBUCION 220V 60 HZ CON	und		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	6,991.44
TABLERO DE DISTRIBUCION 220V 60 HZ CON	und		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,087.86
ARTEFACTOS ELECTRICOS												
ARTEFACTO DE ALUMBRADO CON LAMPARA	pza		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	5,539.32
ARTEFACTO DE ALUMBRADO C/LAMPARA	pza		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	6,629.97
ARTEFACTO REFLECTOR HALOGENO METALICO	pza		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	770.32
ARTEFACTO DE ALUMBRADO C/LAMPARAS DE	und		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	1,992.30

000332
000336

CONSORCIO SUPERVISOR LAGUNAS
 Ing. Eduardo Pinchi Vasquez
 Jefe Supervisor
 C.P. N° 55689

Alfredo Ricardo Marmolejo Cucho
 ING. CIVIL
 C.P. N° 41613

Segundo Michel Gonzales Cujuri
 Representante Compañía 13
 CONSORCIO LAGUNAS

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

SELECCIÓN LICITACION PUBLICA Nº 06-2020-C50 GRL
CONSORCIO LAGUNAS

"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
DE EDUCACION BASICA REGULAR 62056 DE VILLA LAGUNAS, DEL DISTRITO DE LAGUNAS,
ALTO AMAZONAS, LORETO"

LORETO
ALTO AMAZONAS
LAGUNAS

SI. 3,872,652.12

SI. 0.00
SI. 0.00
SI. 3,872,652.12

Fecha de Inicio de Obra
Plazo de Ejecucion
1ª Paralización
2ª Paralización
3ª Paralización

01-Dic-20
180 Días

PRESUPUESTO INTEGRAL

VALORIZACION MENSUAL Nº 5

25-Jul-21

ING. EDUARDO PINCHI VASQUEZ
ING. ALFREDO RICARDO MARMOLEJO CUCHO

AL 31 DE MAYO DEL 2021

PRESUPUESTO	STO	DESCRIPCION	AVANCE ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		AVANCE ACUMULADO		SALDO POR VALORIZAR	
			Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado
	UND	VENTILADOR DE TECHO 3 ASPAS Inc. Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	16,708.50
	UND	POZO A TIERRA Y PARARRAYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3,014.04
	UND	POZO CONEXION A TIERRA PARA SISTEMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,079.25
	UND	PARARRAYO TIPO TETRAPUNTAL DE ACERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,187.16
	UND	EQUIPOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	61,768.96
	UND	MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA TRIFASICA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,212,924.28
	UND	GENERADOR ELECTRICO TRIFASICO DE 25KW.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	121,292.43
		TOTAL COSTO DIRECTO (A)		1,476,406.69		274,774.36		1,751,181.04		
		GASTOS GENERALES (B)		147,640.67		27,477.44		175,118.10		
		UTILIDAD (C)		195,872.22		36,453.82		232,326.04		
				1,819,919.58		338,705.62		2,158,625.18		1,495,133.19
		PLAN DE CONTINGENCIAS (D)		76,769.50		0.00		76,769.50		0.00
		OBRAS PRELIMINARES								
	TON	TRANSPORTE DE MATERIALES Y	5.42	813.00	0.00	0.00	5.42	813.00	1.00	0.00
	M2	PREPARACION DE TERRENO (CONTRUCCION, LAMPA Y CAJADETILLA)	303.37	794.83	0.00	0.00	303.37	794.83	100.00	0.00
	M2	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	303.37	1,374.27	0.00	0.00	303.37	1,374.27	100.00	0.00
	M3	MOVIMIENTO DE TIERRAS	2.38	44.43	0.00	0.00	2.38	44.43	100.00	0.00
	M3	CARGAVAGON PARA COLUMINA DE MADERA CON MATERIAL PROFUNO	1.52	28.64	0.00	0.00	1.52	28.64	100.00	0.00
	M3	SEMINAGRON DE DESMONTARAL COSTADO DE LA OBRA CON CAJADETILLA	0.86	8.02	0.00	0.00	0.86	8.02	100.00	0.00
		ESTRUCTURA DE MADERA								
	UND	COLUMNAS	38.00	3,841.04	0.00	0.00	38.00	3,841.04	100.00	0.00
	UND	COLUMINAS DE MADERA DE 2"x6" VIGAS	124.24	4,158.31	0.00	0.00	124.24	4,158.31	100.00	0.00
	UND	TABIQUERIA DE MADERA CONSORCIO SUPERVISOR LAGUNAS								

Segundo-Mithel-Gonzales (Firma)
Representante Común
CONSORCIO LAGUNAS Página 14

Alfredo Ricardo Marmolejo Cuzco
ING. CIVIL
CIP. N° 41401

Ing. Eduardo Pinchi Vasquez
JEFE SUPERVISOR
CIP. N° 559689

000335

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

ELECCIÓN LICITACION PUBLICA Nº 06-2020-CSO GRL
CONSORCIO LAGUNAS

OBRA

"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR 62056 DE VILLA LAGUNAS, DEL DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS, LORETO"
Region Loreto
Provincia Alto Amazonas
Distrito Lagunas

SI. 3,872,652.12
SI. 0.00
SI. 0.00
SI. 3,872,652.12

Fecha de Inicio de Obra 01-Dic-20
Plazo de Ejecución 180 Días
1* Paralización
2* Paralización
3* Paralización

PRESUPUESTO INTEGRAL

ING. EDUARDO PINCHI VASQUEZ
ING. ALFREDO RICARDO MARMOLLEJO CUCHO


VALORIZACION MENSUAL Nº 5


25-Jul-21

AL 31 DE MAYO DEL 2021

PRESUPUESTO	STO	UND	AVANCE DE OBRA						SALDO POR VALORIZAR		
			AVANCE ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		AVANCE ACUMULADO		Metrado	Valorizado	
			Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado			%
	M		570.34	3,804.17	0.00	0.00	570.34	3804.17	100.00	0.00	0.00
	M2		698.72	7,623.04	0.00	0.00	698.72	7623.04	100.00	0.00	0.00
	UND		10.00	5,467.30	0.00	0.00	10.00	5467.30	100.00	0.00	0.00
	M		428.82	4,391.12	0.00	0.00	428.82	4391.12	100.00	0.00	0.00
	M2		352.69	10,249.17	0.00	0.00	352.69	10249.17	100.00	0.00	0.00
	M		30.63	285.17	0.00	0.00	30.63	285.17	100.00	0.00	0.00
	M2		278.29	7,204.93	0.00	0.00	278.29	7204.93	100.00	0.00	0.00
	M2		25.08	649.32	0.00	0.00	25.08	649.32	100.00	0.00	0.00
	M2		25.08	203.40	0.00	0.00	25.08	203.40	100.00	0.00	0.00
	M2		13.61	302.69	0.00	0.00	13.61	302.69	100.00	0.00	0.00
	UND		3.00	1,431.39	0.00	0.00	3.00	1431.39	100.00	0.00	0.00


 CONSORCIO SUPERVISION LAGUNAS
 Ing. Eduardo Pinchi Vasquez
 Jefe Supervisor
 CIP N. 35589


 Segundo Michel Gonzalez Curqui
 Representante Común
 CONSORCIO LAGUNAS


 Alfredo Ricardo Marmollejo Cuzco
 IMG. CIVIL
 CIP. N. 41601

330
000334

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

LECCIÓN LICITACION PUBLICA N° 06-2020-C50 GRL
CONSORCIO LAGUNAS

OBRA

"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR 62056 DE VILLA LAGUNAS, DEL DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS, LORETO"

Region LORETO

Provincia ALTO AMAZONAS

Distrito LAGUNAS

SI. 3,872,652.12

SI. 0.00

SI. 0.00

SI. 3,872,652.12

Fecha de inicio de Obra

01-Dic-20

Plazo de Ejecucion

180 Dias

1ª Paralización

2ª Paralización

3ª Paralización

Fecha de Terminación de Obra Inicial

25-Jul-21

Fecha de Terminación Contractual

PRESUPUESTO INTEGRAL

VALORIZACION MENSUAL N° 5

AL 31 DE MAYO DEL 2021

ING. EDUARDO PINCHI VASQUEZ

ING. ALFREDO RICARDO MARMOLEJO CUCHO

STO	PRESUPUESTO	AVANCE DE OBRA						SALDO POR VALORIZAR		
		AVANCE ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		AVANCE ACUMULADO		Metrado	Valorizado	
		Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado			%
UND		4.00	1,646.84	0.00	0.00	4.00	1646.84	100.00	0.00	0.00
UND	PUERTA CONTRAFALCADA F-2 UNA	2.00	723.42	0.00	0.00	2.00	723.42	100.00	0.00	0.00
UND	PUERTA CONTRAFALCADA F-3 UNA	1.00	364.27	0.00	0.00	1.00	364.27	100.00	0.00	0.00
UND	PUERTA CONTRAFALCADA F-4 UNA	1.00	86.28	0.00	0.00	1.00	86.28	100.00	0.00	0.00
UND	VENTANA V-1 (0.00 U.0000); MATEO DE	37.00	3,337.03	0.00	0.00	37.00	3337.03	100.00	0.00	0.00
UND	VENTANA V-2 (1.00 U.0000); MATEO DE									
UND	VENTANA V-3 (1.00 U.0000); MATEO DE									
UND	VENTANA V-4 (1.00 U.0000); MATEO DE									
UND	CERRAJERIA	8.00	598.88	0.00	0.00	8.00	598.88	100.00	0.00	0.00
UND	CERRAJERIA TIPO EFULOGA	2.00	16.34	0.00	0.00	2.00	16.34	100.00	0.00	0.00
UND	CERRAJERIA DE Z ALUMINIZADO PARA	20.00	135.60	0.00	0.00	20.00	135.60	100.00	0.00	0.00
UND	BISAGRA DE PUNTA DE Z 1/2									
UND	ALUMINIZADO									
	INSTALACIONES SANITARIAS									
	MOVIMIENTO DE TIERRA									
M3	CAVACION DE ZANJA PARA TENDIDO	1.98	25.88	0.00	0.00	1.98	25.88	100.00	0.00	0.00
M3	DE ZANJA PARA TENDIDO	0.28	3.66	0.00	0.00	0.28	3.66	100.00	0.00	0.00
M3	RELENTOS CON MATERIA	1.49	28.07	0.00	0.00	1.49	28.07	100.00	0.00	0.00
M2	SELECCIONADO	5.70	187.76	0.00	0.00	5.70	187.76	100.00	0.00	0.00
M3	CAMA DE ARENA E=0.10M	1.34	12.50	0.00	0.00	1.34	12.50	100.00	0.00	0.00
M3	ELIMINACION DE DESMONTAL									
M3	COSTADO DE LA OBRA CON CADETILLA									
UND	OBRA DE REGISTRO Y METRADO DE OBRA	1.00	169.92	0.00	0.00	1.00	169.92	100.00	0.00	0.00
UND	REGISTRO DE OBRA DE REGISTRO Y METRADO									
PTO	SISTEMA DE DESAGUE									
PTO	SALIDA DE DESAGUE DIAM. 4" PVC SAL.	3.00	146.46	0.00	0.00	3.00	146.46	100.00	0.00	0.00
PTO	SALIDA DE DESAGUE PVC SAL DIAM. 2"	3.00	107.67	0.00	0.00	3.00	107.67	100.00	0.00	0.00
PTO	SALIDA DE VENTILACION PVC SAL DIAM. 2"	1.00	43.06	0.00	0.00	1.00	43.06	100.00	0.00	0.00
M	REDES DE DISTRIBUCION DE DESAGUE									
M	RED DE DESAGUE PVC SAL DE 4"	12.00	112.44	0.00	0.00	12.00	112.44	100.00	0.00	0.00
M	RED DE DESAGUE PVC SAL DE 2"	5.00	43.60	0.00	0.00	5.00	43.60	100.00	0.00	0.00
UND	ADITAMIENTO VARIOS									
UND	REGISTRO DE OBRA DE REGISTRO Y METRADO	1.00	20.04	0.00	0.00	1.00	20.04	100.00	0.00	0.00
UND	V. COLOCADO									

0003333

Alfredo Ricardo Marmolejo Cuzco
ING. CIVIL
CIP. N° 41401

Segundo Michel Gonzales Cpiqui
Representante Común
CONSORCIO LAGUNAS

Ing. Eduardo Pinchi Vasquez
Jefe Supervisor
CONSORCIO LAGUNAS

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

LECCIÓN: LICITACION PUBLICA Nº 06-2020-C50 GRL
CONSORCIO LAGUNAS
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR 62056 DE VILLA LAGUNAS, DEL DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS, LORETO"
Region: LORETO
Provincia: ALTO AMAZONAS
Distrito: LAGUNAS

SI. 3,872,652.12

SI. 0.00

SI. 0.00

SI. 3,872,652.12

Fecha de Inicio de Obra: 01-Dic-20
Plazo de Ejecución: 180 Días

1* Paralización

2* Paralización

3* Paralización

Fecha de Terminación de Obra Inicial

Fecha de Terminación Contractual

25-Jul-21

PRESUPUESTO INTEGRAL


VALORIZACION MENSUAL Nº 5

AL 31 DE MAYO DEL 2021

ING. EDUARDO PINCHI VASQUEZ

ING. ALFREDO RICARDO MARMOLEJO CUCHO

PRESUPUESTO	STO	DESCRIPCION	AVANCE DE OBRA				SALDO POR VALORIZAR			
			AVANCE ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		Metrado	Valorizado		
			Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado				
02	UND	SUMIDERO DE BRONCE DE 2" PROVEIDUR ACCESORIOS PARA REDES DE DESAGUE	1.00	14.03	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
01	UND	YEE SIMPLE PVC SAP DE 4"	2.00	23.72	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
02	UND	YEE SIMPLE PVC SAP DE 2"	2.00	15.72	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
03	UND	YEE REDUCCIÓN PVC SAP DE 4" A 2"	1.00	11.86	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
04	UND	CODO PVC SAP 90° DE 4"	2.00	23.72	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
05	UND	CODO PVC SAP 90° DE 2"	2.00	15.72	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
01	UND	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS INODORO TANQUE BAJO DE LOSA VITRIFICADA	2.00	656.86	0.00	0.00	100.00	656.86	0.00	0.00
02	UND	LAVATORIO DE LOSA TIPO OVALIN	2.00	539.58	0.00	0.00	100.00	539.58	0.00	0.00
03	UND	GRIFO DE BRONCE CROMADO DE 1/2"	2.00	78.44	0.00	0.00	100.00	78.44	0.00	0.00
04	UND	ELECTROBOMBA 0.5 HP inc. Accesorios	1.00	1,042.24	0.00	0.00	100.00	1,042.24	0.00	0.00
01	PTO	SALIDA DE AGUA FRIA	4.00	133.96	0.00	0.00	100.00	133.96	0.00	0.00


Segundo Michel Gonzales Quijar
 Representante Común
 CONSORCIO LAGUNAS


Alfredo Ricardo Marmolejo Cuzco
 ING. CIVIL
 CIP: N°-91401

CONSORCIO SUPERVISION LAGUNAS

Ing. Eduardo Pinchi Vasquez
 Jefe Supervisor
 CIP N° 55688

328
000332

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

LECCIÓN LICITACION PUBLICA Nº 06-2020-C50 GRL
CONSORCIO LAGUNAS

OBRA

"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR 62056 DE VILLA LAGUNAS, DEL DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS, LORETO"

Region LORETO

Provincia ALTO AMAZONAS

Distrito LAGUNAS

SI. 3,872,652.12

SI. 0.00

SI. 0.00

SI. 3,872,652.12

Fecha de Inicio de Obra 01-Dic-20

Plazo de Ejecución 180 Días

1ª Paralización

2ª Paralización

3ª Paralización

Fecha de Término de Obra Inicial 25-Jul-21

Fecha de Término Contractual

PRESUPUESTO INTEGRAL

VALORIZACION MENSUAL Nº 5

AL 31 DE MAYO DEL 2021

ING. EDUARDO PINCHI VASQUEZ

ING. ALFREDO RICARDO MARMOLEJO CUCHO

PRESUPUESTO	STO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DE OBRA				AVANCE ACUMULADO		SALDO POR VALORIZAR				
			AVANCE ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		Valorizado	%	Metrado	Valorizado			
			Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado							
	UND	REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRIA											
01	M	RED DE AGUA PVC SAP DE 1"	3.00	24.45	0.00	0.00	24.45	100.00	3.00	24.45	100.00	0.00	0.00
02	M	RED DE AGUA PVC SAP DE 1/2"	12.00	92.76	0.00	0.00	92.76	100.00	12.00	92.76	100.00	0.00	0.00
		ADQUISICION TUBERIAS DE AGUA FRIA											
01	UND	CODO PVC SAP 1"x90°	2.00	15.78	0.00	0.00	15.78	100.00	2.00	15.78	100.00	0.00	0.00
02	UND	CODO PVC SAP 1/2"x90°	3.00	22.17	0.00	0.00	22.17	100.00	3.00	22.17	100.00	0.00	0.00
03	UND	TEE PVC SAP 1/2"	3.00	21.93	0.00	0.00	21.93	100.00	3.00	21.93	100.00	0.00	0.00
04	UND	REDUCCION PVC-SAP 1" A 1/2"	1.00	7.31	0.00	0.00	7.31	100.00	1.00	7.31	100.00	0.00	0.00
		LLAVES Y VALVULAS											
01	UND	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE	1.00	64.49	0.00	0.00	64.49	100.00	1.00	64.49	100.00	0.00	0.00
02	UND	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE INSTALACIONES SANITARIAS (TANQUE ELEVADO)	3.00	157.02	0.00	0.00	157.02	100.00	3.00	157.02	100.00	0.00	0.00
		RED DE AGUA POTABLE											
01.01	UND	TANQUE DE POLIETILENO DE 600 LTS	2.00	2,251.62	0.00	0.00	2,251.62	100.00	2.00	2,251.62	100.00	0.00	0.00
01.02	M	RED DE AGUA PVC SAP DE 1"	6.00	48.90	0.00	0.00	48.90	100.00	6.00	48.90	100.00	0.00	0.00
01.03	UND	VALVULA DE COMPUERTA DE 1"	1.00	32.49	0.00	0.00	32.49	100.00	1.00	32.49	100.00	0.00	0.00
02		RED DE DESAGUE											
02.01	M	TUBERIA DE REBOSE DE 2"	4.00	34.88	0.00	0.00	34.88	100.00	4.00	34.88	100.00	0.00	0.00
02.02	UND	VALVULA ESFERICA DE 2"	1.00	44.39	0.00	0.00	44.39	100.00	1.00	44.39	100.00	0.00	0.00
02.03	UND	CODO PVC SAP 90° DE 2" INSTALACIONES ELECTRICAS	2.00	15.72	0.00	0.00	15.72	100.00	2.00	15.72	100.00	0.00	0.00
		CENTRO DE LUZ TARTARUJOS DE											
01	PTO	CENTRO DE LUZ CON CONECTOR DE CU T1W	17.00	3,131.57	0.00	0.00	3,131.57	100.00	17.00	3,131.57	100.00	0.00	0.00
02	UND	COMPUERTA AUTOMATICA DE 2" 1/2" 20V"	17.00	1,533.74	0.00	0.00	1,533.74	100.00	17.00	1,533.74	100.00	0.00	0.00
03	UND	REKROFTOR DE ALUMINADO SIMIPLE	5.00	120.95	0.00	0.00	120.95	100.00	5.00	120.95	100.00	0.00	0.00
04	UND	14A REQUISITOR DE ALUMINADO BODILE	3.00	78.57	0.00	0.00	78.57	100.00	3.00	78.57	100.00	0.00	0.00
		SALIDA DE FUERZA DE PAVIMENTACION											

327
000331

Alfredo Ricardo Marmolejo Cuchó
ING. CIVIL
CIP Nº. 41401

Segundo Michel Gonzales Cuchó
Representante Común Página 18
CONSORCIO LAGUNAS

Ing. Eduardo Pinchi Vasquez
Jefe Supervisor
CIP Nº. 55689

LECCIÓN LICITACION PUBLICA Nº 06-2020-CO GRL
CONSORCIO LAGUNAS

OBRA "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR 62056 DE VILLA LAGUNAS, DEL DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS, LORETO"

Region Loreto
Provincia Alto Amazonas
Distrito Lagunas

SI. 3,872,652.12

SI. 0.00

SI. 0.00

SI. 3,872,652.12

01-Dic-20

180 Días

1ª Paralización

2ª Paralización

3ª Paralización

Fecha de Inicio de Obra

Plazo de Ejecución

Fecha de Término de Obra Inicial

Fecha de Término Contractual

25-Jul-21

PRESUPUESTO INTEGRAL

VALORIZACION MENSUAL Nº 5

AL 31 DE MAYO DEL 2021

ING. EDUARDO PINCHI VASQUEZ

ING. ALFREDO RICARDO MARMOLEJO CUCHO

PRESUPUESTO	STO	AVANCE ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		AVANCE ACUMULADO		SALDO POR VALORIZAR	
		Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado
01	UND	13.00	1,376.31	0.00	0.00	13.00	1376.31	100.00	0.00
01	JGO	1.00	1,594.83	0.00	0.00	1.00	1594.83	100.00	0.00
01	M3	0.68	16.21	0.00	0.00	0.68	16.21	100.00	0.00
02	M3	0.65	6.50	0.00	0.00	0.65	6.50	100.00	0.00
01	UND	6.00	853.92	0.00	0.00	6.00	853.92	100.00	0.00
01	M	65.00	435.50	0.00	0.00	65.00	435.50	100.00	0.00
02	M	70.00	626.50	0.00	0.00	70.00	626.50	100.00	0.00
03	M	10.00	116.50	0.00	0.00	10.00	116.50	100.00	0.00
01	JGO	1.00	1,004.68	0.00	0.00	1.00	1004.68	100.00	0.00

CONSORCIO SUPERACION LAGUNAS
Ing. Eduardo Pinchi Vasquez
Jefe Supervisor
CIP N° 55689

Segundo Michel González Cujuti
Representante Común
CONSORCIO LAGUNAS

Alfredo Ricardo Marmolejo Cuzho
ING. CIVIL
CIP N° 41401

326
000330

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

LECCIÓN: LICITACION PUBLICA Nº 06-2020-CO SGR L
CONSORCIO LAGUNAS
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR 62056 DE VILLA LAGUNAS, DEL DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS, LORETO"
Region: LORETO
Provincia: ALTO AMAZONAS
Distrito: LAGUNAS
Fecha de Inicio de Obra: 01-Dic-20
Plazo de Ejecucion: 180 Días

TOTAL: SI. 3,872,652.12
 SI. 0.00
 SI. 0.00
 SI. 3,872,652.12

PARALIZACIONES:
 1ª Paralización
 2ª Paralización
 3ª Paralización

FECHAS:
 Fecha de Término de Obra Inicial: 25-Jul-21
 Fecha de Término Contractual

VALORIZACION MENSUAL Nº 5 AL 31 DE MAYO DEL 2021

ING. EDUARDO PINCHI VASQUEZ
ING. ALFREDO RICARDO MARMOLEJO CUCHO

PRESUPUESTO	AVANCE DE OBRA				AVANCE ACUMULADO		SALDO POR VALORIZAR	
	STO	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	
PLAN COVID-19 (E)			112,812.66		14,050.79		126,863.45	15,260.80
LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL CENTRO DE TRABAJO	M2	242,654.94	7,279.65	40,000.00	1,200.00	282,654.94	8479.65	40,000.40
EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR PREVIO AL REGRESO O EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR ANTES DE INGRESAR AL LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS	UND	28.00	790.72	10.00	282.40	38.00	1073.12	10.00
ORUGATORIO DESINFECCION DE MANOS	UND	4.00	7,425.52	0.00	0.00	4.00	7425.52	0.00
ORUGATORIO SENSIBILIZACION DE LA PREVENCIÓN DEL CONTACTO EN EL CENTRO DE TRABAJO	UND	24.00	1,417.92	0.00	0.00	24.00	1417.92	0.00
INFORMATIVOS COVID-19 MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACION	UND	1.50	837.75	0.25	139.63	1.75	977.38	0.25
LIMPIEZA Y DESINFECCION ANTES DE INGRESAR A AREAS COMUNES	UND	3.00	1,260.00	0.00	0.00	3.00	1260.00	0.00
CUIDADORES SANITARIOS PARA EQUIPO DE SERVICIO USADOS	UND	150.00	2,250.00	15.00	225.00	165.00	2475.00	15.00
HASTA LA OBRA	UND	125.00	27,750.00	25.00	5,550.00	150.00	33300.00	30.00
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL	UND	1.00	4,728.00	0.00	0.00	1.00	4728.00	0.00
SUMINISTRO Y MONTAJE DE MODULO DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE MODULOS DE CONTROL DE DESINFECCION	UND	1.00	6,127.50	0.00	0.00	1.00	6127.50	0.00
SUMINISTRO Y MONTAJE DE MODULO DE CONTROL DE COMEDOR	UND	1.00	10,716.00	0.00	0.00	1.00	10716.00	0.00
SUMINISTRO Y MONTAJE DE MODULO DE CONTROL DE VESTIARIO	UND	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3000.00	0.00
MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL								
MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR EN EL CONTEXTO COVID-19	UND	7,140.00	7,140.00	700.00	700.00	7,840.00	7840.00	800.00
EN EL CONTEXTO COVID-19 CONSIDERACIONES PARA EL REGISTRO Y TRABAJO	UND	120.00	21,282.80	30.00	5,308.20	150.00	26541.00	30.00
TOTAL								

325
 000320

Ing. Eduardo Pinchi Vásquez
 Jefe Supervisor
Ing. Alfredo Ricardo Marmolejo Cuzco
 ING. CIVIL
 CIP. N° 41404

Segundo Michel González Cuzco
 Representante Común - Página 20
 CONSORCIO LAGUNAS

LECCIÓN: LICITACION PUBLICA Nº 06-2020-CO SO GRL
 OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR 62056 DE VILLA LAGUNAS, DEL DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS, LORETO"
 CONSORCIO LAGUNAS

Region: LORETO
 Provincia: ALTO AMAZONAS
 Distrito: LAGUNAS

SI. 3,872,652.12
 SI. 0.00
 SI. 3,872,652.12

Fecha de inicio de Obra: 01-Dic-20
 Plazo de Ejecucion: 180 Dias

PRESUPUESTO INTEGRAL

1* Paralización
 2* Paralización
 3* Paralización

ING. EDUARDO PINCHI VASQUEZ
 ING. ALFREDO RICARDO MARMOLEJO CUCHO

Fecha de Término de Obra Inicial: 25-Jul-21
 Fecha de Término Contractual

VALORIZACION MENSUAL Nº 5

AL 31 DE MAYO DEL 2021

PRESUPUESTO	STO	AVANCE DE OBRA				AVANCE ACUMULADO		SALDO POR VALORIZAR	
		Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado
UND	UND	3.00	42.60	1.00	14.20	4.00	56.80	1.00	14.20
PROCESO PARA EL REGRESO AL TRABAJO CONSIDERACIONES PARA LA REINCORPORACION AL TRABAJO	UND	3.00	42.60	1.00	14.20	4.00	56.80	1.00	14.20
CONSIDERACIONES PARA LA REVISION Y REFORZAMIENTO A TRABAJADORES EN REVISION Y REFORZAMIENTO A TRABAJADORES EN PROCEDIMIENTO DE TRABAJO CON RIESGO CRITICO EN PUESTO CONSIDERACIONES PARA EL REGRESO O REINCORPORACION AL TRABAJO DE TRABAJADORES CON FACTORES DE RIESGO HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN COVID-19	UND	3.00	339.48	1.00	113.16	4.00	452.64	1.00	113.16
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN COVID-19	UND	3.50	2,352.00	0.75	504.00	4.25	2856.00	0.75	504.00
PRUEBAS RAPIDAS AL INGRESO DE OBRA									

CONSORCIO SUPERVISORIO LAGUNAS
 Ing. Eduardo Pinchi Vásquez
 Jefe Supervisor
 CIP N° 65688

Segundo Michel González Cuyuti
 Representante Común
 CONSORCIO LAGUNAS

Alfredo Ricardo Marmolejo Cuzco
 ING. CIVIL
 CIP. N° 41401

000328 324

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

SELECCIÓN LICITACION PUBLICA Nº 06-2020-CSO GRL
 CONSORCIO LAGUNAS

OBRA
 "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR 62056 DE VILLA LAGUNAS, DEL DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS, LORETO"
 Region Loreto
 Provincia Alto Amazonas
 Distrito Lagunas

SI. 3,872,652.12
 SI. 0.00
 SI. 0.00
 SI. 3,872,652.12

Fecha de Inicio de Obra
 01-Dic-20
 Plazo de Ejecucion
 180 Dias

TOTAL

PRESUPUESTO INTEGRAL

- 1* Paralización
- 2* Paralización
- 3* Paralización


25-Jul-21


VALORIZACION MENSUAL Nº 5 AL 31 DE MAYO DEL 2021

ING. EDUARDO PINCHI VASQUEZ
 ING. ALFREDO RICARDO MARMOLEJO CUCHO

PRESUPUESTO	STO	UND	AVANCE DE OBRA						SALDO POR VALORIZAR		
			AVANCE ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		AVANCE ACUMULADO		Metrado	Valorizado	
			Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado			%
	UND		53.00	8,005.12	0.00	0.00	53.00	8005.12	100.00	0.00	0.00
	TON		0.50	75.00	0.00	0.00	0.50	75.00	100.00	0.00	0.00
SUB TOTAL (A+B+C+D+E)				2,009,501.73		352,756.41		2,362,258.12			1,510,393.99
FACTOR DE RELACION =				2,009,501.73		352,756.41		2,362,258.12			1,510,393.99
AJE DE AVANCE MENSUAL AL MES DE MAYO 2,021				51.89%		9.11%		61.00%			39.00%
AJE DE AVANCE ACUMULADO AL MES DE MAYO 2,021								100.00%			


 CONSORCIO SUPERVISION LAGUNAS
 Ing. Eduardo Pinchi Vasquez
 Jefe Supervisor
 ZIP N° 55639


 Segundo Michel González Cullqui
 Representante Com Un
 CONSORCIO LAGUNAS


 Alfredo Ricardo Marmolejo Cuchó
 ING. CIVIL
 CIP N° 41401

323
000327

"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR N° 62056 DE VILLA LAGUNAS – LAGUNAS – ALTO AMAZÓNAS – LORETO"

PANEL FOTOGRÁFICO



Muro de ladrillo tipo sogá en cerco perimétrico

CONSORCIO SUPERVISIÓN LAGUNAS

Ing. Eduardo Pinchi Vasquez
Jefe Supervisor
CIP N° 50689


Alfredo Ricardo Velazco
ING. CIVIL
CIP. N° 41403



Asentado de ladrillo tipo sogá en cerco perimétrico


Segundo Michel Gonzales Cuiqui
Representante Común
CONSORCIO LAGUNAS

"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR N° 62056 DE VILLA LAGUNAS – LAGUNAS – ALTO AMAZÓNAS – LORETO"




Muro de ladrillo tipo sogá en cerco perimetrico


CONSORCIO SUPERVISOR LAGUNAS
Ing. Eduith Pinchi Vasquez
Jefe Supervisor
CIF. N° 50658



Alfredo Ricardo Marmolejo Cruz
ING. CIVIL
CIF. N° 41402



Muro de ladrillo tipo sogá en cerco perimetrico



Segundo Michel Gonzalez Colqui
Representante Comunal
CONSORCIO LAGUNAS

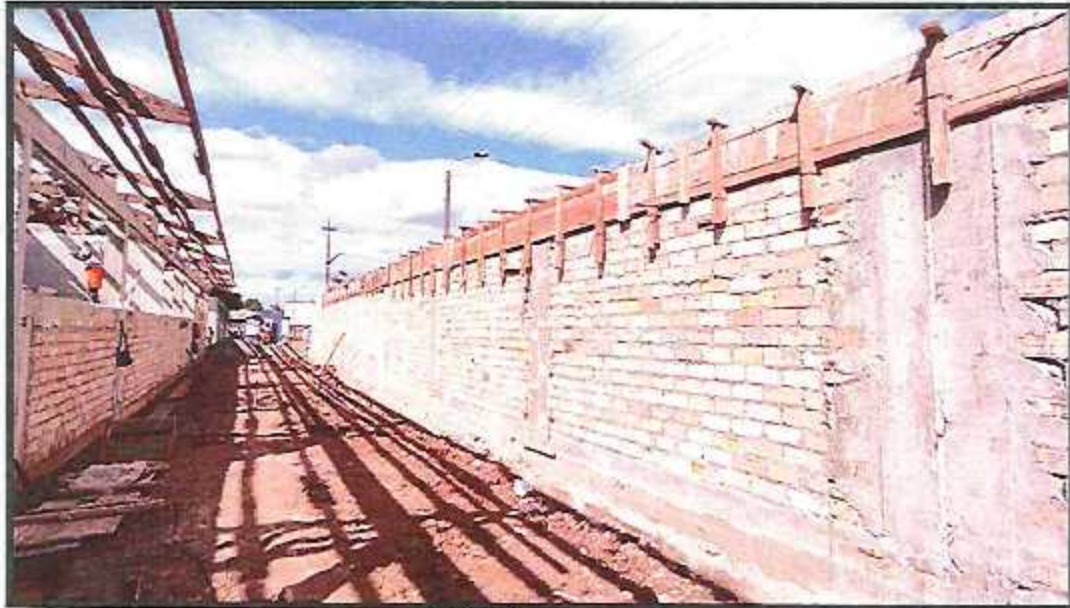
"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR N° 62056 DE VILLA LAGUNAS – LAGUNAS – ALTO AMAZÓNAS – LORETO"




Viga de amarre en muro perimetrico

CONSORCIO SUPERVISIÓN LAGUNAS
Ing. Eduardo Pincho Vasquez
Jefe Supervisor
CIP N° 65889


Alfredo Ricardo Marmolejo Cuchic
ING. CIV.
CIP. N° 41401

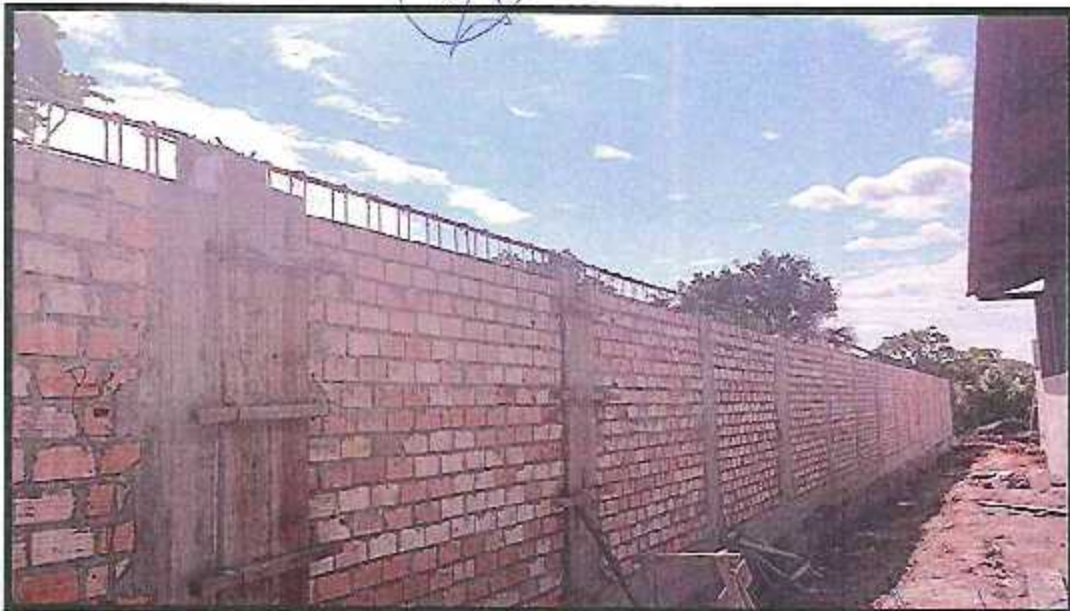

Viga de amarre en muro perimetrico


Segundo Michel Gonzales Lucivi
Representante Común
CONSORCIO LAGUNAS

"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR N° 52056 DE VILLA LAGUNAS – LAGUNAS – ALTO AMAZÓNAS – LORETO"



Viga de amarre en muro perimetrico


CONSORCIO SUPERVISIÓN LAGUNAS
Ing. Eduardo Sánchez Vasquez
Jefe Supervisor
CIP N° 20088


Alfredo Ricardo Marmolejo Cueva
ING. CIVIL
CIP N° 41401



Tarrajeo en muro exterior, derrame en vigas de modulos.


Segundo Michel González Cuzqui
Representante Común
CONSORCIO LAGUNAS

"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR N° 62056 DE VILLA LAGUNAS – LAGUNAS – ALTO AMAZÓNAS – LORETO"



Tarrajeo en muro interior, derrame en vigas de módulos.


CONSORCIO SUPERVISIÓN LAGUNAS
Ing. Eduardo Pincha Vesquez
Supervisor


Alfredo Ricardo Marmora
ING. CIVIL
CIP N° 43403



Tarrajeo en muro exterior, derrame en vigas de módulos.



Segundo Michel Gonzales
Representante Comité
CONSORCIO LAGUNAS

"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR N° 52056 DE VILLA LAGUNAS – LAGUNAS – ALTO AMAZÓNAS – LORETO"



Tarrajeo en muro exterior, derrame en vigas de modulos.


Alfredo Ricardo Martínez Cacha
ING. CIVIL
C.P. N° 41401

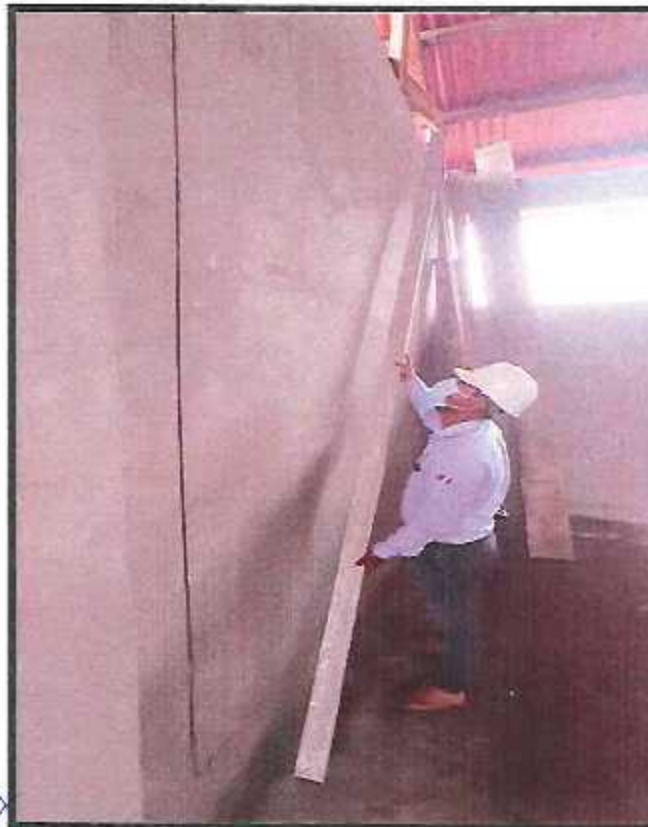

CONSORCIO SUPERVISOR LAGUNAS

Ing. Eduardo Michel Vásquez
Jefe Supervisor
CIP N° 50389

Verificación del tarrajeo interior


Segundo Michel Gonzales Curot
Representante Común
CONSORCIO LAGUNAS

"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR N° 62056 DE VILLA LAGUNAS – LAGUNAS – ALTO AMAZÓNAS – LORETO"



Tarrajeo en muro exterior, derrame en vigas de módulos.


Alfredo Ricardo del Molino Castro
Ing. CIVIL
CIP N° 21402



Tarrajeo en muro interior, derrame en vigas de módulos.


CONSORCIO SUPERVISIÓN LAGUNAS
Ing. Eduardo Pineda Vásquez
Jefe Supervisor
CIP N° 55489


Segundo Michel Gonzales Cuidu
Representante Comité
CONSORCIO LAGUNAS


"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR N° 62056 DE VILLA LAGUNAS – LAGUNAS – ALTO AMAZÓNAS – LORETO"



Tarrajeo en muro exterior, derrame en vigas de módulos.



Alfredo Aguado Matamoros
ING. CIVIL
CIP. N° 43401

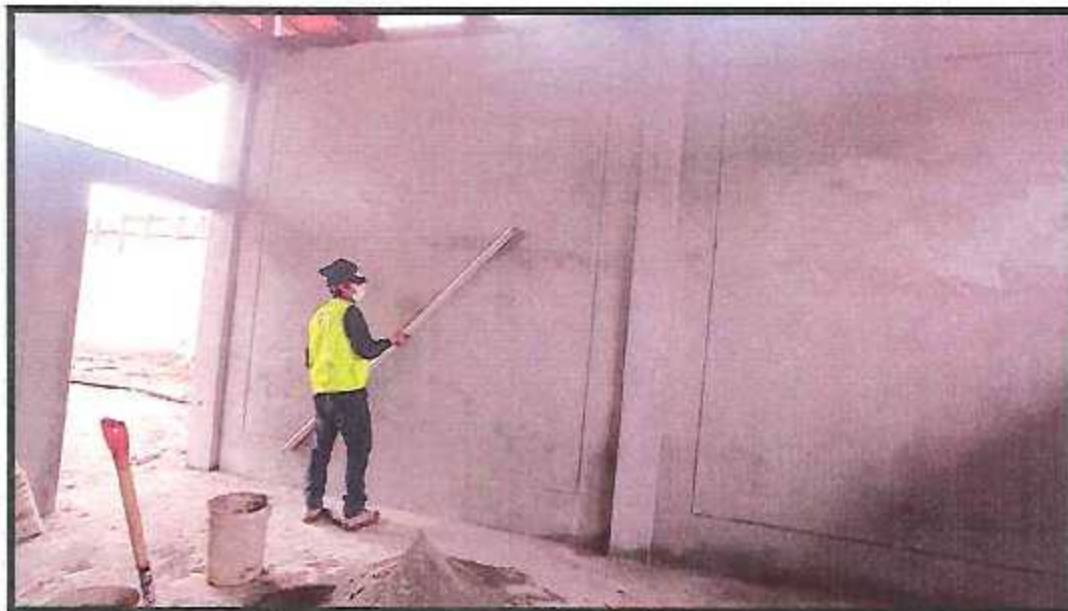

Tarrajeo en muro interior en módulos.



CONSORCIO SUPERVISIÓN LAGUNAS
Ing. Eduardo Finch Vasquez
Jefe Supervisor
CIP. N° 55659



Segundo Michel Gonzalez
Representante Común
CONSORCIO LAGUNAS

"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR N° 62056 DE VILLA LAGUNAS – LAGUNAS – ALTO AMAZÓNAS – LORETO"



Verificación de tarrajeo interior en módulos


Alfredo Alvarado
Ing. CIV.
CIP. N° 41401



Tarrajeo en muro exterior, derrame en vigas de módulos.

CONSORCIO SUPERVISIÓN LAGUNAS

Ing. Eduardo Sanchez Vasquez
Jefe Supervisor
CIP. N° 59689


Segundo Miche Gonzalez
Representante Común
CONSORCIO LAGUNAS
