



# VALORIZACION

## N.º 9



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Belén, 11 de junio de 2021

**CARGO**



Oficio n° 1744-2021-GRL-GRI-SGSyC

Ing. Mg. Artemio del águila Panduro  
Gerente Regional de Infraestructura  
Presente

Asunto: Remite Valorización de Obra n° 09  
Mayo 2021.

Obra: "Mejoramiento del servicio de Embarque  
y Desembarque de Pasajeros en el Embarcadero  
Principal de la Localidad de Inahuaya del Distrito de  
Inahuaya – Provincia de Ucayali – Departamento  
de Loreto.

Ref.: a. Informe n° 390-2021-GRL-GRI-SGSyC-NCGR  
b. Carta n° 021-2021-CSE.  
c. Informe n° 012-2021-JS/ABY/INAHUAYA

Tengo el agrado de saludarle, a su vez remitirle  
la documentación de la **Valorización n° 09 por ejecución de Obra**,  
correspondiente a mayo 2021, que asciende a la suma de (S/. 215 115.96), de  
acuerdo a las amortizaciones de adelanto directo y materiales consideramos en  
monto neto a pagar la suma de **Doscientos Quince mil ciento quince con 96/100  
Soles (S/. 215 115.96) sin incluir IGV**, presentada y aprobada por el supervisor  
mediante carta de la referencia b), revisada por la coordinadora según referencia  
a), de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización bruta n° 09 mayo 2021	S/.	215,115.96
Reajuste neto	S/.	0.00
Amortización adelanto directo	S/.	0.00
Amortización adelanto materiales	S/.	0.00
<b>Neto a Pagar</b>	<b>S/.</b>	<b>215,115.96</b>

Asimismo, la ejecución de la obra en mayo de  
2021, tiene un avance real ejecutado acumulado de 100.00% versus un programado de  
100.00%, encontrándose como obra **Culminada**.

Por lo tanto, encontrándose conforme la  
documentación que sustenta el supervisor y revisada por el coordinador, solicito continuar  
con el trámite respectivo del CONSORCIO INAHUAYA. Se adjunta factura electrónica.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL Loreto  
Gerencia Regional de Infraestructura  
Ing. RAUL FLORES AGUIPUCHO  
Sub Gerente de Supervisión y Control  
CIP. 62423

Copia: SGSyC – File obra (01)  
SGSyC – File correlativo (01)  
SGSyC – File personal (01)  
RFA – S.G.  
dap – Sec.



**INFORME N° 390 -2021-GRL/GRI/SGSyC-NCGR**



Al : **ING. RAUL FLORES AQUEPUCHO**  
Sub Gerente de Supervisión y Control

Del : **ING. NICIA CORIN GARCIA RAMIREZ**  
Coordinadora de Obra

Asunto : Remite Valorización de Obra N° 09 – Mayo 2021.  
**Obra: "Mejoramiento del Servicio de Embarque y Desembarque de Pasajeros en el Embarcadero Principal de la localidad de Inahuaya del distrito de Inahuaya – provincia de Ucayali – departamento de Loreto".**

Referencia : 1 CARTA N° 021-2021-CSE - PROVEIDO N° 13227  
2 INFORME N° 12-2021-JS/ABY/INAHUAYA

Fecha : Iquitos, 10 de Junio de 2021

Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo muy cordialmente e informar sobre lo indicado en el asunto.

**I DATOS GENERALES**

OBRA : "Mejoramiento del Servicio de Embarque y Desembarque de Pasajeros en el Embarcadero Principal de la localidad de Inahuaya del distrito de Inahuaya – provincia de Ucayali – departamento de Loreto"

UBICACION : Localidad de Inahuaya, distrito de Inahuaya, provincia de Ucayali – departamento de Loreto.

CONTRATISTA : CONSORCIO INAHUAYA

PROCESO DE SELECCIÓN : Licitación Pública N° 033-2019-CSO-GRL

CONTRATO DE OBRA : CONTRATO N° 033-2020-GRL-GRI

FECHA DE CONTRATO : 17 de Setiembre del 2020

MONTO CONTRACTUAL : S/. 3'318,774.11 sin IGV

PLAZO DE EJECUCION OBRA : Ciento Ochenta (180) Días Calendarios

ENTREGA DE TERRENO : 26 de Setiembre del 2020

ING. RESIDENTE : Ing. Hilton Zapata Távara - CIP 93662

ADELANTO DIRECTO : S/. 331,877.41

Fecha de Desembolso AD : 22/10/2020

ADELANTO DE MATERIALES : En trámite

FECHA DE INICIO DE OBRA : 23/10/2020


FECHA DE TERMINO DE OBRA : **22/04/2021**

SUPERVISOR DE OBRA : Ing. German Antonio Burga Young – CIP 135094

%Avance Físico mes umulado : 6.48%

%Avance Físico Acumulado : 100.00%

%Avance Programado Acum. : 100.00%

  
**Nicia Corin Garcia Ramirez**  
Ingeniero Civil  
CIP N° 73438

**II ANTECEDENTES**

➤ Mediante Memorando N° 077-2020-GRL-GRI-SGSyC de fecha 22/09/2020, se designó como Inspector de la Obra al Ing. Cesar Hernan Ruiz Aguero, encargándose la inspección de la obra y hacer la entrega del terreno a nombre de la Entidad dentro del plazo establecido en el Art. 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, al



mismo que fue efectuado el 26/09/2020, en este contexto la fecha del desembolso del Adelanto Directo define la fecha de inicio de ejecución de obra.

- Mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM se declaró el estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19.
- Mediante Decreto Supremo N° 094-2020-PCM se prorrogó el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, N° 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM y N° 072-2020-PCM, y prorrogado mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM y N° 083-2020-PCM hasta el martes 30 de junio del 2020 disponiéndose el aislamiento social obligatorio por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19.
- Mediante Decreto Legislativo N° 1486 se establecen las disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de las inversiones públicas.
- Mediante la Directiva N°005-2020-OSCE/CD se establecen los alcances y disposiciones para la reactivación de obras públicas y contratos de supervisión, en el marco de la segunda disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo N° 1486.
- Mediante Decreto Supremo N°101-2020-PCM del 04/06/2020 se aprueba la Fase 2 de la Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, y modifica el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM.
- Mediante Resolución Ministerial N° 972-2020/MINSA del 27/11/2020 se aprueba el documento técnico: "Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de salud de los trabajadores con riesgo en exposición SARS-CoV-2"
- Mediante Decreto Supremo N° 031-2020-SA se prorroga el estado de emergencia sanitaria a nivel nacional por el Covid-19 a partir del 07/12/2020 por un plazo de 90 (noventa) días calendario hasta el 07/03/2021.
- Mediante Decreto Supremo N° 008-2021-PCM de prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del Covid-19 por el plazo de 28 (veintiocho) días calendario a partir del lunes 01 de febrero de 2021.
- Mediante Informe Médico N° 001-2021-CI/RSO/AAPH de la Responsable de la Salud Ocupacional – CI del 07/04/2021 de la Licenciada en Enfermería se comunica que se ha detectado en la obra, infectados con el SARS Covid-19 a través de hisopado de secreción nasal, entre ellos al residente de obra, Ing. Hilton Zapata Tavera, recomendando el aislamiento obligatorio de todo el personal obrero, técnico y profesional.
- Mediante Acta del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del 05/04/2021 se comunica el acuerdo unánime en virtud a altos niveles de contagio concordante con la Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA y se solicita al contratista ejecutor de la obra la paralización de las actividades a partir del 06/04/2021 para el aislamiento obligatorio de todo el personal, indicándose que el personal ha sido trasladado a las ciudades de Contamana, Pucallpa e Iquitos.
- Mediante Acta del 05/04/2021 el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo solicita a la empresa ejecutora de la obra, la suspensión del plazo de ejecución de obra en virtud a altos niveles de contagio del personal de la obra, entre ellos el residente de obra, esta

  
Alicia Conda García Ramírez  
Ingeniero Civil  
CIP No 73438



- Mediante Carta N° 011-2021/CI del 07/04/2021 el representante legal de la empresa CONSORCIO INAHUAYA comunica a la empresa supervisora de la obra CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO, la suspensión del plazo de ejecución de obra desde el 06 de abril del 2021 y por 16 días calendario en virtud a altos niveles de contagio del personal de la obra, entre ellos el residente de obra, esta solicitud de efectúa concordante con la Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA y con el Art. 178° del Reglamento de la Ley de Contrataciones por paralizaciones por causas no atribuibles a ninguna de las partes
- Mediante Carta N° 014-2021-CSE del 09/04/2021 la empresa supervisora CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO comunica a la Entidad la suspensión del plazo de ejecución de obra en virtud a altos niveles de contagio concordante con la Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA y con el Art. 178° del Reglamento de la Ley de Contrataciones por paralizaciones por causas no atribuibles a ninguna de las partes.
- Mediante Carta N° 015-2021-CSE del 28/05/2021 la empresa supervisora CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO comunica a la Entidad continuar con la suspensión del plazo de ejecución de obra en virtud a lo indicado en las conclusiones del Informe N° 006-2021-JS/AYB/INAHUAYA del Jefe de Supervisión; en merito a altos niveles de contagio concordante con la Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA y con el Art. 178° del Reglamento de la Ley de Contrataciones por paralizaciones por causas no atribuibles a ninguna de las partes.

De acuerdo al Informe N° 006-2021-JS/AYB/INAHUAYA del Jefe de Supervisión; comunica continuación de Suspensión de Plazo de Ejecución de Obra; sustenta la necesidad de continuar con la suspensión, de acuerdo a lo siguiente:

Sustento sobre necesidad de continuar con la Suspensión del Plazo de Ejecución:

- En las fechas 05 de abril del 2021 dos (02), colaboradores de la contratista Consorcio Inahuaya presentaron síntomas propios de SARS COVID 19, resultando con ello REACTIVO en igG y NO REACTIVO en igM. Lo cual significa positivo en COVID 19 en ambos casos, para la prueba de antígeno (test de prueba rápida), a esa fecha pasaron más de 15 días por el cual ambos trabajadores cumplieron con su cuarentena y tomaron las medicinas respectivas referidas por la especialista de salud del proyecto "MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EMBARQUE, DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA" – DPTO DE LORETO - CONSORCIO INAHUAYA".
- Sumado a esto, en la fecha 22 de abril del 2021 la Especialista de Salud, nuevamente procede a realizar la prueba rápida a ambos colaboradores (observados con anterioridad), resultando negativo para SARS cov 19 en ambos casos, sin embargo, menciona que se observa que presentan leve agitación y fatiga al momento de mostrar esfuerzo físico, lo cual demuestra que no cuentan con la condición necesaria aún para laborar, por lo que, recomienda tomar los resguardos necesarios y mantener las reglas básicas de higiene.

De la misma forma con fecha 22 de abril del 2021, el Ingeniero Residente Hilton Zapata Távara, remite el resultado de su prueba Covid 19 Antígeno – Hisopado, con resultado Negativo del establecimiento médico: "SERVICIOS CLINICA SANTA ANITA PUCALLPA E.I.R.L.", pero la Especialista de Salud menciona, que pese a haber superado la patología el Ingeniero Residente de la Obra, Sr. Hilton Zapata Távara, viene arrastrando secuelas propias debido a la heterogeneidad causada por el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, tales como: Dificultad para respirar, cansancio,

  
Alicia Corín García Ramírez  
Ingeniero Civil  
CIP N° 73438



ansiedad, así como afectación de la fuerza muscular y motora, por lo que, recomienda que debe continuar con el autoaislamiento, tratando estos síntomas con reposo, la ingesta abundante de líquidos, tomando los resguardos necesarios y los medicamentos prescritos, hasta lograr una salud óptima.

- Con fecha 26 de abril del 2021, el comité de seguridad y salud en el trabajo de la Empresa "Consortio Inahuaya" (ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA / EXTRAORDINARIA N° 02 – 26 ABRIL 2021 – CSST – 2021), indica: "Siendo aprobado la suspensión de las labores en la Comunidad de Inahuaya por contar con casos en nuestra obra, existiendo además en áreas circundantes (muchos casos de esta enfermedad en la Ciudad de Pucallpa y Contamana), focos infecciosos que pudieran trascender en daño a la salud física de las personas, es por ello que se solicita a la fecha 26 de abril del 2021, 15 días más de ampliación de suspensión por los casos observados y tomando en cuenta la cercanía a nuestra zona de influencia entre la ciudad de Pucallpa y la Localidad de Contamana".

Y continua "...En vista que el problema de contagio afecta a nivel mundial, el área de seguridad y salud en el trabajo de la Empresa "Consortio Inahuaya", por medio del informe referido por la enfermera Ashly Aylin Panduro Huamán: "AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES", es que se solicita dicha solicitud por ser un medio preventivo".

- Actualmente en la Ciudad de Pucallpa y Contamana zonas cercanas a la comunidad del Distrito de Inahuaya se están presentando altos índices de COV 19, con casos alarmantes (Ambos con categoría de Riesgo Extremo), y considerando que el personal técnico, administrativo y mano de obra calificada de Consortio Inahuaya, reside en su mayoría en los lugares mencionados, y tomando en cuenta todos los antecedentes descritos previamente por la Especialista de Salud, más lo dispuesto en el artículo 178 - Suspensión del Plazo de Ejecución, del Reglamento de la Ley N° 30225 Reglamento y sus Modificaciones D.S N° 377-2019-EF y D.S. 168-2020-EF y lo indicado en el Acta de reunión ordinaria / extraordinaria n° 02 – 26 abril 2021 – CSST – 2021, esta supervisión se pronuncia: recomendando la continuidad de la extensión de la suspensión de plazo de ejecución de obra, por un total de quince (15) días calendario, con el fin de salvaguardar la integridad física, fisiológica y emocional de todo el personal hasta asegurarnos que los involucrados en cuestión garanticen un estado de salud óptimo.

De la necesidad de continuar con la Suspensión del Plazo de Ejecución, obedece a los siguientes actuados:

  
Nidia Corín García Ramírez  
Ingeniero Civil  
CIP N° 73438

En la fecha 05 de abril del 2021 dos (02), colaboradores de la contratista Consortio Inahuaya presentaron síntomas propios de SARS COVID 19, resultando con ello REACTIVO en igG y NO REACTIVO en igM. Lo cual significa positivo en COVID 19 en ambos casos, para la prueba de antígeno (test de prueba rápida), a esa fecha pasaron más de 15 días por el cual ambos trabajadores cumplieron con su cuarentena y tomaron las medicinas respectivas referidas por la especialista de salud del proyecto "MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EMBARQUE, DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA" – DPTO DE LORETO - CONSORCIO INAHUAYA".

- Sumado a esto, en la fecha 22 de abril del 2021 la Especialista de Salud, nuevamente procede a realizar la prueba rápida a ambos colaboradores (observados con



anterioridad), resultando negativo para SARS Covid 19 en ambos casos, sin embargo, menciona que se observa que presentan leve agitación y fatiga al momento de mostrar esfuerzo físico, lo cual demuestra que no cuentan con la condición necesaria aún para laborar, por lo que, recomienda tomar los resguardos necesarios y mantener las reglas básicas de higiene.

- De la misma forma con fecha 22 de abril del 2021, el Ingeniero Residente Hilton Zapata Távara, remite el resultado de su prueba Covid 19 Antígeno – Hisopado, con resultado Negativo del establecimiento médico: "SERVICIOS CLINICA SANTA ANITA PUCALLPA E.I.R.L.", pero la Especialista de Salud menciona, que pese a haber superado la patología el Ingeniero Residente de la Obra, Sr. Hilton Zapata Távara, viene arrastrando secuelas propias debido a la heterogeneidad causada por el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, tales como: Dificultad para respirar, cansancio, ansiedad, así como afectación de la fuerza muscular y motora, por lo que, recomienda que debe continuar con el autoaislamiento, tratando estos síntomas con reposo, la ingesta abundante de líquidos, tomando los resguardos necesarios y los medicamentos prescritos, hasta lograr una salud óptima.
- Mediante Asiento de Cuaderno de Obra N° 147 del Residente de Obra, de fecha 23 de abril del 2021 – Folio N° 44, 45 y 46 del cuaderno de Obra N° 02, se indica: Que se debe continuar con la extensión de la suspensión del plazo de ejecución de obra, por un total de quince (15) días calendario, por los antecedentes descritos previamente, indicando, además, que el nuevo término de la suspensión del plazo de ejecución es el 07 de mayo del 2021.
- Con fecha 26 de abril del 2021, el comité de seguridad y salud en el trabajo de la Empresa "Consortio Inahuaya" (ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA / EXTRAORDINARIA N° 02 – 26 ABRIL 2021 – CSST – 2021), indica: "Siendo aprobado la suspensión de las labores en la Comunidad de Inahuaya por contar con casos en nuestra obra, existiendo además en áreas circundantes (muchos casos de esta enfermedad en la Ciudad de Pucallpa y Contamana), focos infecciosos que pudieran trascender en daño a la salud física de las personas, es por ello que se solicita a la fecha 26 de abril del 2021, 15 días más de ampliación de suspensión por los casos observados y tomando en cuenta la cercanía a nuestra zona de influencia entre la ciudad de Pucallpa y la Localidad de Contamana".

Y continua ..."En vista que el problema de contagio afecta a nivel mundial, el área de seguridad y salud en el trabajo de la Empresa "Consortio Inahuaya", por medio del informe referido por la enfermera Ashly Aylin Panduro Huamán: "AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES", es que se solicita dicha solicitud por ser un medio preventivo".

- Actualmente en la Ciudad de Pucallpa y Contamana zonas cercanas a la comunidad del Distrito de Inahuaya se están presentando altos índices de COV 19, con casos alarmantes (Ambos con categoría de Riesgo Extremo), y considerando que el personal técnico, administrativo y mano de obra calificada de Consortio Inahuaya, reside en su mayoría en los lugares mencionados, y tomando en cuenta todos los antecedentes descritos previamente por la Especialista de Salud, más lo dispuesto en el artículo 178 - Suspensión del Plazo de Ejecución, del Reglamento de la Ley N° 30225 Reglamento y sus Modificaciones D.S N° 377-2019-EF y D.S. 168-2020-EF y lo indicado en el Acta de reunión ordinaria / extraordinaria n° 02 – 26 abril 2021 – CSST – 2021, esta supervisión se pronuncia: recomendando la continuidad de la

  
Corín García Ramírez  
Ingeniero Civil  
CIP N° 73436



extensión de la suspensión de plazo de ejecución de obra, por un total de quince (15) días calendario, con el fin de salvaguardar la integridad física, fisiológica y emocional de todo el personal hasta asegurarnos que los involucrados en cuestión garanticen un estado de salud óptimo.

- Con fecha 26 de abril del 2021, CONSORCIO INAHUAYA remite la Carta N° 012-2021-C.I, con el asunto: Comunica continuación de la suspensión del plazo de ejecución, en donde se indica: Tomando en cuenta todos los antecedentes descritos previamente por nuestra Especialista de Salud, más lo dispuesto en el artículo 178 - Suspensión del Plazo de Ejecución, del Reglamento de la Ley N° 30225 Reglamento y sus Modificaciones D.S N° 377-2019-EF y D.S. 168-2020-EF y lo indicado en el Acta de reunión ordinaria / extraordinaria n° 02 – 26 abril 2021 – CSST – 2021, se debe continuar con la extensión de la suspensión de plazo de ejecución de obra, por un total de quince (15) días calendario, teniendo como nueva fecha de término de la suspensión del plazo de ejecución el 07 de mayo del 2021, con el fin de salvaguardar la integridad física, fisiológica y emocional de todo el personal hasta asegurarnos que los involucrados en cuestión garanticen un estado de salud óptimo.
- Mediante Informe N° 307-2021-GRL/GRI/SGSyC-NCGR, la suscrita comunica que la Entidad toma conocimiento que a partir del 23.04.2021 se continua con la suspensión de las actividades en la ejecución de la Obra: **"Mejoramiento del Servicio de Embarque y Desembarque de Pasajeros en el Embarcadero Principal de la localidad de Inahuaya del distrito de Inahuaya – provincia de Ucayali – departamento de Loreto"**.

Así mismo se recomendó a la Sub Gerencia de Supervisión, derivar toda la documentación al Área de Asesoría Legal de la Gerencia Regional de Infraestructura, para su evaluación y de ser procedente la formalización del Acta de Suspensión de la obra: **"Mejoramiento del Servicio de Embarque y Desembarque de Pasajeros en el Embarcadero Principal de la localidad de Inahuaya del distrito de Inahuaya – provincia de Ucayali – departamento de Loreto"** por 15 días calendario del 23 abril al 07 de mayo del 2021.

- Mediante Carta N° 019-2021-CSE del 11/05/2021 la empresa supervisora CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO, en mérito al Informe N° 008-2021-JS/AYB/INAHUAYA del Jefe de Supervisión; CONCLUYE: aprobar el Calendario Valorizado Acelerado Actualizado de Avance de Obra Post Suspensión.
- Mediante Informe N° 360-2021-GRL/GRI/SGSyC-NCGR, la suscrita comunica que la empresa supervisora CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO, en mérito al Informe N° 008-2021-JS/AYB/INAHUAYA; remite el cronograma actualizado acelerado de obra post Suspensión de Obra, en el que CONCLUYE: **aprobar el Calendario Valorizado Acelerado Actualizado de Avance de Obra Post Suspensión**; esto en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo.202.- Actualización del Programa de Ejecución de Obra, de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Así mismo indica que, contando con la CONFORMIDAD de la Supervisión de Obra: **"Mejoramiento del Servicio de Embarque y Desembarque de Pasajeros en el Embarcadero Principal de la localidad de Inahuaya del distrito de Inahuaya – provincia de Ucayali – departamento de Loreto"**; se recomienda visar los referidos al Cronograma de ejecución de obra actualizado acelerado al 08 de mayo del 2021, con

  
Nicia Corín García Ramírez  
Ingeniero Civil  
CIP N° 734381





la nueva fecha de término al 22 de Mayo 2021; así como NOTIFICAR al Contratista Ejecutor de Obra CONSORCIO INAHUAYA.

- Mediante Carta N° 017-2021-CSE, de fecha 11.05.2021; el Sr. Harve Quevedo Trigozo, representante común del Consorcio Supervisor Embarcadero, remite el Informe N° 11-2021-JS/ABY/INAHUAYA, del Jefe de Supervisión Ing. German Antonio Burga Young, respecto a la valorización de Obra N° 08, correspondiente al mes de Abril 2021.
- Mediante Carta N° 017-2021-CSE, de fecha 04.06.2021; el Sr. Harve Quevedo Trigozo, representante común del Consorcio Supervisor Embarcadero, remite el Informe N° 11-2021-JS/ABY/INAHUAYA, del Jefe de Supervisión Ing. German Antonio Burga Young, respecto a la valorización de Obra N° 09, correspondiente al mes de Mayo 2021.

### III ANALISIS

- Se ha tomado conocimiento de la Valorización de Obra N° 08, correspondiente al mes de Mayo 2021 (Periodo 08.05.2021 al 22.05.2021), practicada por el Residente Ing. Hilton Zapata Távara, y presentada la **CONFORMIDAD** por el Supervisor de Obra a través del Jefe de Supervisión de Obra Ing. German Antonio Burga Young, mediante documento de la referencia 1, la cual pasamos a revisar.
- Así mismo de la revisión de las copias del Cuaderno de Obra, el Ing. Residente, Hilton Zapata Távara, en su Asiento N° 180 del cuaderno de obra (página 067 – folio 48), de fecha 22 de mayo de 2021, presenta los metrados ejecutados. El Jefe de Supervisión, mediante Asiento N° 181 del cuaderno de obra (página 072 – folio 43), verifica los trabajos indicados por el Residente de Obra y verifica los metrados de las partidas correspondientes al mes de Mayo 2021 (del 08.05.2021 al 22.05.2021), para la Valorización N° 09 de Mayo de 2021.

**La Valorización N° 09 Mayo 2021, tiene el siguiente resultado en forma global:**

Valorización Mayo 2021 (Monto bruto)	S/.	215,115.96
Reajuste Neto (+)		0.00
Amortización Adelanto Directo		0.00
Amortización Adelanto Materiales		0.00
<b>TOTAL VALORIZADO A FACTURAR</b>	<b>S/.</b>	<b>215,115.96</b>

Monto valorización	: S/	215,115.96 (sin IGV)
Avance Físico del mes	:	<b>6.48%</b>
Valor Acumulado	: S/	3,318,774.11 (sin IGV)
Avance físico acumulado	:	<b>100.00%</b>

  
Nicia Corin Garcia Ramirez  
Ingeniero Civil  
CIP N° 73438



“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

**CUADRO COMPARATIVO DEL AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE EJECUTADO**

**MAYO 2021**


Obra: MEJORAMIENTO DE SERVIDIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA, DISTRITO DE INAHUAYA - UCAYALI - LORETO  
Entidad: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
Contrato: N° 03-2020-GRU-GRU  
Contratista: CONSORCIO INAHUAYA  
Supervision: CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO  
Plazo de Obra: 180 DIAS CALENDARIO  
AS. N° 01: DEL 06 AL 22 DE ABRIL DEL 2021 - FIRMADO EL 20/04/2021  
AS. N° 02: DEL 23 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DEL 2021 - FIRMADO EL 20/05/2021  
Termino de Obra: 22/05/2021  
Ubicacion: (LORETO) - (UCAYALI) - (INAHUAYA)



**CUADRO DE AVANCE FISICO MENSUAL AL MES DE MAYO 2021**

N°VAL	VALORIZ.	VALORIZACION MENSUAL		% DE AVANCE MENSUAL		VALORIZACION MENSUAL ACUMULADA		% MENSUAL ACUMULADO		ESTADO DE LA OBRA	
		PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGR.	EJECUT.	PROGR.	EJECUT.	PROGR.	EJECUT.		
1	OCTUBRE 2020	S/. 150,128.12	S/. 150,128.12	4.52%	4.52%	S/. 150,128.12	S/. 150,128.12	4.52%	4.52%	0.00%	ADELANTADO
2	NOVIEMBRE 2020	S/. 451,147.09	S/. 451,147.09	13.59%	13.59%	S/. 601,275.21	S/. 601,275.21	18.12%	18.12%	0.00%	ADELANTADO
3	DICIEMBRE 2020 P 01	S/. 460,463.03	S/. 460,463.03	13.87%	13.87%	S/. 1,061,738.24	S/. 1,061,738.24	31.99%	31.99%	0.00%	ADELANTADO
4	DICIEMBRE 2020 P 02	S/. 154,879.55	S/. 154,879.55	4.67%	4.67%	S/. 1,216,617.79	S/. 1,216,617.79	36.66%	36.66%	0.00%	ADELANTADO
5	ENERO 2021	S/. 291,369.70	S/. 291,369.70	8.78%	8.78%	S/. 1,507,987.49	S/. 1,507,987.49	45.44%	45.44%	0.00%	ADELANTADO
6	FEBRERO 2021	S/. 426,831.32	S/. 426,831.32	12.95%	12.95%	S/. 1,934,818.81	S/. 1,934,818.81	58.39%	58.39%	0.00%	ADELANTADO
7	MARZO 2021	S/. 1,046,686.75	S/. 1,046,686.75	31.54%	31.54%	S/. 2,981,505.56	S/. 2,981,505.56	89.93%	89.93%	0.00%	ADELANTADO
8	ABRIL 2021	S/. 111,421.85	S/. 119,149.59	3.36%	3.59%	S/. 3,092,927.41	S/. 3,100,656.15	93.29%	93.52%	0.25%	ADELANTADO
9	MAYO 2021	S/. 222,843.70	S/. 215,115.96	6.71%	6.48%	S/. 3,315,771.11	S/. 3,315,771.11	100.00%	100.00%	0.00%	CONCLUIDO
TOTAL		S/. 3,318,774.11	S/. 3,318,774.11	100.00%	100.00%						

% EJECUTADO MENSUAL DE AVANCE DE LA VALORIZACION DE OBRA N° 09 = 6.48%  
% ACUMULADO DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO VALORIZACION DE OBRA N° 09 = 100.00%

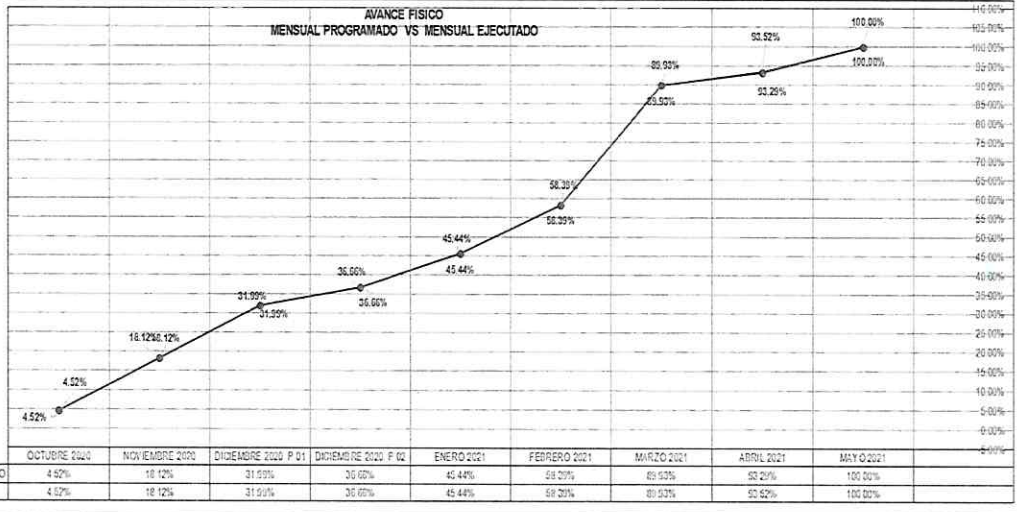

*Nicia Corin Garcia Ramirez*  
Ingeniero Civil  
CIP N° 73438



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"


**CUADRO COMPARATIVO DEL AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE EJECUTADO  
MAYO 2021**

MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA, DISTRITO DE INAHUAYA - UCAYALI - LORETO  
N° 033-2020/GRSL/GRS  
CONSORCIO INAHUAYA  
CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO  
180 DIAS CALENDARIO DEL 2004/2021  
DEL 05 AL 22 DE ABRIL DEL 2021, FIRMADO EL 20/05/2021  
22/05/2021  
(LORETO) - (UCAYALI) - (INAHUAYA)

CUADRO DE AVANCE ECONOMICO MENSUAL AL MES DE MAYO 2021

N°	CERTIFICADO DE PAGO	VALORIZACION BRUTA (SIN I.G.V.)	VALORIZACION BRUTA ACUMULADA (SIN I.G.V.)	AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO	AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES	PENALIDADES MENSUALES	VALORIZACION MENSUAL TOTAL	I.G.V. (18%)	MONTO MENSUAL DE PAGO REAL	MONTO ACUMULADO DE PAGO REAL	MONTO MENSUAL DE PAGO PROYECTADO	MONTO ACUM. DE PAGO PROYECTADO	ESTADO DE LA OBRA
1	OCTUBRE 2020	S/ 150,128.12	S/ 150,128.12	S/ 55,312.80	S/ -	S/ -	S/ 94,815.22	S/ -	S/ 94,815.22	S/ 94,815.22	S/ 150,128.12	S/ 150,128.12	AVANZANDO
2	NOVIEMBRE 2020	S/ 451,147.00	S/ 601,275.21	S/ 45,114.71	S/ 90,229.42	S/ -	S/ 315,802.96	S/ -	S/ 315,802.96	S/ 410,618.18	S/ 601,275.21	S/ 751,403.12	AVANZANDO
3	DICIEMBRE 2020 P.01	S/ 460,483.03	S/ 1,061,758.24	S/ 46,048.30	S/ 92,096.61	S/ -	S/ 322,324.12	S/ -	S/ 322,324.12	S/ 732,942.30	S/ 1,061,758.24	S/ 1,613,161.36	AVANZANDO
4	DICIEMBRE 2020 P.02	S/ 154,870.55	S/ 1,216,628.79	S/ 15,487.06	S/ 30,974.01	S/ -	S/ 108,415.68	S/ -	S/ 108,415.68	S/ 841,357.98	S/ 1,216,628.79	S/ 2,029,790.15	AVANZANDO
5	ENERO 2021	S/ 281,369.70	S/ 1,507,998.49	S/ 28,136.97	S/ 56,273.94	S/ -	S/ 203,958.79	S/ -	S/ 203,958.79	S/ 1,045,316.77	S/ 1,507,998.49	S/ 2,537,788.64	AVANZANDO
6	FEBRERO 2021	S/ 428,831.32	S/ 1,937,830.81	S/ 42,883.13	S/ 85,766.26	S/ -	S/ 300,649.39	S/ -	S/ 300,649.39	S/ 1,345,966.16	S/ 1,937,830.81	S/ 3,475,619.05	AVANZANDO
7	MARZO 2021	S/ 1,046,688.75	S/ 2,984,519.56	S/ 104,668.75	S/ 209,337.50	S/ -	S/ 642,677.53	S/ -	S/ 642,677.53	S/ 2,108,643.69	S/ 2,984,519.56	S/ 5,460,138.61	AVANZANDO
8	ABRIL 2021	S/ 119,149.59	S/ 3,103,669.15	S/ -	S/ -	S/ -	S/ 119,149.59	S/ -	S/ 119,149.59	S/ 2,227,793.28	S/ 3,103,669.15	S/ 8,563,807.76	AVANZANDO
9	MAYO 2021	S/ 215,115.96	S/ 3,318,774.11	S/ 331,877.41	S/ 663,754.82	S/ -	S/ 215,115.96	S/ -	S/ 215,115.96	S/ 2,442,909.24	S/ 3,318,774.11	S/ 11,882,582.01	AVANZANDO
SUB TOTAL		S/ 3,318,774.11	S/ 3,318,774.11	S/ 331,877.41	S/ 663,754.82	S/ -	S/ 2,323,141.88	S/ -	S/ 2,323,141.88	S/ 2,323,141.88	S/ 3,318,774.11	S/ 11,882,582.01	AVANZANDO

MONTO MENSUAL DE PAGO REAL = S/ 215,115.96  
MONTO ACUMULADO DE PAGO REAL = S/ 2,323,141.88

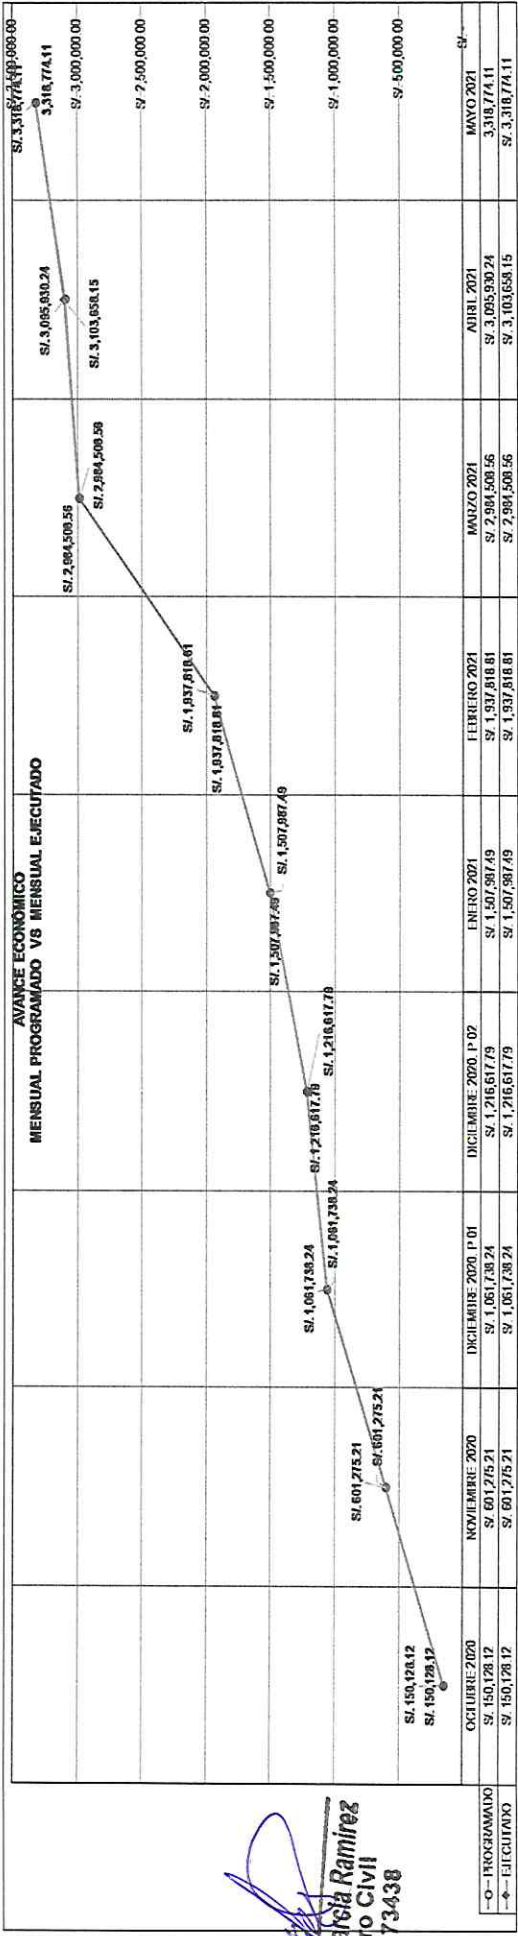

*[Signature]*  
Alexa Ramirez  
Pro Civil  
73438



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

**RESUMEN DE LA VALORIZACION:**

➤ El contratista en el mes de Mayo del 2021 (del 08.05.2021 al 22.05.2021) presenta el siguiente detalle de su valorización N° 09:

		RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA																							
		GOBIERNO REGIONAL DE LORETO																							
		CONSORCIO INAHUAYA																							
		CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO																							
		MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA, DISTRITO DE INAHUAYA - UCAYALI - LORETO																							
		GOBIERNO REGIONAL DE LORETO																							
CONTRATO DE EJECUCION N°		N° 033-2020-GR-L-GR.																							
INICIO DE OBRA		23/10/2020																							
FECHA DE TERMINO DE OBRA		20/04/2021																							
PLAZO CONTRACTUAL		180 DC																							
MONTO DEL CONTRATO		S/. 3,318,774.11 sin IGV.																							
CONTRATO DE CONSULTORIA N°		N° 050-2020-GR-L-GR.																							
INICIO DE OBRA		7/11/2020																							
FECHA DE TERMINO DE OBRA		4/06/2021																							
PLAZO CONTRACTUAL		210 DC																							
MONTO DEL CONTRATO		S/. 249,971.60 sin IGV.																							
MONTOS		NETO		IGV		BRUTA		Valorización Anterior		Porcentaje		Valorización Acumulada		Porcentaje		Saldos por Valorizar		Porcentaje							
Contractual		S/.	3,318,774.11	S/.	318,774.11	S/.	3,318,774.11	OCT. 20		DIC. 20		PERIODO 01: 15 DIAS		PERIODO 02: 18 DIAS		ENE. 21		FEB. 21		MAR. 21		ABR. 21		MAY. 21	
TOTAL		S/.	3,318,774.11	S/.	3,318,774.11			13 DIAS		ADENDA N° 01 - DECRETO DE URGENCIA N° 133-2020		31 DIAS		31 DIAS		31 DIAS		28 DIAS		31 DIAS		56 DIAS		PERIODO: DEL 01 AL 05	
N° de Valorización		Valorización Actual		Porcentaje		Valorización Anterior		Porcentaje		Valorización Acumulada		Porcentaje		Valorización Acumulada		Porcentaje		Saldos por Valorizar		Porcentaje		Saldos por Valorizar		Porcentaje	
Valorización de Obra N° 01		S/150,128.12		4.52%		S/0.00		0.00%		S/150,128.12		4.52%		S/150,128.12		4.52%		S/3,168,645.99		95.48%		S/3,168,645.99		95.48%	
Valorización de Obra N° 02		S/451,147.09		13.59%		S/150,128.12		4.52%		S/601,275.21		18.12%		S/601,275.21		18.12%		S/2,717,468.90		81.88%		S/2,717,468.90		81.88%	
Valorización de Obra N° 03, P 01		S/460,463.03		13.87%		S/601,275.21		18.12%		S/1,061,738.24		31.99%		S/1,061,738.24		31.99%		S/2,257,035.87		68.01%		S/2,257,035.87		68.01%	
Valorización de Obra N° 04, P 02		S/194,879.55		5.87%		S/1,061,738.24		31.99%		S/1,216,617.79		36.66%		S/1,216,617.79		36.66%		S/2,102,156.32		63.34%		S/2,102,156.32		63.34%	
Valorización de Obra N° 05		S/291,369.70		8.78%		S/1,216,617.79		36.66%		S/1,507,987.49		45.44%		S/1,507,987.49		45.44%		S/1,810,786.62		54.56%		S/1,810,786.62		54.56%	
Valorización de Obra N° 06		S/429,831.32		12.95%		S/1,507,987.49		45.44%		S/1,937,818.81		58.39%		S/1,937,818.81		58.39%		S/1,380,955.30		41.61%		S/1,380,955.30		41.61%	
Valorización de Obra N° 07		S/1,046,689.75		31.54%		S/1,937,818.81		58.39%		S/2,984,508.56		89.93%		S/2,984,508.56		89.93%		S/334,265.56		10.07%		S/334,265.56		10.07%	
Valorización de Obra N° 08		S/119,149.59		3.59%		S/2,984,508.56		89.93%		S/3,103,658.15		93.52%		S/3,103,658.15		93.52%		S/215,115.96		6.48%		S/215,115.96		6.48%	
Valorización de Obra N° 09		S/215,115.96		6.48%		S/3,103,658.15		93.52%		S/3,318,774.11		100.00%		S/3,318,774.11		100.00%		S/0.00		0.00%		S/0.00		0.00%	
Item		Descripción		Parcial (S/.)																					
01		ESTRUCTURAS		1,622,932.26				73,321.32		314,006.55		298,382.36		54,119.78		134,715.04		56,097.15		223,287.29		459,055.22		56,097.15	
02		ARQUITECTURA		412,081.92				0.00		0.00		11,226.32		9,124.81		53,083.00		9,124.81		142,708.05		142,708.05		27,205.97	
03		INST. ELECTRICAS		231,018.60				0.00		0.00		0.00		0.00		8,849.19		73,528.84		141,081.77		141,081.77		0.00	
04		INST.SANITARIAS		122,843.10				0.00		0.00		17,626.66		10,367.70		11,882.16		15,719.80		49,860.45		49,860.45		7,324.94	
I.		COSTO DIRECTO		2,388,876.88				73,321.32		314,006.55		327,235.34		100,600.25		208,529.39		321,660.74		792,705.49		90,628.06		180,189.90	
II.		GASTOS GENERALES		238,887.69				7,332.13		31,400.66		32,723.53		10,060.03		20,852.94		32,166.07		79,270.55		9,062.81		16,018.99	
III.		UTILIDAD		512,914.91				15,742.79		67,420.24		70,260.59		21,599.84		44,773.27		69,063.66		170,201.52		19,458.72		34,394.32	
IV.		PLAN COVID		178,084.63				53,731.86		36,319.64		30,243.57		22,619.42		17,214.10		6,940.86		4,512.19		0.00		4,512.19	
SUB TOTAL		3,318,774.11				150,128.12		451,147.09		460,463.02		154,879.55		291,369.70		429,831.32		1,046,689.75		119,149.59		215,115.96		215,115.96	
I.G.V.		0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
PRESUPUESTO DE OBRA		3,318,774.11				150,128.12		451,147.09		460,463.02		154,879.55		291,369.70		429,831.32		1,046,689.75		119,149.59		215,115.96		215,115.96	
PORCENTAJE (%) A VALORIZAR MENSUAL		4.52%		13.59%		4.52%		13.87%		4.67%		13.87%		4.78%		12.95%		31.54%		3.59%		6.48%		6.48%	
PORCENTAJE (%) ACUMULADO MENSUAL		4.52%		18.12%		31.99%		45.44%		58.39%		68.01%		73.53%		79.97%		86.45%		93.03%		99.51%		100.00%	

*Arca Ramirez*  
PRO CIVIL  
73438



#### IV CONCLUSION

- De acuerdo al documento de la referencia 1), asiento N° 181, el Ing. Civil German Antonio Burga Young, da Conformidad a los metrados, e indica al Residente de Obra proceder con la Valorización de Obra N° 09.
- Así mismo mediante Informe N° 012-2021-JS/ABY/INAHUAYA, del Jefe de Supervisión Ing. German Antonio Burga Young, presenta la Conformidad de la Valorización N° 09, correspondiente al mes de Mayo 2021 (Periodo del 08.05.2021 al 22.05.2021); con un avance físico de 6.48 % en dicho periodo.
- Se ha cumplido con presentar toda la documentación pertinente de la Valorización N° 08 del Contratista, correspondiente al mes de Mayo 2021.
- De acuerdo al CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA vigente; el porcentaje de avance programado acumulado para el mes de Mayo 2021 es de 100.00% y el avance acumulado ejecutado del 22.05.2021 es de 100.00%; por lo tanto, la obra se encuentra **Culminada**.

#### V RECOMENDACION

- Continuar con el trámite respectivo para el pago de la Valorización de Obra N° 09, correspondiente al mes de Mayo 2021 (Periodo del 08.05.2021 al 22.05.2021).

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y demás fines.

Atentamente,

Nicia Corín García Ramírez  
Ingeniero Civil

Ing. Nicia Corín García Ramírez  
Coordinador de Obra  
CIP: 73438

Cc. File Personal NCGR



# CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de su Independencia"

279

03 de junio del 2021

## INFORME N° 012-2021-JS/ABY/INAHUAYA.

Sres. **CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO.**

Con atención:

**Sr. Harve QUEVEDO TRIGOSO**

Representante Legal del Consorcio

CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO

*Harve Quevedo Trigoso*  
REPRESENTANTE COMUN

*Recibido 03/06/2021*

Presente.-

Asunto : **REMITE CONFORMIDAD DE VALORIZACION DE OBRA N° 009 - MAYO 2021**

Obra: "Mejoramiento del Servicio de Embarque y Desembarque de Pasajeros en el Embarcadero Principal de la Localidad de Inahuaya, distrito de Inahuaya – Ucayali – Loreto"

Ref. : a) Carta N° 016-2021-CI.  
b) Acta de Suspensión del Plazo de Ejecución del Contrato N° 033-2020-GRL-GRI. Firmado el 20/04/2021.  
c) Acta de Suspensión del Plazo de Ejecución del Contrato N° 033-2020-GRL-GRI. Firmado el 20/05/2021.  
d) Acta de Reinicio del Plazo de Ejecución del Contrato N° 033-2020-GRL-GRI. Firmado el 21/05/2021.

CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO  
ING. CIVIL GERMAN ANTONIO BURGAYOUNG  
JEFE DE SUPERVISIÓN

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de remitir la VALORIZACIÓN DE OBRA N° 009 correspondiente al mes de MAYO del 2021, en 01 original y 03 copias, la misma que se encuentra con un avance físico mensual del 6.48% y un acumulado de 100.00%, cuyo neto a cobrar por el contratista (Ejecutor de Obra) asciende a S/. 215,115.96 (Doscientos Quince Mil Ciento Quince con 96/100 Soles), de los trabajos ejecutados en la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA DEL DISTRITO DE INAHUAYA – PROVINCIA DE UCAYALI – DEPARTAMENTO DE LORETO" por la firma Contratista **CONSORCIO INAHUAYA**, en el periodo del 08/05/2021 al 22/05/2021.

A la vez de acuerdo a lo indicado en el asunto, se ha elaborado la solicitud de pago de Obra al mes de MAYO 2021, cuyo detalle es el siguiente:

1.	Valorización Bruta N° 09 – MAYO 2021	S/.	215,115.96
2.	Reajuste Neto (+)	S/.	0.00
3.	Amortización de Adelanto Directo (-)	S/.	0.00
4.	Amortización de Adelanto Materiales (-)	S/.	0.00
	<b>NETO A FACTURAR</b>	S/.	<b>215,115.96</b>
5.	Garantía de Fiel Cumplimiento	S/.	0.00
	<b>NETO A PAGAR</b>	S/.	<b>215,115.96</b>



210

# CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO

*Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines pertinentes.*


*Atentamente,*

CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO

*German*  
-----  
ING. CIVIL GERMAN ANTONIO BURGA YOUNG  
JEFE DE SUPERVISION  
-----

*Ing. Civil German Antonio Burga Young.  
Registro CIP N° 135094.*

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
 Sub Gerencia de Supervisión y Control  
 07 JUN 2021  
 Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_  
 N° Reg: \_\_\_\_\_



# CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO

Iquitos, 04 de junio del 2021  
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
 OFICINA DE ADM. DOCUMENTARIA  
 UNIDAD TRAMITE DOCUMENTARIO  
 13227  
 04 JUN 2021  
 Hora: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
 CONTROL RECEPCION

**CARTA N° 021-2021-CSE**

Señores:  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**  
**GOBIERNO REGIONAL DE LORETO**  
 Atención:  
**SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL**

Asunto  
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
 Ref. OBRA  
 07 JUN. 2021  
 Hora: 10.06. am  
 Reg. N° \_\_\_\_\_

**REMITE VALORIZACION DE OBRA N° 009**  
**MAYO 2021**  
 : OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA DEL DISTRITO DE INAHUAYA - PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO DE LORETO"  
 Contrato N° 033-2020-GRL-GRI  
 a) Carta N° 016-2021/CI  
 b) Informe N° 012-2021-JS/ABY/INAHUAYA

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de remitir la **VALORIZACIÓN DE OBRA N° 009** correspondiente al mes de **MAYO del 2021**, en **01 original y 03 copias**, la misma que se encuentra con un avance físico mensual del 6.48% y un acumulado de 100.00%, cuyo neto a cobrar por el contratista (Ejecutor de Obra) asciende a **S/. 215,115.96 (Doscientos Quince Mil Ciento Quince con 96/100 Soles)**, de los trabajos ejecutados en la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA DEL DISTRITO DE INAHUAYA - PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO DE LORETO" por la firma Contratista **CONSORCIO INAHUAYA**, en el periodo del **08/05/2021 al 22/05/2021**.

A la vez de acuerdo a lo indicado en el asunto, se ha elaborado la solicitud de pago de Obra al mes de **MAYO 2021**, cuyo detalle es el siguiente:

1.	Valorización Bruta N° 009 – MAYO 2021	S/.	215,115.96
2.	Reajuste Neto (+)	S/.	0.00
3.	Amortización de Adelanto Directo (-)	S/.	0.00
4.	Amortización de Adelanto Materiales (-)	S/.	0.00
	<b>NETO A FACTURAR</b>	<b>S/.</b>	<b>215,115.96</b>
5.	Garantía de Fiel Cumplimiento	S/.	0.00
	<b>NETO A PAGAR</b>	<b>S/.</b>	<b>215,115.96</b>

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

**CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO**

*Harve Quevedo Triguero*  
**REPRESENTANTE COMÚN**

13227  
 SCSYC - GRI  
 Alencón  




# CONSORCIO INAHUAYA

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

217

INAHUAYA, 03 DE JUNIO DEL 2021

**CARTA N° 016 -2021/C.I.**

**SEÑORES:  
CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO**

**ATENCION:  
ING. GERMAN ANTONIO BURGA YOUNG  
JEFE DE SUPERVISION**

CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO  
ING. GERMAN ANTONIO BURGA YOUNG  
JEFE DE SUPERVISION  
03/06/2021  
Recibido

**Presente.**

**ASUNTO : REMITO VALORIZACION DE OBRA N° 09  
DEL 08/05/2021 al 22/ 05/2021.**

**REFERENCIA : a) Contrato de Ejecución de Obra N° 033-2020-GRL-GRI  
b) Acta de Suspensión de Ejecucion N° 01 de Fecha 20/04/21  
c) Acta de Suspensión de Ejecucion N° 02 de Fecha 20/05/21  
d) Acta de Reinicio de Obra de Fecha 21/05/21**

**Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EMBARQUE Y  
DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN EL EMBARCADERO  
PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA, DISTRITO  
DE INAHUAYA**

De mi especial consideración, sirva el presente para saludarlo cordialmente y en mérito al asunto, remitirle adjunto la valorización de obra N° 09 correspondiente al mes de MAYO 2021: Del 08 al 22 de MAYO 2021.

Queda a su disposición los presentes documentos para su respectiva gestión ante el Gobierno Regional de Loreto.

Sin otro particular, y en espera de la atención que le brinde a la presente, quedo de Ud.

Atentamente,

CONSORCIO INAHUAYA  
Jose Heinz Vargas Llanos  
REPRESENTANTE COMÚN

\*\*\*\*\*

**VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA N° 06.  
ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS**

MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA - UCAYALI - LORETO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

N° 033-2020-GR-L-ORL

LICITACION PÚBLICA N° 003-2019-CSO-GR-L-PRIMERA CONVOCATORIA

5/3.318.744.11

CONSORCIO INAHUAYA

CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO

180 DIAS CALENDARIO

DEL 06 AL 29 DE ABRIL DEL 2021 - FIRMADO EL 20/04/2021

DEL 23 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DEL 2021 - FIRMADO EL 20/05/2021

20/05/2021

LORETO - UCAYALI - INAHUAYA



CONSORCIO INAHUAYA  
Historia de la Tawantia  
RESISTENTE DE OBRA  
CIH N° 93682

CONSORCIO INAHUAYA  
Jose Heinz Vargas Llanos  
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO  
ING CNL GERMAN ANTONIO BURGAS YOUNG  
JEFE DE SUPERVISIÓN

DESCRIPCIÓN		UNO	CANT	P/U	PASAJEROS	METRAO	VALORIZADO	N	VALORIZADO	%	METRAO	VALORIZADO	%	METRAO	VALORIZADO	N
DESCRIPCIÓN																
DESCRIPCIÓN																
<b>EXTRACTOS</b>																
<b>OBRAS PRINCIPALES</b>																
GRONAS, S&H, ALMACÉN, CAJETAS DE GUARDIA Y VESTIARIOS	m <sup>2</sup>	6,00	1.480,00		8.880,00											
CARTEL DE OBRA (8,50 x 3,50) BANNER KC MATERIALES	und	1,00	841,12		841,12											
SERVO PROYONAL DE CALAMBA (10 x 10m)	m	100,00	51,93		5.193,00											
<b>TRABAJO PUNTO DEPARTAMENTO</b>																
FLETE TERRESTRE PUCALLPA - INAHUAYA	ton	638,67	14,33		9.158,01											
FLETE TERRESTRE LIMA - INAHUAYA	ton	16,00	30,00		480,00											
FLETE FLUVIAL PUCALLPA - INAHUAYA	ton	652,70	70,39		46.074,09											
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN FLUVA DE EQUIPO PUCALLPA - INAHUAYA	ton	69,76	63,37		4.420,19											
AMPLIFICACIÓN DE TERRENO MARAFI	m <sup>2</sup>	3.412,53	1,09		3.719,65											
TALA Y TIERRO DE ÁRIDOS	m <sup>3</sup>	1,00	39,87		39,87											
ACABO DE MATERIAL ORGÁNICO (MADERA, BAMBUSA, DESMORNE) EN COBRETELLO	m <sup>3</sup>	16,00	29,29		468,64											
EMPAQUETE DE MATERIAL ORGÁNICO A BOTADERO D=51cm (Llaves Mosquetero)	m <sup>3</sup>	90,58	9,55		865,98											
TRAZADO Y REPARTE DEL MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN	m <sup>3</sup>	3.000,00	2,00		6.000,00											
TRAZADO Y REPARTE DEL MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN	m <sup>3</sup>	3.412,53	2,19		7.474,44											
MUELTIPLICACIÓN DE ANILLO Y HARTILLO PARA RECIPIENTE DE FLOTES	m <sup>2</sup>	1,00	5.304,48		5.304,48											
<b>GENERALES Y OBRAS DE OBRAS</b>																
DESMORTE DE COBERTURA DE CALAMBA CAL VARIADA (CORTIZAS Y CLAMBE)	m <sup>2</sup>	77,18	4,41		341,57											
DESMORTE DE PISO Y VEREDAS E=4" OCEJOUPO LAMINO	m <sup>2</sup>	45,78	17,76		811,63											
DESMORTE DE PUERTAS DE MADERA	und	2,00	26,00		52,00											
DESMORTE DE VENTANAS METALICAS	m <sup>2</sup>	5,80	38,10		220,78											
DESMORTE DE ESTRUCTURA DE CONCRETO EXISTENTE OCEJOUPO LAMINO	m <sup>3</sup>	56,50	167,46		9.459,39											
EMPAQUETE DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICIÓN D=10cm (Llaves Mosquetero)	m <sup>3</sup>	91,93	9,55		877,93											
<b>SEGURIDAD Y SALUD</b>																
ELABORACIÓN, MNT, EMERGENCIA Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	GLB	1,00	600,00		600,00											
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	und	5,00	61,50		307,50											
EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA GRUPO DE 05	GRUP	1,00	2.447,50		2.447,50											
SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA DE DISEÑO Y SEGURIDAD EN ZONA DE TRABAJO	m <sup>2</sup>	6,00	274,82		1.648,92											
RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA OBRA	GLB	1,00	238,00		238,00											
CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD	m <sup>2</sup>	4,00	650,00		2.600,00											
<b>PLANO DE EMERGENCIAS</b>																
TRAZADO, INVIOLACIÓN Y REPORTE DE ETAPAS (ECONOMÍA, RELLENO)	m <sup>2</sup>	848,00	2,74		2.323,52											
CORTE DE TERRENO DE TIERRA BLANCA (CERCA PERIMETRO, Llave de Seguridad)	m <sup>2</sup>	1.807,76	7,17		13.000,80											
RELLENO Y COMP. CIMENTACIÓN DE PESTAJOS (ARCILLA LAMOSO) C/CEMPO LAMINO	m <sup>3</sup>	2.095,50	91,83		191.978,25											
SUBSIDIO REFERENCIAL CON TERRAPLENOS EN ZONAS DE RELLENO	und	283,00	247,13		70.037,79											
EMPAQUETE DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO D=10cm (Llaves Mosquetero)	m <sup>3</sup>	2.398,00	9,55		22.902,50											
<b>CONSTRUCCIÓN DE EMBARCADERO EN OBRAS DE OBRAS</b>																
TRAZADO Y REPORTE EN EDIFICACIONES DURANTE ELEG DE OBRA	m <sup>2</sup>	148,53	9,99		1.485,28											
RECONSTRUCCIÓN DE EMBARCADERO	m <sup>2</sup>	75,24	14,11		1.066,88											
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE BATA	m <sup>2</sup>	72,00	290,11		20.867,72											
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE BATA	m <sup>2</sup>	31,60	59,93		1.895,79											
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE BATA	m <sup>2</sup>	31,60	21,77		687,99											
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE BATA	m <sup>2</sup>	31,60	9,55		301,78											
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE BATA	m <sup>2</sup>	45,00	35,00		1.575,00											
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE BATA	m <sup>2</sup>	775,33	4,65		3.584,50											

**VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA N° 07**  
**ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS**

MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA - DCAVALI - LORETO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

N° 003-2008-GRU-GRU

17/3/18/744.11

CONSORCIO INAHUAYA

CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO

180 DIAS CALENDARIO

DEL 06 AL 30 DE ABRIL DEL 2021 - FIRMAO EL 2006/0201

DEL 23 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DEL 2021 - FIRMAO EL 2005/0201

N° 2009/2281

(LORETO) - (UCAVALI) - (INAHUAYA)

CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO

ING. CHIL GERMAN ANTONIO BUNGA YOUNG

JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO INAHUAYA

Jose Héctor Vargas Llanos

REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO INAHUAYA

Hilton Vargas Llanos

RESIDENTE DE OBRA

CIP N° 138812



LÍNEA	CANT.	P.U.	PARCIAL	AVANCE ACTUAL			AVANCE ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACUMULADO ACTUAL			BALDO POR VALORIZAR		
				RETRASO	VALORIZADO	%	RETRASO	VALORIZADO	%	RETRASO	VALORIZADO	%	RETRASO	VALORIZADO	%
m2	45.00	41.35	2,064.38	-	0.00%	45.00	2,044.28	100.00%	0.00%	2,044.28	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
m2	18.00	57.83	1,040.94	-	0.00%	18.00	1,037.34	100.00%	0.00%	1,037.34	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
m3	45.00	8.99	404.55	-	0.00%	45.00	398.74	100.00%	0.00%	398.74	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
kg	471.56	4.49	2,118.26	-	0.00%	471.56	2,113.49	100.00%	0.00%	2,113.49	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
m2	28.88	118.05	3,408.52	-	0.00%	28.88	3,391.52	100.00%	0.00%	3,391.52	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
m3	1.81	607.79	1,100.00	-	0.00%	1.81	1,090.00	100.00%	0.00%	1,090.00	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
m2	28.88	10.14	292.84	-	0.00%	28.88	292.84	100.00%	0.00%	292.84	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
m3	28.88	1.89	54.58	-	0.00%	28.88	54.58	100.00%	0.00%	54.58	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
kg	343.24	4.69	1,609.80	-	0.00%	343.24	1,604.80	100.00%	0.00%	1,604.80	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
m2	32.40	76.60	2,482.56	-	0.00%	32.40	2,470.56	100.00%	0.00%	2,470.56	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
m3	2.70	657.78	1,776.57	-	0.00%	2.70	1,761.57	100.00%	0.00%	1,761.57	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
m2	32.40	16.40	531.84	-	0.00%	32.40	531.84	100.00%	0.00%	531.84	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
m2	32.40	1.89	61.33	-	0.00%	32.40	61.33	100.00%	0.00%	61.33	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
kg	1,971.74	4.69	9,247.46	-	0.00%	1,971.74	9,247.46	100.00%	0.00%	9,247.46	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
m2	143.43	79.46	11,400.47	-	0.00%	143.43	11,400.47	100.00%	0.00%	11,400.47	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
m3	25.47	667.38	16,999.56	-	0.00%	25.47	16,999.56	100.00%	0.00%	16,999.56	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
m2	143.43	9.61	1,378.35	-	0.00%	143.43	1,378.35	100.00%	0.00%	1,378.35	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
m2	138.71	1.62	224.71	-	0.00%	138.71	224.71	100.00%	0.00%	224.71	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
m2	126.48	8.89	1,120.89	-	0.00%	126.48	1,120.89	100.00%	0.00%	1,120.89	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
m2	29.44	14.11	415.50	-	0.00%	29.44	415.50	100.00%	0.00%	415.50	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
m2	11.15	92.14	1,028.56	-	0.00%	11.15	1,028.56	100.00%	0.00%	1,028.56	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
m2	74.00	203.11	14,948.36	-	0.00%	74.00	14,948.36	100.00%	0.00%	14,948.36	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
m2	33.32	71.34	2,376.48	-	0.00%	33.32	2,376.48	100.00%	0.00%	2,376.48	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
m2	21.75	217.75	4,736.81	-	0.00%	21.75	4,736.81	100.00%	0.00%	4,736.81	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
m2	23.75	9.05	215.13	-	0.00%	23.75	215.13	100.00%	0.00%	215.13	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
m2	25.40	20.03	508.85	-	0.00%	25.40	508.85	100.00%	0.00%	508.85	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
m2	30.00	14.11	423.30	-	0.00%	30.00	423.30	100.00%	0.00%	423.30	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
m2	4.69	303.29	1,413.42	-	0.00%	4.69	1,413.42	100.00%	0.00%	1,413.42	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
m2	48.00	31.20	1,497.60	-	0.00%	48.00	1,497.60	100.00%	0.00%	1,497.60	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
m2	10.32	37.63	388.14	-	0.00%	10.32	388.14	100.00%	0.00%	388.14	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
m2	31.29	6.99	218.69	-	0.00%	31.29	218.69	100.00%	0.00%	218.69	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
kg	591.10	4.49	2,652.14	-	0.00%	591.10	2,652.14	100.00%	0.00%	2,652.14	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
m2	31.15	45.66	1,422.54	-	0.00%	31.15	1,422.54	100.00%	0.00%	1,422.54	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
m2	3.69	37.63	138.85	-	0.00%	3.69	138.85	100.00%	0.00%	138.85	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
m2	31.15	6.99	217.74	-	0.00%	31.15	217.74	100.00%	0.00%	217.74	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
m2	40.29	1.66	66.88	-	0.00%	40.29	66.88	100.00%	0.00%	66.88	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
kg	302.50	4.69	1,419.83	-	0.00%	302.50	1,419.83	100.00%	0.00%	1,419.83	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
m2	26.03	116.16	3,024.83	-	0.00%	26.03	3,024.83	100.00%	0.00%	3,024.83	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
m3	3.00	697.38	2,092.14	-	0.00%	3.00	2,092.14	100.00%	0.00%	2,092.14	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
m2	35.93	10.14	363.93	-	0.00%	35.93	363.93	100.00%	0.00%	363.93	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
m2	28.93	1.81	52.26	-	0.00%	28.93	52.26	100.00%	0.00%	52.26	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	

**VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA N° 001  
ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS**

MEJORAMIENTO DE SERVIDO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA, DISTRITO DE INAHUAYA - UCAYALI - LORETO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

N° 003-2023-GR-GR

LICITACION PUBLICA N° 033-2019-C50-GR-PRIMERA CONVOCATORIA  
5/3.318.744.11

CONSORCIO INAHUAYA

CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO

180 DIAS CALENDARIO

DEL 08 AL 22 DE ABRIL DEL 2023 - FIRMANDO EL 20/04/2021

DEL 23 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DEL 2021 - FIRMANDO EL 20/05/2021

N° 2305202021

(LORETO) - (UCAYALI) - (INAHUAYA)



**CONSORCIO INAHUAYA**  
*Jose Heinz Vargas Llanos*  
REPRESENTANTE COMUN

**CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO**  
*ING. OML GERMAN ANTONIO BURGAS YOUNG*  
JEFE DE SUPERVISIÓN

**CONSORCIO INAHUAYA**  
*Hilton Maria Yavara*  
REPRESENTANTE DE OBRA  
CIP N° 93882

DESCRIPCIÓN	UNIDADES ACTUALES			AVANCE ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR		
	UMD	CANT	P.U.	RETENIDO	VALORIZADO	%	RETENIDO	VALORIZADO	%	RETENIDO	VALORIZADO	%
<b>ACEROS</b>												
ACERO GRADO 60 Fy=4200 Kg/cm <sup>2</sup> EN VIGAS	kg	852.44	4.69		4.152.71	100.00%	852.44	4.152.71	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
ENCORFADO CARAVISTA EN VIGAS	m <sup>2</sup>	89.34	70.40		5.655.94	100.00%	89.34	5.655.94	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
MORTERO F c=210 Kg/cm <sup>2</sup> EN VIGAS	m <sup>3</sup>	7.29	607.78		4.431.78	100.00%	7.30	4.431.78	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
DESEMCOFADO EN VIGAS	m <sup>2</sup>	80.34	38.40		842.27	100.00%	80.34	842.27	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
CUARDO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	m <sup>2</sup>	80.34	1.80		144.61	100.00%	80.34	144.61	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
<b>ACEROS EN PÓSTICOS INCLINADOS</b>												
ACERO GRADO 60 Fy=4200 Kg/cm <sup>2</sup>	kg	2.589.00	4.69		12.141.47	100.00%	2.589.00	12.141.47	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
ENCORFADO CARAVISTA EN LOSA MACIZA H=20cm	m <sup>2</sup>	101.57	70.40		7.150.53	100.00%	101.57	7.150.53	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
MORTERO Fc=210 Kg/cm <sup>2</sup> EN LOSA MACIZA	m <sup>3</sup>	20.31	637.78		12.944.01	100.00%	20.31	12.944.01	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
DESEMCOFADO EN LOSA	m <sup>2</sup>	101.57	9.00		915.15	100.00%	101.57	915.15	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
CUARDO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	m <sup>2</sup>	101.57	1.80		182.83	100.00%	101.57	182.83	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
<b>CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, CAJETERA, EN LA DE ESPERANA Y DEBARRERAS PARA LOS VEHICULOS</b>												
TRAMO EN LA Y REPARACIÓN EN EMBARCADERO EN MATERIAL LIGERO DE CERRA	m <sup>2</sup>	178.16	5.80		1.030.36	100.00%	178.16	1.030.36	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
<b>INSTRUMENTACIÓN</b>												
EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS DE 2m x 3m DE PROFUNDIDAD (Unidad Reubicación)	m <sup>3</sup>	45.90	14.11		646.24	100.00%	45.90	646.24	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
EXCAVACIÓN PARA VIGAS DE DIVERSIFICACIÓN DE 2m x 3m DE PROFUNDIDAD - Muro de	m <sup>3</sup>	13.10	53.14		693.07	100.00%	13.10	693.07	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
RAJADO DE PILOTOS DE MADERA DE 5x7 L=3.6m	ud	81.00	593.11		31.558.81	100.00%	81.00	31.558.81	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
RAJADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO (CARGA) 10x10x10 EN CARGAS DE 0.20m	m <sup>3</sup>	29.07	71.24		2.063.35	100.00%	29.07	2.063.35	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
ACAPARQUE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES PARA EL DISEÑO DE CIMENTACIÓN	m <sup>3</sup>	25.78	21.72		559.94	100.00%	25.78	559.94	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
ELABORACIÓN DE MATERIAL EXCELENTE A BOTADERO D=16m (Unidad Reubicación)	m <sup>3</sup>	25.78	9.55		246.20	100.00%	25.78	246.20	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
<b>CIMENTACIÓN DE CONCRETO SIMPLE</b>												
SOLADO DE MORTERO E=1" MEZCLA 1:1:2 CEMENTO-ARENA	m <sup>2</sup>	28.42	30.69		1.110.65	100.00%	28.42	1.110.65	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
<b>ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO</b>												
ACERO GRADO 60 Fy=4200 Kg/cm <sup>2</sup> EN ZAPATAS	kg	375.89	4.69		1.763.29	100.00%	375.89	1.763.29	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
ENCORFADO DE ZAPATAS	m <sup>2</sup>	32.48	45.05		1.459.62	100.00%	32.48	1.459.62	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
MORTERO F c=210 Kg/cm <sup>2</sup> EN ZAPATAS	m <sup>3</sup>	11.15	577.63		6.411.60	100.00%	11.15	6.411.60	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
DESEMCOFADO EN ZAPATAS	m <sup>2</sup>	32.48	6.58		212.48	100.00%	32.48	212.48	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
<b>REBARRE DE CONCRETO</b>												
ACERO GRADO 60 Fy=4200 Kg/cm <sup>2</sup> EN VIGAS DE CIMENTACIÓN	kg	587.79	4.69		2.734.55	100.00%	587.79	2.734.55	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
ENCORFADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN	m <sup>2</sup>	32.17	45.61		1.475.32	100.00%	32.17	1.475.32	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
MORTERO F c=210 Kg/cm <sup>2</sup> EN VIGAS DE CIMENTACIÓN	m <sup>3</sup>	4.02	577.63		2.322.07	100.00%	4.02	2.322.07	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
DESEMCOFADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN	m <sup>2</sup>	32.17	6.58		214.87	100.00%	32.17	214.87	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
CUARDO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	m <sup>2</sup>	41.29	1.80		74.32	100.00%	41.29	74.32	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
<b>Columnas F=4.47m</b>												
ACERO GRADO 60 Fy=4200 Kg/cm <sup>2</sup> EN COLUMNAS	kg	659.40	4.69		3.093.19	100.00%	659.40	3.093.19	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
ENCORFADO CARAVISTA EN COLUMNAS	m <sup>2</sup>	64.76	116.05		7.497.20	100.00%	64.76	7.497.20	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
MORTERO F c=210 Kg/cm <sup>2</sup> EN COLUMNAS	m <sup>3</sup>	4.55	607.78		2.758.46	100.00%	4.55	2.758.46	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
DESEMCOFADO EN COLUMNAS	m <sup>2</sup>	64.76	10.14		658.95	100.00%	64.76	658.95	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
CUARDO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	m <sup>2</sup>	64.76	1.80		116.57	100.00%	64.76	116.57	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
<b>VIGAS</b>												
ACERO GRADO 60 Fy=4200 Kg/cm <sup>2</sup> EN VIGAS	kg	2.711.53	4.69		10.372.37	100.00%	2.711.53	10.372.37	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
ENCORFADO CARAVISTA EN VIGAS	m <sup>2</sup>	237.59	70.40		16.729.34	100.00%	237.59	16.729.34	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
MORTERO F c=210 Kg/cm <sup>2</sup> EN VIGAS	m <sup>3</sup>	27.91	607.78		15.924.24	100.00%	27.91	15.924.24	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
DESEMCOFADO EN VIGAS	m <sup>2</sup>	237.59	19.45		2.492.22	100.00%	237.59	2.492.22	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
CUARDO DE CONCRETO CON CURADOR TIPO MEMBRANA	m <sup>2</sup>	237.59	1.80		427.66	100.00%	237.59	427.66	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
<b>LEPAS EN MORTERO EN VIGAS</b>												
ACERO GRADO 60 Fy=4200 Kg/cm <sup>2</sup>	kg	3.952.45	4.69		18.253.99	100.00%	3.952.45	18.253.99	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
ENCORFADO CARAVISTA EN LOSA MACIZA H=20cm	m <sup>2</sup>	124.06	131.81		17.639.61	100.00%	124.06	17.639.61	100.00%	0.00	0.00%	0.00%

192















**VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA N° 4  
ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS**

\*MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA, DISTRITO DE INAHUAYA - UCAYALI - LORETO\*

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

N° 033-2020-GR-L-ORI.

LICITACION PUBLICA N° 033-2019-CSO-GR-L-PRIMERA CONVOCATORIA.

S/ 3.318.744,11

CONSORCIO INAHUAYA

CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO

180 DIAS CALENDARIO

DEL 06 AL 22 DE ABRIL DEL 2021 - FIRMADO EL 20/04/2021

DEL 23 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DEL 2021 - FIRMADO EL 20/05/2021

20/05/2021

(LORETO) - (UCAYALI) - (INAHUAYA).



**CONSORCIO INAHUAYA**  
Hilario Zaldívar Tardara  
RESIDENTE DE OBRA  
CIP: N° 93662

**CONSORCIO INAHUAYA**  
Jose Heinz Vargas Llanos  
REPRESENTANTE COMÚN

**CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO**  
Ing CIVIL GERMAN ANTONIO BURGA YOUNG  
JEFE DE SUPERVISION

DESCRIPCIÓN	UND	CANT	P.U.	PARCIAL	AVANCE ACTUAL			AVANCE ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR		
					HETRADO	VALORIZADO	%	HETRADO	VALORIZADO	%	HETRADO	VALORIZADO	%	HETRADO	VALORIZADO	%
JUNTA DE DILATACION E=12,5mm. EN PISO CON SELLO ASPALTICO	m	23,60	11,25		9,41	105,26	40,00%	14,18	159,30	60,00%	23,60	265,50	100,00%	0,00	-	0,00%
<b>LIQUIDO DE CORTECHION DE CONCRETO ARMADO</b>																
TRAZO NIVEL Y REPLANTEO	m <sup>2</sup>	130,70	5,64				0,00%	130,70	737,15	100,00%	130,70	737,15	100,00%	0,00	-	0,00%
EXCAVACION DE ZANJA MANUAL EN TERRENO ARCILLOSO	m <sup>3</sup>	162,73	43,45				0,00%	162,73	7.072,25	100,00%	162,73	7.072,25	100,00%	0,00	-	0,00%
RELLENO Y COMP. CAMA MATERIAL DE PRESTAMO (ARCILLA O LIMOS) CEGUPO (MAN)	m <sup>3</sup>	60,62	91,83				0,00%	60,62	7.403,33	100,00%	60,62	7.403,33	100,00%	0,00	-	0,00%
REFINE Y NIVELACION MANUAL DE FONDOS DE EXCAVACION DE h=0,15m - 0,20m	m <sup>2</sup>	184,55	6,46				0,00%	184,55	1.192,28	100,00%	184,55	1.192,28	100,00%	0,00	-	0,00%
MEJORAMIENTO DE SUELO CON MATERIAL DE PRESTAMO ARENA: ARCILLA (80%);	m <sup>3</sup>	38,91	174,70				0,00%	38,91	6.448,18	100,00%	38,91	6.448,18	100,00%	0,00	-	0,00%
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30,00 MT (A MANO USANDO CARRE)	m <sup>3</sup>	211,15	32,59				0,00%	211,15	6.881,38	100,00%	211,15	6.881,38	100,00%	0,00	-	0,00%
SOLADO DE MORTERO E=4" MEZCLA 1:1:2 CEMENTO-ARENA	m <sup>2</sup>	184,55	39,08				0,00%	184,55	7.212,60	100,00%	184,55	7.212,60	100,00%	0,00	-	0,00%
MORTERO F=210kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	107,77	60,78				0,00%	107,77	65.500,45	100,00%	107,77	65.500,45	100,00%	0,00	-	0,00%
ENCORRADO Y DESENCORRADO	m <sup>2</sup>	57,22	45,59				0,00%	57,22	26.081,51	100,00%	57,22	26.081,51	100,00%	0,00	-	0,00%
ACERO GRADO 60 Fy=490 Kg/cm <sup>2</sup>	kg	5.690,17	4,69				0,00%	5.690,17	26.640,00	100,00%	5.690,17	26.640,00	100,00%	0,00	-	0,00%
JUNTA DE DILATACION CON WATER STOP ANCHO=4" SUMINISTRO Y COLOCACION	m	41,65	23,71				0,00%	41,65	1.195,77	100,00%	41,65	1.195,77	100,00%	0,00	-	0,00%
<b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>							0,61%		1.612.984,68	99,39%		1.612.984,68	100,00%			0,00%
<b>GASTOS GENERALES (10,00%)</b>							0,61%		161.298,47	99,39%		161.298,47	100,00%			0,00%
<b>UTILIDAD (21,47%)</b>							0,61%		346.353,37	99,39%		346.353,37	100,00%			0,00%
<b>SUB TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>							0,61%		2.120.636,52	99,39%		2.120.636,52	100,00%			0,00%
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							0,61%		2.120.636,52	99,39%		2.120.636,52	100,00%			0,00%

185



70



CONSORCIO INAHUAYA  
Hitton Vargas Llanos  
RESIDENTE DE OBRA  
CIPN 93662

CONSORCIO INAHUAYA  
Jose Hitton Vargas Llanos  
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO  
ING CIVIL GERMAN ANTONIO BERGOLONG  
JEFE DE SUPERVISIÓN

### VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA N° 033 ESPECIALIDAD ARQUITECTURA.

MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA, DISTRITO DE INAHUAYA - UCAYALI - LORETO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
N° 033-2020-GRL-GRJ

LICITACION PÚBLICA N° 033-2019-CO-SO-GRL-PRIMERA CONVOCATORIA

S/3.318.744,11

CONSORCIO INAHUAYA

CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO

160 DIAS CALENDARIO

DEL 06 AL 22 DE ABRIL DEL 2021 - FIRMADO EL 20/04/2021

DEL 23 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DEL 2021 - FIRMADO EL 20/05/2021

Obra: 2/20/2021

(LORETO) - (UCAYALI) - (INAHUAYA)

DESCRIPCION				AVANCE ACTUAL			AVANCE ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR		
UNID	CANT	P.U.	PARCIAL	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%
m <sup>2</sup>	77,65	41,15	3.195,71	77,65	3.195,71	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	77,65	3.195,71	100,00%	0,00	0,00%
SEC	5,00	500,00	2.500,00	5,00	2.500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,00	2.500,00	100,00%	0,00	0,00%
m <sup>2</sup>	43,00	243,35	10.474,37	43,00	10.474,37	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	43,00	10.474,37	100,00%	0,00	0,00%
m <sup>2</sup>	53,20	15,18	833,12	53,20	833,12	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	53,20	833,12	100,00%	0,00	0,00%
m <sup>2</sup>	29,71	128,42	3.755,94	29,71	3.755,94	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	29,71	3.755,94	100,00%	0,00	0,00%
m <sup>2</sup>	39,21	118,66	4.652,65	39,21	4.652,65	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	39,21	4.652,65	100,00%	0,00	0,00%
lps	2,00	1.202,02	2.404,04	2,00	2.404,04	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,00	2.404,04	100,00%	0,00	0,00%
m <sup>2</sup>	108,13	32,56	3.520,71	108,13	3.520,71	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	108,13	3.520,71	100,00%	0,00	0,00%
m <sup>2</sup>	68,50	37,75	2.575,48	68,50	2.575,48	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	68,50	2.575,48	100,00%	0,00	0,00%
m <sup>2</sup>	46,14	46,14	2.069,83	46,14	2.069,83	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	46,14	2.069,83	100,00%	0,00	0,00%
m <sup>2</sup>	31,73	11,05	353,93	31,73	353,93	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	31,73	353,93	100,00%	0,00	0,00%
m <sup>2</sup>	8,25	130,74	1.078,51	8,25	1.078,51	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	8,25	1.078,51	100,00%	0,00	0,00%
m <sup>2</sup>	11,90	13,01	154,82	11,90	154,82	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	11,90	154,82	100,00%	0,00	0,00%
m <sup>2</sup>	138,63	65,72	9.111,01	138,63	9.111,01	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	138,63	9.111,01	100,00%	0,00	0,00%
m <sup>2</sup>	13,14	62,45	820,59	13,14	820,59	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	13,14	820,59	100,00%	0,00	0,00%
m <sup>2</sup>	88,68	30,57	2.688,81	88,68	2.688,81	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	88,68	2.688,81	100,00%	0,00	0,00%
m <sup>2</sup>	60,10	94,16	5.652,02	60,10	5.652,02	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	60,10	5.652,02	100,00%	0,00	0,00%
m <sup>2</sup>	13,25	63,11	835,21	13,25	835,21	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	13,25	835,21	100,00%	0,00	0,00%
m <sup>2</sup>	13,34	63,11	841,69	13,34	841,69	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	13,34	841,69	100,00%	0,00	0,00%
m <sup>2</sup>	1,76	52,62	92,61	1,76	92,61	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,76	92,61	100,00%	0,00	0,00%
m <sup>2</sup>	6,63	52,72	348,53	6,63	348,53	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,63	348,53	100,00%	0,00	0,00%
m <sup>2</sup>	18,26	15,54	284,94	18,26	284,94	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	18,26	284,94	100,00%	0,00	0,00%
m <sup>2</sup>	13,65	69,39	936,64	13,65	936,64	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	13,65	936,64	100,00%	0,00	0,00%
UND	1,00	1.052,09	1.052,09	1,00	1.052,09	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,00	1.052,09	100,00%	0,00	0,00%
UND	1,00	1.118,76	1.118,76	1,00	1.118,76	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,00	1.118,76	100,00%	0,00	0,00%
m <sup>2</sup>	22,83	228,25	5.245,93	22,83	5.245,93	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	22,83	5.245,93	100,00%	0,00	0,00%
UND	8,00	20,28	162,24	8,00	162,24	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	8,00	162,24	100,00%	0,00	0,00%
UND	2,00	112,98	225,96	2,00	225,96	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,00	225,96	100,00%	0,00	0,00%
m <sup>2</sup>	370,94	3,85	1.428,12	370,94	1.428,12	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	370,94	1.428,12	100,00%	0,00	0,00%
m <sup>2</sup>	108,13	11,13	1.203,46	108,13	1.203,46	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	108,13	1.203,46	100,00%	0,00	0,00%
m <sup>2</sup>	113,04	12,01	1.357,61	113,04	1.357,61	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	113,04	1.357,61	100,00%	0,00	0,00%
m <sup>2</sup>	149,77	12,01	1.798,74	149,77	1.798,74	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	149,77	1.798,74	100,00%	0,00	0,00%
m <sup>2</sup>	3,35	31,70	106,51	3,35	106,51	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,35	106,51	100,00%	0,00	0,00%
m <sup>2</sup>	22,83	31,70	725,30	22,83	725,30	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	22,83	725,30	100,00%	0,00	0,00%
m <sup>2</sup>	29,71	10,56	314,63	29,71	314,63	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	29,71	314,63	100,00%	0,00	0,00%
m <sup>2</sup>	134,72	25,65	3.452,87	134,72	3.452,87	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	134,72	3.452,87	100,00%	0,00	0,00%
m	21,70	10,18	220,91	21,70	220,91	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	21,70	220,91	100,00%	0,00	0,00%
m	24,85	2,45	60,91	24,85	60,91	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	24,85	60,91	100,00%	0,00	0,00%

## VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA N° 009 ESPECIALIDAD ARQUITECTURA.

MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA, DISTRITO DE INAHUAYA - UCAYALI - LORETO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
 N° 003-2020-GRU-GRU  
 LICITACION PUBLICA N° 003-2019-COO-GRU-PRIMERA CONVOCATORIA

bre: S/3.318.744.11

CONSORCIO INAHUAYA  
 CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO  
 180 DIAS CALENDARIO  
 DEL 06 AL 22 DE ABRIL DEL 2021 - FIRMADO EL 20/04/2021  
 DEL 23 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DEL 2021 - FIRMADO EL 20/05/2021

ing. CML GERMAN ANTONIO BURBA YOUNG  
 JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO  
 ING. CML GERMAN ANTONIO BURBA YOUNG  
 JEFE DE SUPERVISION



**CONSORCIO INAHUAYA**  
*Jose Heinz Vargas Llanos*  
 REPRESENTANTE COMUN

**CONSORCIO INAHUAYA**  
*Hilton Zepeda Tavares*  
 REPRESENTANTE DE OBRA  
 CIP: N° 33662

DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P.U.	PARCIAL	AVANCE ACTUAL			AVANCE ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR		
					METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%
PLACA PARA IDENTIFICACION DE AMBIENTES 20cm X 40cm (Aciliso)	und	1,00	64,58	64,58	1,00	64,58	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1,00	64,58	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>CONSTRUCCION DE PORTADA PRINCIPAL</b>																
ESCALERA METALICA DE CAPACOC	pra	2,00	2.217,04	4.434,08		4.434,08	100,00%	2,00	4.434,08	100,00%	2,00	4.434,08	100,00%	0,00	0,00	0,00%
PINTURA																
PINTURA PRIMANTE	m2	329,33	3,85	1.267,92	329,33	1.267,92	100,00%	0,00	0,00	0,00%	329,33	1.267,92	100,00%	0,00	0,00	0,00%
PINTURA LATEX EN Muros INTERIORES Y EXTERIORES	m2	246,75	11,13	2.746,33	246,75	2.746,33	100,00%	0,00	0,00	0,00%	246,75	2.746,33	100,00%	0,00	0,00	0,00%
PINTURA LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS	m2	75,45	12,01	906,15	75,45	906,15	100,00%	0,00	0,00	0,00%	75,45	906,15	100,00%	0,00	0,00	0,00%
PINTURA LATEX EN CIELOS RASOS	m2	7,18	12,01	86,29	7,18	86,29	100,00%	0,00	0,00	0,00%	7,18	86,29	100,00%	0,00	0,00	0,00%
BARRANDEAS DE 10 CM	m	27,60	9,83	271,31	27,60	271,31	100,00%	0,00	0,00	0,00%	27,60	271,31	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>VEREDAS, PISOS Y ESCALINATAS</b>																
PISO DE MORTERO ESCALMENTO SEMIPLANO SICOLOREAR E-4cm	m2	109,29	41,15	4.500,13	109,29	4.500,13	100,00%	0,00	0,00	0,00%	109,29	4.500,13	100,00%	0,00	0,00	0,00%
PISOS CON ADORNOS DE CONCRETO MAZCO (Color Falso) DE 10cm x 20cm x 4,00cm	m2	359,28	95,90	34.412,03	359,28	34.412,03	100,00%	0,00	0,00	0,00%	359,28	34.412,03	100,00%	0,00	0,00	0,00%
BRUNDA DE 10 CM	m	2.182,42	9,83	21.453,19	2.182,42	21.453,19	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2.182,42	21.453,19	100,00%	0,00	0,00	0,00%
TARRAJEO EXTERIOR DE MUROS CMORTERO 15 X 1,5CM (H=3m)	m2	127,44	32,56	4.149,45	127,44	4.149,45	100,00%	0,00	0,00	0,00%	127,44	4.149,45	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>BARRANDEAS</b>																
BARRANDA METALICA DE TUBO GALVANIZADO SEGUN BASE, PINTURA Y ACCESOR	m	299,85	269,16	80.725,65	299,85	80.725,65	100,00%	299,85	74.756,65	100,00%	299,85	74.756,65	100,00%	0,00	0,00	0,00%
BARRANDA METALICA DE TUBO GALVANIZADO SEGUN BASE, PINTURA Y ACCESOR	m	137,11	332,72	45.619,24	137,11	45.619,24	100,00%	137,11	45.619,24	100,00%	137,11	45.619,24	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>INFORMACION AMBIENTAL</b>																
CAPACITACION DE TRABAJADORES EN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	mes	1,00	817,76	817,76	1,00	817,76	100,00%	1,00	817,76	100,00%	1,00	817,76	100,00%	0,00	0,00	0,00%
INFORMACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	mes	1,00	1.283,56	1.283,56	1,00	1.283,56	100,00%	1,00	1.283,56	100,00%	1,00	1.283,56	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>SISTEMA DE SEGURO Y RESERVA SOLIDOS</b>																
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS ECOLOGICOS TRIPLE 53 LITROS INGLUVE GRUPO																
<b>SISTEMA DE COMBUSTION</b>																
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS ECOLOGICOS TRIPLE 53 LITROS INGLUVE GRUPO																
SUMINISTRO DE CONTENEDOR DE RESERVA PELIGROSOS DE 120 LITROS DE CAPA	und	3,00	450,00	1.350,00	3,00	1.350,00	100,00%	3,00	1.350,00	100,00%	3,00	1.350,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
SUMINISTRO DE CONTENEDOR DE RESERVA SOLIDOS DE 600 LITROS DE CAPACIDAD	und	1,00	2.500,00	2.500,00	1,00	2.500,00	100,00%	1,00	2.500,00	100,00%	1,00	2.500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>PLAN DE EMERGENCIA Y PREVENCIÓN</b>																
LETRINAS DE POZO SECO	und	2,00	835,00	1.670,00	2,00	1.670,00	100,00%	2,00	1.670,00	100,00%	2,00	1.670,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
SERBATO DE GRAS	m2	177,55	16,25	2.885,19	177,55	2.885,19	100,00%	0,00	0,00	0,00%	177,55	2.885,19	100,00%	0,00	0,00	0,00%
LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	3.412,33	0,43	1.467,39	3.412,33	1.467,39	100,00%	0,00	0,00	0,00%	3.412,33	1.467,39	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>																
<b>GASTOS GENERALES (10,00%)</b>																
<b>UTILIDAD (21,47%)</b>																
<b>SUB TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>																
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>																

182



**VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA N° 09  
ESPECIALIDAD INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTROMECANICA.**

MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA, DISTRITO DE INAHUAYA - UCAYALI - LORETO  
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
N° 033-2020-GR-L-GR  
LICITACION PUBLICA N° 033-2019-CSD-GR-L-PRIMERA CONVOCATORIA  
S/3.318,744.11

CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO  
180 DIAS CALENDARIO  
DEL 06 AL 22 DE ABRIL DEL 2021. FIRMADO EL 20/04/2021  
DEL 23 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DEL 2021 - FIRMADO EL 20/05/2021  
20/05/2021  
(LORETO) - (UCAYALI) - (INAHUAYA).



CONSORCIO INAHUAYA  
*Jose Hinz Vargas Llanos*  
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO  
*ING CIVIL GERMAN ANTONIO BIRGA YOUNG*  
JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO INAHUAYA  
*Hilton Tavares*  
RESIDENTE DE OBRA  
C.I.N° 93662

UNID	CANT	P.U	PARCHAL	AVANCE ACTUAL			AVANCE ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR		
				METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%	METRADO	VALORIZADO	%
und	1.00	2,152.29	2,152.29	-	-	0.00%	2,152.29	2,152.29	100.00%	1.00	2,152.29	100.00%	0.00	0.00	0.00%
und	40.00	16.17	646.80	-	-	0.00%	646.80	646.80	100.00%	40.00	646.80	100.00%	0.00	0.00	0.00%
m	75.00	45.46	3,409.50	-	-	0.00%	3,409.50	3,409.50	100.00%	75.00	3,409.50	100.00%	0.00	0.00	0.00%
und	2.00	493.79	987.58	2.00	597.53	100.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	597.53	100.00%	0.00	0.00	0.00%
GLB	1.00	222.53	222.53	1.00	222.53	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	1.00	222.53	100.00%	0.00	0.00	0.00%
<b>SISTEMA FOTOVOLTAICO</b>															
und	2.00	1,010.79	2,021.58	-	-	0.00%	2,021.58	2,021.58	100.00%	2.00	2,021.58	100.00%	0.00	0.00	0.00%
und	1.00	606.17	606.17	-	-	0.00%	606.17	606.17	100.00%	1.00	606.17	100.00%	0.00	0.00	0.00%
und	1.00	606.17	606.17	-	-	0.00%	606.17	606.17	100.00%	1.00	606.17	100.00%	0.00	0.00	0.00%
und	2.00	4,374.97	8,749.94	-	-	0.00%	8,749.94	8,749.94	100.00%	2.00	8,749.94	100.00%	0.00	0.00	0.00%
und	2.00	911.43	1,822.86	-	-	0.00%	1,822.86	1,822.86	100.00%	2.00	1,822.86	100.00%	0.00	0.00	0.00%
und	16.00	951.43	15,222.88	-	-	0.00%	15,222.88	15,222.88	100.00%	16.00	15,222.88	100.00%	0.00	0.00	0.00%
m	40.00	16.12	644.80	-	-	0.00%	644.80	644.80	100.00%	40.00	644.80	100.00%	0.00	0.00	0.00%
und	16.00	291.43	4,662.88	-	-	0.00%	4,662.88	4,662.88	100.00%	16.00	4,662.88	100.00%	0.00	0.00	0.00%
und	8.00	1,311.43	10,491.44	-	-	0.00%	10,491.44	10,491.44	100.00%	8.00	10,491.44	100.00%	0.00	0.00	0.00%
und	2.00	251.43	502.86	-	-	0.00%	502.86	502.86	100.00%	2.00	502.86	100.00%	0.00	0.00	0.00%
GLB	1.00	222.53	222.53	1.00	222.53	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	1.00	222.53	100.00%	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>															
		SL	7,539.81		7,539.81	3.27%	223,439.79	223,439.79	96.73%		231,019.60	100.00%		231,019.60	0.00%
<b>GASTOS GENERALES (10.00%)</b>															
		SL	753.98		22,343.98	3.27%	22,343.98	22,343.98	96.73%		23,101.55	100.00%		23,101.55	0.00%
<b>UTILIDAD (21.47%)</b>															
		SL	49,622.14		47,919.97	3.27%	47,919.97	47,919.97	96.73%		49,622.14	100.00%		49,622.14	0.00%
<b>SUB TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>															
		SL	963,723.70		963,723.70	3.27%	293,784.74	293,784.74	96.73%		303,723.70	100.00%		303,723.70	0.00%
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>															
		SL	963,723.70		963,723.70	3.27%	293,784.74	293,784.74	96.73%		303,723.70	100.00%		303,723.70	0.00%

180







**VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA N° 00  
ESPECIALIDAD INSTALACIONES SANITARIAS**



MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EMBARCADERO Y DESEMBAQUE DE PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA - UCAYALI - LORETO\*

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
N° 003-2000-GR-LR  
LICITACION PÚBLICA N° 003-2019-CSD-GR-LR PRIMERA CONVOCATORIA  
S/3,318,744.11  
CONSORCIO INAHUAYA  
CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO  
180 DIAS CALENDARIO  
DEL 06 AL 27 DE ABRIL DEL 2021 - FIRMAO EL 20/04/2021  
DEL 23 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DEL 2021 - FIRMAO EL 20/05/2021  
20/05/2021  
(LORETO) - (UCAVALI) - (INAHUAYA)

CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO  
ING. CML GERMAN ANTONIO BURGAYACUNG  
JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO INAHUAYA  
Jose Hinz Vaigas Llanos  
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO INAHUAYA  
Hilón Soria Taurita  
RESIDENTE DE OBRA  
CIP N° 93682

R.F.	DESCRIPCIÓN	AVANCE ACTUAL			AVANCE ADELANZADO ANTERIOR			AVANCE ADELANZADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR		
		UNO	CANT	P.U	PARCIAL	RETRADO	VALORIZADO	%	RETRADO	VALORIZADO	%	RETRADO	VALORIZADO
02 04 05 03	SUM. E INST. DE TEE DE FIERRO Ø4" X 90"	unf	2.00	50.14	154.28	2.00	104.28	100.00%	2.00	104.28	100.00%	0.00	0.00%
02 04 05 04	SUM. E INST. DE ARRABAZOERA PULCRON DE TUBERIA Ø 3"	unf	8.00	34.90	279.20	8.00	279.20	100.00%	8.00	279.20	100.00%	0.00	0.00%
02 04 05 05	SUM. E INST. DE BARRERA ROMPE AGUA TUBERIA Ø 3"	unf	2.00	77.78	155.40	2.00	155.40	100.00%	2.00	155.40	100.00%	0.00	0.00%
02 04 05 06	SUM. E INST. DE VILMATA TPO GLOBO DE BICRATZE Ø 2"	unf	2.00	291.75	583.50	2.00	583.50	100.00%	2.00	583.50	100.00%	0.00	0.00%
02 04 05 07	SUM. E INST. DE SOMBRERO DE VENTILACIONE PVC Ø 3"	unf	2.00	30.31	60.62	2.00	60.62	100.00%	2.00	60.62	100.00%	0.00	0.00%
02 04 05 08	CAJA DE RESERVA Y LAMP.	unf	2.00	353.50	707.00	2.00	707.00	100.00%	2.00	707.00	100.00%	0.00	0.00%
02 04 05 09	SUM. E INST. DE ELECTROVALVULA DE 1/2" Ø 1/2"	unf	2.00	1,053.87	2,107.74	2.00	2,107.74	100.00%	2.00	2,107.74	100.00%	0.00	0.00%
02 04 05 01	BUDO DE MORTERO PARA ANCLAJE Ø 1/2" Ø 2000 Ø 8m	m2	2.00	191.81	383.62	2.00	383.62	100.00%	2.00	383.62	100.00%	0.00	0.00%
03 01 05 01	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO DE REDES SANITARIAS	m	78.73	7.16	561.87	78.73	561.87	100.00%	78.73	561.87	100.00%	0.00	0.00%
03 01 05 02	EXCAVACION DE ZANJA MANUAL EN TUBERIA DE DESAGUE (ANCHO=40, AL TUBA=50)	m	78.73	13.04	1,026.08	78.73	1,026.08	100.00%	78.73	1,026.08	100.00%	0.00	0.00%
03 01 05 03	PERFORADO Y NIVELADO DE ZANJAS	m	78.73	2.47	194.85	78.73	194.85	100.00%	78.73	194.85	100.00%	0.00	0.00%
03 01 05 04	RELLENO DE CANAL DE FONDO CON ARENA E=10M	m	78.73	7.87	617.55	78.73	617.55	100.00%	78.73	617.55	100.00%	0.00	0.00%
03 01 05 05	RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON TUBERIA FRIGIDA	m	78.73	21.21	1,669.07	78.73	1,669.07	100.00%	78.73	1,669.07	100.00%	0.00	0.00%
03 01 05 06	ACABADO INTERNO, MAT. PROCED. DE EXCAVACIONES D=30M	m2	24.88	21.72	539.36	24.88	539.36	100.00%	24.88	539.36	100.00%	0.00	0.00%
03 01 05 07	EMPAQUADO DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO (D=30M, Apox.)	m3	24.88	9.55	237.48	24.88	237.48	100.00%	24.88	237.48	100.00%	0.00	0.00%
03 01 05 08	SUM. E INST. TUBERIA Ø 6" PVC 5M	m	78.73	58.89	4,605.11	78.73	4,605.11	100.00%	78.73	4,605.11	100.00%	0.00	0.00%
03 01 05 09	SUM. E INST. DE ELEMENTOS DE CONJUNTO COMPLETA DE DESAGUE	unf	1.00	2,322.30	2,322.30	1.00	2,322.30	100.00%	1.00	2,322.30	100.00%	0.00	0.00%
03 01 05 10	PROBABILIDAD DE DESAGUE	unf	78.73	5.21	410.36	78.73	410.36	100.00%	78.73	410.36	100.00%	0.00	0.00%
03 01 05 11	SUM. E INST. DE CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24"	unf	4.00	385.10	1,540.40	4.00	1,540.40	100.00%	4.00	1,540.40	100.00%	0.00	0.00%
03 01 05 12	MANEJO E INST. DE CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24"	unf	3.00	655.15	1,965.45	3.00	1,965.45	100.00%	3.00	1,965.45	100.00%	0.00	0.00%
03 01 05 13	VALORES PRELIMINARES	m2	4.64	1.09	5.06	4.64	5.06	100.00%	4.64	5.06	100.00%	0.00	0.00%
03 01 05 14	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	4.64	5.89	27.31	4.64	27.31	100.00%	4.64	27.31	100.00%	0.00	0.00%
03 01 05 15	EXCAVACION DE ZANJA MANUAL	m3	14.78	43.65	646.34	14.78	646.34	100.00%	14.78	646.34	100.00%	0.00	0.00%
03 01 05 16	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO (TIERRA ROJA)	m3	4.26	97.24	414.15	4.26	414.15	100.00%	4.26	414.15	100.00%	0.00	0.00%
03 01 05 17	EMPAQUADO DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO (D=30M, Apox.)	m3	24.58	9.50	233.54	24.58	233.54	100.00%	24.58	233.54	100.00%	0.00	0.00%
03 01 05 18	MORTERO LAMPA E FC=140 kg/m3 ENBASE DE INGRESADOR	m3	0.46	452.61	208.20	0.46	208.20	100.00%	0.46	208.20	100.00%	0.00	0.00%
03 01 05 19	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	5.00	5.89	29.45	5.00	29.45	100.00%	5.00	29.45	100.00%	0.00	0.00%
03 01 05 20	EXCAVACION DE ZANJA MANUAL	m3	1.00	43.46	43.46	1.00	43.46	100.00%	1.00	43.46	100.00%	0.00	0.00%
03 01 05 21	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO (TIERRA ROJA)	m3	8.00	97.78	777.78	8.00	777.78	100.00%	8.00	777.78	100.00%	0.00	0.00%
03 01 05 22	SUM. E INST. TUBERIA PVC - 54L 4"	m	5.00	18.65	93.25	5.00	93.25	100.00%	5.00	93.25	100.00%	0.00	0.00%
03 01 05 23	ACABADO INTERNO, MAT. PROCED. DE EXCAVACIONES D=30M	m2	1.30	21.72	28.24	1.30	28.24	100.00%	1.30	28.24	100.00%	0.00	0.00%
03 01 05 24	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	unf	1.00	7,306.29	7,306.29	1.00	7,306.29	100.00%	1.00	7,306.29	100.00%	0.00	0.00%
03 01 05 25	BOQUEADOR DE 5000 LITROS PVC ACC.	m2	3.14	1.00	3.14	3.14	3.14	100.00%	3.14	3.14	100.00%	0.00	0.00%
03 01 05 26	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	3.14	3.09	9.80	3.14	9.80	100.00%	3.14	9.80	100.00%	0.00	0.00%
03 01 05 27	EXCAVACION DE ZANJA MANUAL	m3	10.20	43.46	443.25	10.20	443.25	100.00%	10.20	443.25	100.00%	0.00	0.00%

177

**VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA N° 00  
ESPECIALIDAD INSTALACIONES SANITARIAS**



MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EMBARCACIÓN Y DESEMBAQUE DE PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA, DISTRITO DE INAHUAYA - UCAYALI - LORETO

**N°:** 033-2019-GR-CR  
**Idad:** GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
**Proceso:** LICITACION PÚBLICA N° 033-2019-CSD-GR-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)  
**Unidad de Obra:** S/3,318,744.11  
**Ubicación:** CONSORCIO INAHUAYA  
**Resultado:** 180 DIAS CALENDARIO  
**Fecha de Obra:** DEL 08 AL 22 DE ABRIL DEL 2021 - FIRMADO EL 20/04/2021  
**N.º N° 01:** DEL 23 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DEL 2021 - FIRMADO EL 20/05/2021  
**N.º N° 02:** 22/05/2021  
**Unidad de Obra:** (LORETO) - (UCAYALI) - (INAHUAYA)

N°	DESCRIPCIÓN	AVANCE ACTUAL			AVANCE ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR			
		UNID.	CANT.	PAJOSAL	RENTADO	VALORIZADO	%	RENTADO	VALORIZADO	%	RENTADO	VALORIZADO	%	
03.01.05.06.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO (TIERRA ROJA)	m3	0.15	37.24	0.15	13.46	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.15	100.00%	0.00	0.00%
03.01.05.06.02.03	EMBARCACION DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO (D-SM, Apuro)	m3	13.47	9.55	13.47	12.14	100.00%	0.00	0.00	0.00%	13.47	100.00%	0.00	0.00%
03.01.05.06.02.04	PERFILADO Y TAVILADO DE ZANJAS	m	3.20	3.30	3.20	15.25	100.00%	0.00	0.00	0.00%	3.20	100.00%	0.00	0.00%
03.01.05.06.03.03	RELLENO CON GRANALLA D-157 A 107 FUSA EN EL TRACCIONADO R-01MT	m3	0.41	82.92	0.41	33.78	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.41	100.00%	0.00	0.00%
<b>03.01.05.06.03.01</b>	<b>RENTADO DE BARRILADO 2m x 6</b>													
03.01.05.06.03.01	MORTERO 7C-140 kg/m2 EN LOSA DE TORO	m3	0.31	432.81	0.31	148.21	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.31	100.00%	0.00	0.00%

**CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO**  
**ING. CWL GERMAN ANTONIO BURGOYNE**  
 JEFE DE SUPERVISIÓN

**CONSORCIO INAHUAYA**  
  
**Jose Henry Vargas Llanos**  
 REPRESENTANTE COMÚN

**CONSORCIO INAHUAYA**  
  
**Hilton Tabara**  
 RESIDENTE DE OBRA  
 CIP. N.º 93662

176

**VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA N° 09  
ESPECIALIDAD INSTALACIONES SANITARIAS**



TELORAMIENTO DE SERVICIO DE EMBARQUE Y DISEMBARQUE DE PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE INAHUAYA, DISTRITO DE INAHUAYA - UCAYALI - LORETO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
N° 035-2020-GR-L-ORI  
LICITACION PÚBLICA N° 035-2019-C50-GR-PRIMERA CONVOCATORIA  
S/3.316,744 11

CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO  
180 DIAS CALENDARIO  
DEL 06 AL 27 DE ABRIL DEL 2021 - FIRMADO EL 20/04/2021  
DEL 23 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DEL 2021 - FIRMADO EL 20/05/2021  
20/05/2021  
(LORETO) - (UCAYALI) - (INAHUAYA)

**CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO**  
*Juliano Lopez*  
ING. CMIL CERRANTELLO BARRA LEANS  
JEFE DE SUPERVISIÓN

**CONSORCIO INAHUAYA**  
*Jose Heinz Vargas Llanos*  
REPRESENTANTE COMÚN

**CONSORCIO INAHUAYA**  
*Jose Heinz Vargas Llanos*  
RESIDENTE DE OBRA  
CIP. N° 93662

ID	CANT	P.U.	PARCIAL	AVANCE ACTUAL			AVANCE ACUMULADO HISTÓRICO			AVANCE ACUMULADO ACTUAL			METRADO	VALORIZADO	N	SALDO POR VALORIZAR
				METRADO	VALORIZADO	N	METRADO	VALORIZADO	N	METRADO	VALORIZADO	N				
03.01.02.03.01	m2	29.10	81.83	1.629.70	20.10	1.629.10	100.00%	0.00	0.00	0.00%	20.10	1.629.70	100.00%	0.00	-	0.00%
SUBTOTAL																
03.01.02.03.01	m2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1.00	100.00%	0.00	-	0.00%
03.01.02.03.02	m2	1.00	3.15	3.15	3.15	3.15	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	3.15	100.00%	0.00	-	0.00%
03.01.02.03.03	m3	1.00	41.66	41.66	41.66	41.66	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	41.66	100.00%	0.00	-	0.00%
03.01.02.03.04	m3	4.00	3.30	13.20	13.20	13.20	100.00%	0.00	0.00	0.00%	4.00	13.20	100.00%	0.00	-	0.00%
03.01.02.03.05	m3	1.35	8.95	12.42	12.42	12.42	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.35	12.42	100.00%	0.00	-	0.00%
03.01.02.03.06	m3	0.15	49.61	49.61	49.61	49.61	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.15	49.61	100.00%	0.00	-	0.00%
03.01.02.03.07	m2	3.40	79.25	269.85	269.85	269.85	100.00%	0.00	0.00	0.00%	3.40	269.85	100.00%	0.00	-	0.00%
03.01.02.03.08	m2	3.40	41.95	142.86	142.86	142.86	100.00%	0.00	0.00	0.00%	3.40	142.86	100.00%	0.00	-	0.00%
03.01.02.03.09	m2	3.40	41.95	142.86	142.86	142.86	100.00%	0.00	0.00	0.00%	3.40	142.86	100.00%	0.00	-	0.00%
03.01.02.03.10	m2	1.00	41.95	41.95	41.95	41.95	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	41.95	100.00%	0.00	-	0.00%
03.01.02.03.11	und	1.00	49.44	49.44	49.44	49.44	100.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	49.44	100.00%	0.00	-	0.00%
SUBTOTAL																
03.02.01.01	m3	5.00	42.74	213.70	213.70	213.70	100.00%	5.00	5.00	100.00%	5.00	213.70	100.00%	0.00	-	0.00%
03.02.01.02	m3	5.00	34.52	345.65	345.65	345.65	100.00%	5.00	5.00	100.00%	5.00	345.65	100.00%	0.00	-	0.00%
03.02.01.03	m3	25.45	18.82	502.21	502.21	502.21	100.00%	25.45	25.45	100.00%	25.45	502.21	100.00%	0.00	-	0.00%
03.02.01.04	m3	17.61	9.35	165.16	165.16	165.16	100.00%	17.61	17.61	100.00%	17.61	165.16	100.00%	0.00	-	0.00%
03.02.01.05	und	5.00	39.27	196.35	196.35	196.35	100.00%	5.00	5.00	100.00%	5.00	196.35	100.00%	0.00	-	0.00%
03.02.01.06	und	5.00	37.63	188.15	188.15	188.15	100.00%	5.00	5.00	100.00%	5.00	188.15	100.00%	0.00	-	0.00%
03.02.01.07	und	5.00	20.67	103.35	103.35	103.35	100.00%	5.00	5.00	100.00%	5.00	103.35	100.00%	0.00	-	0.00%
03.02.01.08	und	8.00	21.16	169.28	169.28	169.28	100.00%	8.00	8.00	100.00%	8.00	169.28	100.00%	0.00	-	0.00%
03.02.01.09	und	1.00	23.15	23.15	23.15	23.15	100.00%	1.00	1.00	100.00%	1.00	23.15	100.00%	0.00	-	0.00%
03.02.01.10	und	11.00	15.32	168.52	168.52	168.52	100.00%	11.00	11.00	100.00%	11.00	168.52	100.00%	0.00	-	0.00%
03.02.01.11	und	7.00	10.22	71.54	71.54	71.54	100.00%	7.00	7.00	100.00%	7.00	71.54	100.00%	0.00	-	0.00%
03.02.01.12	und	3.00	15.29	45.87	45.87	45.87	100.00%	3.00	3.00	100.00%	3.00	45.87	100.00%	0.00	-	0.00%
03.02.01.13	und	5.00	37.13	185.65	185.65	185.65	100.00%	5.00	5.00	100.00%	5.00	185.65	100.00%	0.00	-	0.00%
03.02.01.14	und	5.00	11.34	56.70	56.70	56.70	100.00%	5.00	5.00	100.00%	5.00	56.70	100.00%	0.00	-	0.00%
SUBTOTAL																
03.03.01.01	m2	78.00	1.00	78.00	78.00	78.00	100.00%	78.00	78.00	100.00%	78.00	78.00	100.00%	0.00	-	0.00%
03.03.01.02	m2	78.00	9.00	702.00	702.00	702.00	100.00%	78.00	78.00	100.00%	78.00	702.00	100.00%	0.00	-	0.00%
03.03.01.03	m3	47.18	42.66	2013.41	2013.41	2013.41	100.00%	47.18	47.18	100.00%	47.18	2013.41	100.00%	0.00	-	0.00%
03.03.01.04	m3	131.40	3.30	433.62	433.62	433.62	100.00%	131.40	131.40	100.00%	131.40	433.62	100.00%	0.00	-	0.00%
03.03.01.05	m3	61.33	21.72	1332.59	1332.59	1332.59	100.00%	61.33	61.33	100.00%	61.33	1332.59	100.00%	0.00	-	0.00%
03.03.01.06	m3	61.33	9.55	583.76	583.76	583.76	100.00%	61.33	61.33	100.00%	61.33	583.76	100.00%	0.00	-	0.00%
03.03.01.07	m2	65.70	29.62	1946.56	1946.56	1946.56	100.00%	65.70	65.70	100.00%	65.70	1946.56	100.00%	0.00	-	0.00%
03.03.01.08	m2	65.70	45.56	2984.79	2984.79	2984.79	100.00%	65.70	65.70	100.00%	65.70	2984.79	100.00%	0.00	-	0.00%
SUBTOTAL																

175

**VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA N° 06  
ESPECIALIDAD INSTALACIONES SANITARIAS**



ENCUADRE DE SERVICIO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN EL EMBARCADERO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE INAHUAYA, DISTRITO DE INAHUAYA - UCAYALI - LORETO

Ed: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
 Av: N° 031-2000-GRU-GRU  
 Es: LICITACION PUBLICA N° 031-2019-C50-GRU-PRIMERA CONVOCATORIA  
 No de Of: 5/3.310.744.11  
 Av: CONSORCIO INAHUAYA  
 Ed: CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO  
 No de Of: 180 DIAS CALENDARIO  
 N° 01: DEL 06 AL 22 DE ABRIL DEL 2021 - FIRMADO EL 20/04/2021  
 N° 02: DEL 23 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DEL 2021 - FIRMADO EL 20/05/2021  
 No de Of: 2/05/2021  
 Ed: (LORETO) - (UCAYALI) - (INAHUAYA)

I.	DESCRIPCION	UNID	CANT	P.U	PARCEL	AVANCE ACTUAL			AVANCE ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR		
						RETRADO	VALORIZADO	%	RETRADO	VALORIZADO	%	RETRADO	VALORIZADO	%	RETRADO	VALORIZADO	%
4.0102	ACERO DE REFUERZO P*4200 KOCMAZ GRADO 60	m	844.03	4.67	3,951.50	-	0.00%	3,951.50	100.00%	844.03	844.03	3,553.56	100.00%	0.00	-	0.00%	
4.0103	MORTERO FC-175 KOCMAZ EN CAJALETAS	m2	1.81	551.78	504.47	-	0.00%	504.47	100.00%	1.81	1.81	504.47	100.00%	0.00	-	0.00%	
4.0104	CURADO DE MORTERO CON CURADOR TIPO HEMERFANA	m2	134.60	1.80	242.24	-	0.00%	242.64	100.00%	134.60	134.60	242.64	100.00%	0.00	-	0.00%	
4.0501	SOLADOS EN MAJOS INTERIORES	m2	134.60	17.01	2,289.55	-	0.00%	2,292.05	100.00%	134.60	134.60	2,292.05	100.00%	0.00	-	0.00%	
4.0501	SALA EN ST. TUBERIA P*0 - EN 16"	m	60.40	68.22	6,172.55	-	0.00%	6,172.55	100.00%	60.40	60.40	6,172.55	100.00%	0.00	-	0.00%	
4.0503	MORTERO EN COLARIA PARA PROTECCION DE MAJAS DE BRESALE PLUMAL	m2	8.00	207.45	1,659.60	-	0.00%	1,659.60	100.00%	8.00	8.00	1,659.60	100.00%	0.00	-	0.00%	
	TOTAL COSTO DIRECTO				122,842.10		0.15%	112,281.72	91.81%			122,842.10	100.00%			0.00%	
	GASTOS GENERALES (18.6%)				12,284.31		0.15%	11,108.17	91.81%			12,284.31	100.00%			0.00%	
	UTILIDAD (11.4%)				26,375.00		0.15%	24,115.32	91.81%			26,375.00	100.00%			0.00%	
	SUB TOTAL DEL PRESUPUESTO				161,600.01		0.15%	148,579.21	91.81%			161,600.01	100.00%			0.00%	
	TOTAL PRESUPUESTO				161,600.01		0.15%	148,579.21	91.81%			161,600.01	100.00%			0.00%	

CONSORCIO SUPERVISOR EMBARCADERO  
 ING. CML GERMAN ANTONIO BURSCA YOUNG  
 JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO INAHUAYA  
  
 JOSE MEJIZ VARGAS LLANOS  
 REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO INAHUAYA  
  
 HILTON ZOLA TABARA  
 REPRESENTANTE DE OBRA  
 CIP N° 93662

779



